

MOVIMIENTO DE EXPEDIENTE

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-----|------|
| CODIGO | ENTIDAD-UNIDAD ADMINISTRATIVA | FECHA | | |
| 8000-35-0000 | DIRECCION DE PLANIFICACION EDUCATIVA (DIPLAN) | 1 | 7 | 2021 |
| CODIGO | PROCEDENCIA | DIA | MES | ANO |
| 8135-002058 | LIC. LUIS ALFONSO RODAS GUZMÁN (DIRECTOR EN FUNCIONES) | DOCUMENTO No. | | |
| CODIGO | CLASE DE CORRESPONDENCIA | Prioridad | | |
| 57 | PROVIDENCIA | NORMAL | | |

Asunto INFORMES DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO PRÉSTAMOS Y DONACIONES




Descripción ATENTAMENTE, TRASLADAMOS CON PROVIDENCIAS DIPLAN-FE-1177 Y 1190-2021, LOS INFORMES DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PRÉSTAMOS Y DONACIONES PARA SER INGRESADOS A DICONIME, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021.

Remitente LIC. LUIS ALFONSO RODAS GUZMÁN

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DOCUMENTO

| No. | Fecha del Movimiento | Estado / Marginado | Movimiento Realizado por: | Asignado a / Observaciones | Usuario | No. |
|-----|-----------------------------|---|---|---|------------|-----|
| 7 | 07/07/2021 05:41:11 p.m. | DOCUMENTO ADJUNTO / TRAMITE CORRESPONDIENTE | DIRECCION DE PLANIFICACION EDUCATIVA (DIPLAN) | Licda. Oneida Beatriz Aguilar Alfaro (Directora) / ATENTAMENTE, TRASLADAMOS OFICIO DIPLAN-FE-3185-2021 Y DIPLAN-FE-3224-2021 CON LOS INFORMES DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO; Y DONACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO CORRESPONDIENTES A JUNIO 2021. | NCASTANEDA | 30 |
| 6 | 07/07/2021 05:38:04 p.m. | CONFIRMACION DE RECEPCION / TRAMITE CORRESPONDIENTE | DIRECCION DE PLANIFICACION EDUCATIVA (DIPLAN) | DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA / PASE ATENTAMENTE CON FIRMA Y SELLO DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION EN INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PRESTAMO Y DONACIONES . | NCASTANEDA | 38 |
| 5 | 07/07/2021 05:37:47 p.m. | CONFIRMACION DE RECEPCION / TRAMITE CORRESPONDIENTE | DIRECCION DE PLANIFICACION EDUCATIVA (DIPLAN) | DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA / PASE ATENTAMENTE CON FIRMA Y SELLO DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION EN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PRESTAMOS Y DONACIONES, PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE | NCASTANEDA | 38 |

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GUATEMALA, C. A.



HORA: 10 FIRMA: [Signature]

OBSERVACIONES

[Handwritten signature]

ELABORADO

REVISADO

AUTORIZADO



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATEI

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN



Guatemala, 01 de julio de 2021
Oficio DIPLAN-FE-3185-2021

Licenciada
Oneida Beatriz Aguilar Alfaro
Directora
Dirección de Cooperación Nacional e Internacional –DICONIME-
Ministerio de Educación

Licenciada Aguilar:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitir el Oficio DIPLAN-FE-3184-2021 emitido por el Licenciado Luis Alfonso Rodas Guzmán, Director en funciones de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, para su conocimiento y efectos correspondientes.

Los informes descritos son elaborados, revisados y son responsabilidad de la Dirección de Planificación Educativa –DIPLAN-, del Ministerio de Educación, de conformidad con el Artículo 29 de la Ley Orgánica del Presupuesto y Acuerdo Ministerial No. 17-2014.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Claudia Patricia Ruiz Casasola
M. Sc. Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada
Ministra de Educación



AS

Adjunto: lo indicado
LR/dl
Cc. Financiamiento Externo



Ministerio de Educación
www.mineduc.gob.gt

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 7.7.21

Firma: *[Signature]*

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2021
 Mes a Reportar: JUNIO
 Entidad: 11130008
 Unidad Ejecutora: MINEDUC
 Préstamo: BCIE
 Código Presupuesto: 52-0401-0067

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1 Componente al que se vincula | II.2 Descripción Meta | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes | | | | II.5 Avance Financiero al Mes | | | | II.6 Medios de Verificación |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------|
| | | | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | |
| N/A | Apoyo a proyectos de Inversión en Infraestructura Social y productiva de la República de Guatemala | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 4,108,000.00 | | | 0% | REPORTE DE SICOIN |

TOTAL: 4,108,000.00 0%

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1 Componente al que se vincula | III.2 Nombre | III.3 Meta Total | Avance del mes | | | | | III.7 Medios de verificación | III.8 Notas Adaratorfas |
|------------------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | | III.4 Meta Anual | III.5 Vigente (Año) | III.6 Ejecutado | III.7 Medios de verificación | III.8 Notas Adaratorfas | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR | | | | IV.2 Valoración Balance | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------------|----|--|--|--|--|----------------|--|--|--|
| EJECUCIÓN FÍSICA | EJECUCIÓN FINANCIERA | Variación % Física | 0% | IV.3 Alertivos No se reporta ejecución debido a que no se registro ningún desembolso. | | | | | | | |
| 0% | 0% | | | | | | | | | | |
| IV.2 GESTIÓN AL MES | | | | | | | | IV.3 Alertivos | | | |
| EJECUCIÓN FÍSICA | EJECUCIÓN FINANCIERA | Variación % Financiera | 0% | | | | | | | | |
| 0% | 0% | | | | | | | | | | |

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO

| EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL |
|------------------------|----------------------------|
| 0% | 0% |

[Firma]
 Firma laborada por

Lic. Luis Alfonso Rodas Cruzmán
 Director en Funciones
 Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
 Ministerio de Educación

[Firma]
 Firma laborada por
 M.Sc. Claudia Ruiz Casasola de Estrada
 Ministra de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Guatemala, C.A.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 7.7.21
 Firma: *[Firma]*

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio: 2021
 Mes a Reportar: JUNIO
 Entidad: 11130008
 Unidad Ejecutora: MINEDUC
 Préstamo: BCIE
 Código Presupuesto: 52-0401-0067
 Fecha de suscripción:
 Fecha de último desembolso:


II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

| Ejercicio Fiscal | 2021 | II.1. Componente | II.2. Descripción Meta | II.3. Unidad de Medida | II.4. | | II.5. | | II.6. | | | II.7. | | | II.8. | | II.9. | | II.10. Observaciones |
|------------------|------|------------------|--|------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| | | | | | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución ** | |
| N/A | | | Apoyo a proyectos de inversión en Infraestructura Social y productiva de la República de Guatemala | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

III. Resumen

| III.1. Año | III.2. Avance Físico del Año | III.3. Avance Financiero del Año | III.4. Avance Físico Acumulado | III.5. Avance Financiero Acumulado |
|------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | | |


 Lic. Juan Alfonso Rodas Guzmán
 Director en Funciones
 Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
 Ministerio de Educación


 M.Sc. Claudia Ruiz Casasola de Estrada
 Ministra de Educación



EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIEL DE SU ORIGINAL
 Fecha: 7.7.21
 Firma:

Sección 3. - Informe de Avance Físico, Financiero - Principales Inversiones

I DATOS GENERALES

| | | |
|---------------------|--------------|--|
| Ejercicio: | 2021 | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97. |
| Mes a Reportar: | JUNIO | |
| Entidad: | 11130008 | |
| Unidad Ejecutora: | MINEDUC | |
| Préstamo: | BCIE | |
| Código Presupuesto: | 52-0401-0067 | |

II PRINCIPALES INVERSIONES

| II.1. No. Componente | II.2. Nombre del Componente | II.3. Inversión (Producto) | II.4. NOG | II.5. SNIP | Fecha de Inicio de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | % Ejecución Física | % Ejecución Financiera | II.6. Observaciones |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| (The table body is mostly empty with a large diagonal line drawn across it, indicating no data is reported.) | | | | | | | | | |

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIEL DE SU ORIGINAL
 Fecha: 7.7.21
 Firma:

Firma Elaborado Por
 Lic. Luis Alfonso Rodas Guzmán
 Director en Funciones
 Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
 Ministerio de Educación

Firma Aprobado Por
 M.Sc. Claudia Ruz Casasola de Estrada
 Ministra de Educación



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2021
Mes a Reportar: JUNIO
Entidad: 11130008
Unidad Ejecutora: MINEDOC
Préstamo: PROEUDC V
Código Presupuesto: 52-0505-0013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1 Componente al que se vincula | II.2 Descripción Meta | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes | | | | II.5 Avance Financiero al Mes | | | | II.6 Medios de Verificación |
|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| | | | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | |
| Acceso a educación técnica | Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados | Entidad | 8 | 6 | 0 | 0 | 60,932,572.00 | 36,365,911.00 | 0.00 | 0.00% | REPORTE DE SICOIN |
| | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado | Mts. Cuadrados | 16824 | 16824 | 0 | 0 | 17,178,371.00 | 47,865,799.00 | 2,022,694.84 | 4.23% | REPORTE DE SICOIN |
| | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar | Entidad | 14 | 14 | 0 | 0 | 12,707,000.00 | 8,133,488.00 | 0.00 | 0.00% | REPORTE DE SICOIN |
| Diseño e implementación curricular | Diseño y desarrollo de materiales curriculares | Evento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00% | REPORTE DE SICOIN |
| Fortalecimiento Institucional | Imprevistos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 257,665.00 | 59,248.00 | 22.99% | REPORTE DE SICOIN |
| | Consultoría Internacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,619,057.00 | 3,481,200.00 | 0.00 | 0.00% | REPORTE DE SICOIN |
| TOTAL | | | | | | | 59,537,000.00 | 97,204,043.00 | 2,081,942.84 | 2.14% | |

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1 Componente al que se vincula | III.2 Nombre | III.3 Meta Total | III.4 Meta Anual | Avance del mes | | | | III.8 Notas Aclaratorias |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | III.5 Vigente 2021 | III.6 Ejecutado | III.7 Medios de verificación | III.8 Notas Aclaratorias | |
| Acceso a educación técnica | Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados | 6 | 6 | 6 | 0 | Estimaciones de pago | | |
| | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado | 16824 | 8948 | 8948 | 0 | Estimaciones de pago / CUR | | |
| | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar | 14 | 5 | 5 | 0 | Supervisión | | |
| Diseño e implementación curricular | Diseño y desarrollo de materiales curriculares | 1 | 1 | 1 | 0 | CUR | | |
| Fortalecimiento Institucional | Consultoría Internacional | 1 | 1 | 1 | 0 | CUR | | |

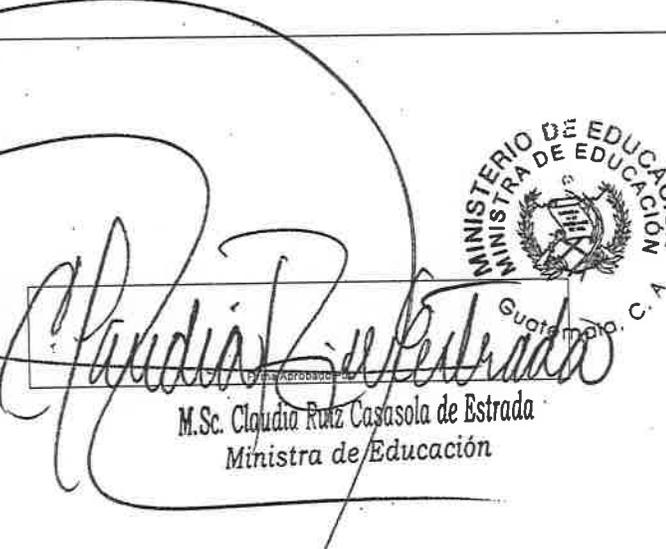
IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR | | | | IV.2 Valoración Balance | | | |
|---------------------------|-------|------------------------|-------|---|--|--|--|
| Ejecución Física | | Ejecución Financiera | | IV.3 Alertivos | | | |
| 0% | 0.04% | Variación % Física | 0.00% | Se encuentra en proceso la licitación pública para la construcción de 3 Institutos tecnológicos y rehabilitación de 6 establecimientos. | | | |
| IV.2 GESTIÓN AL MES | | Variación % Financiera | | | | | |
| Ejecución Física | | Ejecución Financiera | | | | | |
| 0% | 2.14% | | | | | | |

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

| V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO | |
|--|----------------------------|
| Ejecución Física Total | Ejecución Financiera Total |
| 11% | Q28,327,900.71 |


 Firma Elaborado Por
Lic. Luis Alfonso Rodas Guzmán
 Director en Funciones
 Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
 Ministerio de Educación


 M.Sc. Claudia Ruiz Casasola de Estrada
 Ministra de Educación



EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 7.7.21
 Firma: [Signature]

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio: 2021
 Mes a Reportar: JUNIO
 Entidad: 11130008
 Unidad Ejecutora: MINEDUC
 Préstamo: PROEDUC V
 Código Presupuesto: 52-0505-0013
 Fecha de suscripción: 10/05/2018
 Fecha de último desembolso: 18/01/2020

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

| Ejercicio Fiscal | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|--|
| II.1. Componente | II.2. Descripción Meta | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo | | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones | | II.6. Avance Físico al Año | | | II.7. Avance Financiero al Año | | | II.8. Avance Físico Acumulado | | II.9. Avance Financiero Acumulado | | II.10. Observaciones | |
| | | | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución ** | | |
| Componente 1: Acceso a Educación Técnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura física | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado | Establecimientos | 4 | 8,700,000.00 | | | | | | 8,700,000.00 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | | | 0% | |
| Equipamiento | Equipamiento de centros educativos a nivel diversificado | Establecimientos | 4 | 1,942,328.00 | | | | | | 1,942,328.00 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | | | 0% | |
| Fortalecimiento institucional | Consultoría internacional | N/A | N/A | 9,295,932.00 | | | | | | 9,295,932.00 | 5,478,204.00 | 58.93% | N/A | N/A | 5,478,204.00 | | 58.93% | |
| | | | 19,938,260.00 | | | | | | | | 27.48% | | | 27.48% | | | | |
| | | | | | | | | | | 19,938,260.00 | 5,478,204.00 | | | | | | | |

| Ejercicio Fiscal | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|--|
| II.1. Componente | II.2. Descripción Meta | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo | | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones | | II.6. Avance Físico al Año | | | II.7. Avance Financiero al Año | | | II.8. Avance Físico Acumulado | | II.9. Avance Financiero Acumulado | | II.10. Observaciones | |
| | | | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución ** | | |
| Componente 1 Acceso a Educación Técnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura física | Centros escolares del nivel medio ciclo Diversificado, reparados, rematados | Entidad | 4 | 10,160,400.00 | 1/01/2019 | 30/04/2019 | 4 | 4 | 100.00% | 11,589,400.00 | 10,019,989.68 | 86.46% | 4 | 100.00% | 10,019,989.68 | | 86.46% | |
| | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado | Mts. Cuadrados | 16,824 | 95,715,930.00 | 30/04/2019 | 31/12/2019 | 16824 | 0 | 0.00% | 95,715,930.00 | 43,480.00 | 0.05% | 0 | 0.00% | 43,480.00 | | 0.05% | |
| | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar | Entidad | | | | | N/A | N/A | | 14,756,210.00 | 2,636,510.00 | 17.87% | N/A | 0 | 2,636,510.00 | | 17.87% | |
| Fortalecimiento institucional | Consultoría internacional | Varios | | 105,876,330.00 | | | 16828 | 4 | 0.02% | 10,059,539.00 | 4,373,636.11 | 43.48% | N/A | 0 | 4,373,636.11 | | 43.48% | |

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 7.7.21

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio: 2021
 Mes a Reportar: JUNIO
 Entidad: 11130008
 Unidad Ejecutora: MINEP
 Préstamo: PROEDUC V
 Código Presupuesto: 52-0505-0013
 Fecha de suscripción: 10/05/2018
 Fecha de último desembolso: 18/01/2020

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

| Ejercicio Fiscal | | 132,121,079.00 17,073,615.79 12.92% 0.02% 17,073,615.79 12.92% | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| II.1. Componente | II.2. Descripción Meta | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo | | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones | | II.6. Avance Físico al Año | | | II.7. Avance Financiero al Año | | | II.8. Avance Físico Acumulado | | II.9. Avance Financiero Acumulado | | II.10. Observaciones |
| | | | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución ** | |
| Componente 1 Acceso a educación técnica | Centros escolares del nivel medio ciclo Diversificado, reparados, remozados | Entidad | 6 | 2,302,575.00 | 1/01/2020 | 30/04/2020 | 5 | 0 | 0.00% | 1,416,000.00 | 451,000.00 | 31.85% | 0 | 0.00% | 451,000.00 | 31.85% | |
| Infraestructura física | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura | Mts. Cuadrados | 16,824 | 68,191,848.00 | 30/04/2020 | 31/12/2020 | 10526 | 203 | 1.93% | 53,769,183.00 | 779,440.00 | 1.45% | 203 | 1.93% | 779,440.00 | 1.45% | |
| | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar | Entidad | 5 | 20,207,600.00 | 30/04/2020 | 31/12/2020 | 5 | 0 | 0.00% | 12,782,600.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | - | 0.00% | |
| Componente 2 Diseño e implementación Curricular | Diseño y desarrollo de materiales curriculares | Evento | 1 | 1,100,000.00 | 30/04/2020 | 31/12/2020 | 1 | 0 | 0.00% | 1,100,000.00 | 870,000.00 | 79.09% | 0 | 0.00% | 870,000.00 | 79.09% | |
| Fortalecimiento institucional | Consultoría Internacional | Varios | N/A | 7,734,977.00 | 1/01/2020 | 31/12/2020 | N/A | 0 | 0.00% | 1,291,099.00 | 171,290.00 | 13.27% | 0 | 0.00% | 171,290.00 | 13.27% | |
| | Consultoría Internacional | Varios | N/A | 0.00 | 1/01/2020 | 31/12/2020 | N/A | 0 | 0.00% | 2,133,000.00 | 1,422,407.68 | 66.69% | 0 | 0.00% | 1,422,407.68 | 66.69% | |
| | | | 99,537,000.00 | | | | 10537 | 203 | 1.93% | 72,491,882.00 | 3,694,137.68 | 5.10% | 203 | 1.93% | 3,694,137.68 | 5.10% | |

| Ejercicio Fiscal | | 132,121,079.00 17,073,615.79 12.92% 0.02% 17,073,615.79 12.92% | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| II.1. Componente | II.2. Descripción Meta | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo | | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones | | II.6. Avance Físico al Año | | | II.7. Avance Financiero al Año | | | II.8. Avance Físico Acumulado | | II.9. Avance Financiero Acumulado | | II.10. Observaciones |
| | | | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución ** | |
| Componente 1 Acceso a educación técnica | Centros escolares del nivel medio ciclo Diversificado, reparados, remozados | Entidad | 6 | 2,302,575.00 | 1/01/2021 | 30/04/2021 | 5 | 0 | 0.00% | 36,365,911.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | - | 0.00% | |
| Infraestructura física | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura | Mts. Cuadrados | 16,824 | 68,191,848.00 | 1/04/2021 | 15/08/2021 | 10526 | 0 | 0.00% | 47,865,799.00 | 2,022,694.84 | 4.23% | 0 | 4.23% | 2,022,694.84 | 4.23% | |
| | Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar | Entidad | 5 | 20,207,600.00 | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 5 | 0 | 0.00% | 8,133,468.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | - | 0.00% | |
| Componente 2 Diseño e implementación Curricular | Diseño y desarrollo de materiales curriculares | Evento | 1 | 1,100,000.00 | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 1 | 0 | 0.00% | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | - | 0.00% | |
| Fortalecimiento institucional | Imprevistos | Varios | N/A | 0.00 | | | 0 | 0 | 0.00% | 257,665.00 | 59,248.00 | 22.99% | 0 | 22.99% | 59,248.00 | 22.99% | |
| | Consultoría Internacional | Varios | N/A | 7,734,977.00 | 1/01/2021 | 31/12/2021 | N/A | 0 | 0.00% | 3,481,200.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | N/A | - | 0.00% | |
| | | | 99,537,000.00 | | | | 10537 | 0 | 0.00% | 97,204,043.00 | 2,081,942.84 | 2.14% | 0 | 4.23% | 2,081,942.84 | 2.14% | |

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL.

Fecha: 7-7-21
 Firma: [Firma]

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio: 2021
 Mes a Reportar: JUNIO
 Entidad: 11130008
 Unidad Ejecutora: MINEPUC
 Préstamo: PROSPUC V
 Código Presupuesto: 52-0505-0013
 Fecha de suscripción: 16/05/2018
 Fecha de último desembolso: 16/01/2020

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

| III.1. Año | III. Restumen | | |
|------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | III.2. Avance Físico del Año | III.3. Avance Financiero del Año | III.4. Avance Físico Acumulado |
| 2018 | 0% | 27.48% | N/A |
| 2019 | 0.02% | 12.92% | 0.02% |
| 2020 | 1.93% | 5.10% | 1.93% |
| 2021 | 4.23% | 2.14% | 4.23% |
| | | | III.5. Avance Financiero Acumulado |
| | | | 5,478,204.00 |
| | | | 17,075,615.79 |
| | | | 3,604,137.68 |
| | | | 2,011,942.84 |


 Firma Autorizada Por

Lic. Luis Alfredo Rojas Guzmán,
 Director en Funciones
 Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN
 Ministerio de Educación




 Firma Autorizada Por

M.Sc. Claudia Ruiz Casanola de Estrada,
 Ministra de Educación

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIEL DE SU ORIGINAL
 Fecha: 7.7.21
 Firma:

Sección 3. - Informe de Avance Físico, Financiero - Principales Inversiones

I DATOS GENERALES

| | | |
|----------------------------|--------------|--|
| Ejercicio: | 2021 | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97. |
| Mes a Reportar: | JUNIO | |
| Entidad: | 11130008 | |
| Unidad Ejecutora: | MINEDUC | |
| Préstamo: | PROEDUC V | |
| Código Presupuesto: | 52-0505-0013 | |

II PRINCIPALES INVERSIONES

| II.1. No. Componente | II.2. Nombre del Componente | II.3. Inversión (Producto) | II.4. NOG | II.5. SNIP | Fecha de Inicio de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | % Ejecución Física | % Ejecución Financiera | II.6. Observaciones |
|----------------------------|--|---|-----------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| Acceso a educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado | CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA | 11488794 | 225120 | | | 0.00% | 0.00% | EN EVALUACIÓN DE OFERTAS |
| Acceso a educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado | CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO DE NEBAJ, QUICHE | 11488794 | 225121 | | | 0.00% | 0.00% | EN EVALUACIÓN DE OFERTAS |
| Acceso a educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado | CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO | 11488794 | 225122 | | | 0.00% | 0.00% | EN EVALUACIÓN DE OFERTAS |
| Acceso a educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado | CONSTRUCCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ | 9550321 | 225123 | 16/12/2019 | 15/08/2021 | 7.00% | 0.00% | PAGOS DE ANTICIPO EN TRÁMITE |
| Acceso a educación técnica | Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado | CONSTRUCCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO DE RABINAL, BAJA VERAPAZ | 9550321 | 225124 | 13/12/2019 | 15/08/2021 | 10.00% | 0.00% | PAGOS DE ANTICIPO EN TRÁMITE |

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 7.7.21
Firma: [Firma]

[Firma manuscrita]
Firma Elaborado Por

Lic. Luis Alfonso Rodas Guzmán
Director en Funciones
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación

[Firma manuscrita]
Firma Elaborado Por

M.Sc. Claudia Ruiz Casasola de Estrada
Ministra de Educación



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2021
Mes a Reportar: JUNIO
Entidad: 11330008
Unidad Ejecutora: MINEDUC
Préstamo: BID 3618/OC-GU
Código Presupuestado: 52-0402-0126

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Guh. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores afines con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

| II.1 Componente al que se vincula | II.2 Descripción Meta | II.3 Unidad de Medida | II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO | | | | | | | II.6 Medios de Verificación | |
|---|---|-----------------------|--------------------------------|---------|-----------|--------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | II.4 Avance Físico al Mes | | | | II.5 Avance Financiero al Mes | | | | |
| | | | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | Ejecutado | | % Ejecución |
| Habilitación y remozamiento de centros escolares | Adquisición de módulos educativos preprimaria monolingüe | Módulos | 0 | 116 | 31 | 27% | 0 | 22,448,540.00 | 6,522,000.00 | 29% | REPORTE DE SICOIN |
| | Adquisición de módulos educativos preprimaria bilingüe | Módulos | 0 | 62 | 23 | 37% | 0 | 16,341,070.00 | 4,547,650.00 | 27% | REPORTE DE SICOIN |
| | Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria monolingüe | Mobiliario | 0 | 116 | 0 | 0% | 0 | 1,144,623.00 | - | 0% | REPORTE DE SICOIN |
| | Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educación preprimaria transferencias a OPI | Transferencia | 0 | 13 | 11 | 85% | 0 | 975,000.00 | 732,613.92 | 75% | REPORTE DE SICOIN |
| | Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educación primaria transferencias a OPI | Transferencia | 0 | 467 | 128 | 27% | 0 | 49,856,189.00 | 9,917,530.70 | 23% | REPORTE DE SICOIN |
| Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Capacitación de docentes | Docencia | 0 | 3331 | 0 | 0% | 0 | 29,837,800.00 | 11,254,870.00 | 38% | REPORTE DE SICOIN |
| | Tecnología | Equipo | 0 | 2790 | 0 | 0% | 0 | 36,993,792.00 | - | 0% | REPORTE DE SICOIN |
| | Impresión de textos serie Descubre y aprendo para niños y niñas de 4, 5 y 6 años preprimaria | Textos | 0 | 477261 | 0 | 0% | 0 | 8,392,193.00 | - | 0% | REPORTE DE SICOIN |
| Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,731,043.00 | 16,144,125.00 | 1,428,000.00 | 14% | REPORTE DE SICOIN |
| | Evaluación | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | 505,000.00 | - | 0% | REPORTE DE SICOIN |
| TOTAL | | | | | | 0.04% | 2,731,043.00 | 170,800,182.00 | 34,392,654.62 | 20.14% | |


| III.1 Componente al que se vincula | III.2 Nombre | III.3 Meta Total | III.4 Meta Anual | Avance del mes | | | | III.8 Notas Adclaratorias |
|---|---|------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|-------|---------------------------|
| | | | | III.5 Vigente (2021) | III.6 Ejecutado | III.7 Medios de verificación | III.8 | |
| Habilitación y remozamiento de centros escolares | Adquisición de módulos educativos preprimaria monolingüe | 116 | 116 | 116 | 31 | SICOIN | | |
| | Adquisición de módulos educativos preprimaria bilingüe | 62 | 62 | 62 | 23 | SICOIN | | |
| | Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria monolingüe | 116 | 116 | 116 | 0 | SICOIN | | |
| | Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educación preprimaria transferencias a OPI | 13 | 13 | 13 | 11 | SICOIN | | |
| | Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educación primaria transferencias a OPI | 467 | 467 | 467 | 128 | SICOIN | | |
| Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Capacitación de docentes | 3331 | 3331 | 3331 | 0 | SICOIN | | |
| | Tecnología | 2790 | 2790 | 2790 | 0 | SICOIN | | |
| | Impresión de textos serie Descubre y aprendo para niños y niñas de 4, 5 y 6 años preprimaria | 477261 | 477261 | 477261 | 0 | SICOIN | | |
| Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa | N/A | N/A | N/A | N/A | SICOIN | | |
| | Evaluación | N/A | N/A | N/A | N/A | SICOIN | | |

| IV. BALANCE DE LA GESTIÓN | | | | |
|---------------------------|----------------------|---|--|--|
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR | | IV.2 Valoración Balance | | |
| EJECUCIÓN FÍSICA | EJECUCIÓN FINANCIERA | IV.3 Alertivos | | |
| 0.04% | 36% | Se encuentra en proceso una licitación pública internacional, para adquisición de módulos educativos. | | |
| IV.2 GESTIÓN AL MES | | | | |
| EJECUCIÓN FÍSICA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | |
| 0.04% | 20.14% | | | |

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

| V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO | |
|--|----------------------------|
| EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL |
| 21.31 | 240,117,443.45 |


 Firma Elaborado Por
Lic. Luis Alfonso Rodas Guzmán
 Director en Funciones
 Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
 Ministerio de Educación


 Firma Autorizado Por
Claudia Ruiz Casuso de Estrada
 Ministra de Educación



EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 7-7-21
 Firma: [Signature]

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2021
 Mes a Reportar: JUNIO
 Entidad: 11130008
 Unidad Ejecutora: MINEDUC
 Préstamo: BID 3618/OC-GU
 Código Presupuestado: 52-0402-0126
 Fecha de suscripción: 10/05/2018
 Fecha de último desembolso: 18/12/2020

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

| 1. Componente | II.2. Descripción Meta | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo | | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones | | II.6. Avance Físico al Año | | | II.7. Avance Financiero al Año | | | II.8. Avance Físico Acumulado | | II.9. Avance Financiero Acumulado | | II.10. Observaciones | | |
|---|--|------------------------|------------------------------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|--|--|
| | | | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución ** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reparación y mantenimiento de los edificios escolares | Edificios escolares reparados y remozados del nivel preprimaria y primaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reparación de centros escolares al nivel de educación primaria | Edificios escolares reparados y remozados del nivel preprimaria y primaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reparación a los programas de apoyo del Organismo Ejecutor | Edificios escolares reparados y remozados del nivel preprimaria y primaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reparación de las aulas reforzadas en los niveles de educación preprimaria y primaria | Edificios escolares reparados y remozados del nivel preprimaria y primaria | Establecimientos | 0 | 29,502 | | | 0 | 0 | 0.00% | | | 0.0% | 0 | | | 0.00% | | | |
| Componente 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejora de la calidad de los servicios de la lectura, matemáticas y valores | Documento | Documento | 2,543,200 | 45,934,422 | | | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | 0 | | | 0.00% | | | |
| Componente 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Análisis, seguimiento, monitoreo y auditoría | Administración del programa | N/A | N/A | 0 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | | | 0.00% | | | |
| Administración | Administración del programa | N/A | N/A | 0 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | | | 0.00% | | | |
| | | | 45,983,934.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIEL DE SU ORIGINAL
 Fecha: 27.7.21
 Firma:

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

| Ejercicio Fiscal | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|------------------------|---|------------------------------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| | Componente | II.2. Descripción Meta | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo | | II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones | | II.6. Avance Físico al Año | | | II.7. Avance Financiero al Año | | | II.8. Avance Físico Acumulado | | II.9. Avance Financiero Acumulado | | II.10. Observaciones |
| | | | | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución ** | |
| Componente 1 | Adquisición de módulos educativos | Módulos | 500 | 69,953,055.79 | 2/01/2019 | 20/12/2019 | 500 | 0 | 0.00% | 69,953,055.79 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 0.00% | | |
| | | | Adquisición de mobiliarios escolares | Unidad | 500 | 3,399,305.21 | 2/01/2019 | 20/12/2019 | 500 | 0 | 0.00% | 3,399,305.21 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 0.00% |
| Componente 2 | Docentes de preprimaria capacitados | Docente | 1,500 | 6,600,000.00 | 2/02/2019 | 30/11/2019 | 1,500 | 1,224 | 81.60% | 6,600,000.00 | 5,385,600.00 | 81.60% | 1,224 | 81.60% | 5,385,600.00 | 81.60% | | |
| | | | Mejora de la calidad de la enseñanza y los rendimientos | Texto | 499,537 | 10,026,616.00 | 2/01/2019 | 2/09/2019 | 499,537 | 499,537 | 100.00% | 10,026,616.00 | 9,581,119.66 | 95.56% | 49,537 | 95.56% | 9,581,119.66 | 95.56% |
| | Adquisición de textos escolares | Texto | 2,360,402 | 24,384,275.00 | 2/01/2019 | 30/04/2019 | 2,360,402 | 2,360,402 | 100.00% | 24,384,275.00 | 24,297,026.36 | 99.64% | 2,360,402 | 99.64% | 24,197,026.36 | 95.44% | | |
| | | | Capacitación a docentes / directores | Docente | 1,360 | 2,258,079.00 | 1/07/2019 | 4/12/2019 | 1,360 | 0 | 0.00% | 2,258,079.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 0.00% |
| Componente 3 | Adquisición de equipo tecnológico | Equipo | 1,360 | 99,949,503.00 | 2/01/2019 | 19/06/2019 | 1,360 | 0 | 0.00% | 99,949,503.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 0.00% | | |
| | | | Administración, supervisión y evaluación | Adminstración del programa | Varios | N/A | 15,022,125.00 | 1/03/2019 | 31/12/2019 | N/A | N/A | N/A | 15,022,125.00 | 2,397,900.00 | 15.96% | N/A | 15.96% | 2,397,900.00 |
| | | | | | | | 2,865,159 | 2,861,163 | 99.86% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 233,592,959.00 | 41,661,646.02 | 17.84% | | | | | | |

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIEL DE SU ORIGINAL
 Fecha: 2-7-21
 Firma:

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2021
 Mes a Reportar: JUNIO
 Entidad: 11130008
 Unidad Ejecutora: MINEDUC
 Préstamo: BID 3618/OC-GU
 Código Presupuesto: 52-0402-0126
 Fecha de suscripción: 10/05/2018
 Fecha de último desembolso: 18/12/2020

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gob. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

| Ejercicio Fiscal | 2020 | I. Componente | II.2. Descripción Meta | II.3. Unidad de Medida | II.4. | | II.5. | | II.6. | | | II.7. | | | II.8. | | II.9. | | II.10. Observaciones |
|---|------|---------------|---|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| | | | | | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución ** | |
| Componente 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución y mantenimiento de centros escolares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Adquisición de módulos educativos preprimaria monolingüe | Módulos | 137 | 26,734,500.00 | | | 137 | 81 | 59.12% | 26,734,500.00 | 15,999,000.00 | 59.84% | 81 | 59.12% | 15,999,000.00 | 59.84% | |
| | | | Adquisición de módulos educativos preprimaria bilingüe | Módulos | 200 | 50,660,000.00 | | | 200 | 135 | 67.50% | 50,660,000.00 | 33,318,500.00 | 65.77% | 135 | 67.50% | 33,318,500.00 | 65.77% | |
| | | | Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria monolingüe | Mobiliario | 137 | 2,070,080.00 | | | 137 | 135 | 98.54% | 2,100,300.00 | 2,070,080.00 | 98.56% | 135 | 98.54% | 2,070,080.00 | 98.54% | |
| | | | Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria bilingüe | Mobiliario | 200 | 3,027,340.00 | | | 200 | 200 | 100.00% | 3,027,340.00 | 3,027,340.00 | 100.00% | 200 | 100.00% | 3,027,340.00 | 100.00% | |
| | | | Remocimiento de aulas deterioradas en los niveles de educación preprimaria transferencias a OPI | Transferencia | 1,000 | 68,375,505.00 | | | 820 | 733 | 89.39% | 71,776,239.00 | 69,809,785.32 | 97.26% | 733 | 89.39% | 69,809,785.32 | 97.26% | |
| | | | Remocimiento de aulas deterioradas en los niveles de educación primaria transferencias a OPI | Transferencia | 791 | 17,765,881.00 | | | 638 | 407 | 63.79% | 42,192,897.00 | 29,968,440.90 | 71.03% | 407 | 63.79% | 29,968,440.90 | 71.03% | |
| Componente 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Capacitación de docentes | Docente | 1,224 | 16,156,800.00 | | | 1,224 | 1,032 | 84.31% | 13,889,066.00 | 13,222,880.00 | 95.20% | 1,032 | 84.31% | 13,222,880.00 | 95.20% | |
| | | | Textos | | | | | | | | | 11,969,780.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | | | 0.00% | |
| Componente 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administración, supervisión y evaluación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Administración del programa | Varios | N/A | 3,375,198.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,167,198.00 | 2,747,106.59 | 65.92% | N/A | N/A | 2,747,106.59 | 65.92% | |
| | | | | | 188,165,304.00 | | | | | 3356 | 2723 | 81.14% | 226,517,320.00 | 170,163,132.81 | 75.12% | 2,723 | 81.14% | 170,163,132.81 | |

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIEL DE SU ORIGINAL
 Fecha: 2-7-21
 Firma:

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2021
 Mes a Reportar: JUNIO
 Entidad: 11130008
 Unidad Ejecutora: MINEDUC
 Préstamo: BID 3618/OC-GU
 Código Presupuesto: 52-0402-0116
 Fecha de suscripción: 18/05/2018
 Fecha de último desembolso: 18/12/2020


Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

| Ejercicio Fiscal 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| I. Componente | II.2. Descripción Meta | II.3. Unidad de Medida | II.4. | | II.5. | | II.6. | | | II.7. | | | II.8. | | II.9. | | II.10. Observaciones |
| | | | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución ** | |
| Componente 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Habilitación y movimiento de centros escolares | Adquisición de módulos educativos preprimaria monolingüe | Módulos | 0 | 0.00 | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 116 | 31 | 26.7% | 22,646,550.00 | 6,522,000.00 | 28.80% | 31 | 26.7% | 6,522,000.00 | 28.80% | |
| | Adquisición de módulos educativos preprimaria bilingüe | Módulos | 0 | 0.00 | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 62 | 23 | 37.1% | 16,541,000.00 | 4,547,650.00 | 27.49% | 23 | 37.1% | 4,547,650.00 | 27.49% | |
| | Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria monolingüe | Mobiliario | 0 | 0.00 | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 116 | 0 | 0.0% | 1,144,623.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.00% | |
| | Reembolso de aulas deterioradas en los niveles de educación preprimaria transferencias a DFP | Transferencia | 0 | 0.00 | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 33 | 11 | 84.6% | 975,000.00 | 732,613.92 | 75.14% | 11 | 84.6% | 732,613.92 | 75.14% | |
| | Reembolso de aulas deterioradas en los niveles de educación primaria transferencias a DFP | Transferencia | 0 | 0.00 | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 467 | 128 | 27.4% | 43,356,189.00 | 9,917,530.76 | 22.87% | 128 | 27.4% | 9,917,530.76 | 22.87% | |
| Componente 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejora de la calidad de la enseñanza y los rendimientos | Capacitación de docentes | Docente | 0 | 0.00 | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 3331 | 1482 | 44.5% | 29,857,600.00 | 11,254,870.00 | 37.70% | 1,482 | 44.5% | 11,254,870.00 | 37.70% | |
| | Tecnología | Equipo | 0 | 0.00 | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 2730 | 0 | 0.0% | 36,993,792.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.00% | |
| | Impresión de textos serie Descartes y aprende para niños y niñas de 4, 5 y 8 años preprimaria | Textos | 0 | 0.00 | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 477261 | 0 | 0.0% | 6,392,193.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.00% | |
| Componente 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administración, supervisión y evaluación | Administración del programa | Varios | N/A | N/A | 1/01/2021 | 31/12/2021 | N/A | NA | N/A | 10,388,235.00 | 1,418,000.00 | 13.65% | N/A | N/A | 1,418,000.00 | 13.65% | |
| | Evaluación | Varios | N/A | N/A | 1/01/2021 | 31/12/2021 | N/A | NA | N/A | 505,000.00 | 0.00 | 0.00% | N/A | N/A | 0.00 | 0.00% | |
| | | | 0.00 | | | | 484156 | 1675 | 0.35% | 170,800,182.00 | 34,392,664.62 | 20.14% | 1,675 | 0.35% | 34,392,664.62 | 20.14% | |

III. Resumen

| I. Año | III.2. Avance Físico del Año | III.3. Avance Financiero del Año | III.4. Avance Físico Acumulado | III.5. Avance Financiero Acumulado |
|--------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2021 | 0.00% | 2% | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 39.80% | 17.84% | 41,884,646.82 | 17,841,000.00 |
| 2019 | 81.14% | 25.12% | 170,185,131.81 | 41,884,646.82 |
| 2018 | 0.00% | 0.00% | 34,392,664.62 | 0.00 |


 Lic. Luis Alfonso Rodas Guzmán
 Director en Funciones
 Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
 Ministerio de Educación


 M.Sc. Claudia Ruiz Casasola de Estrada
 Ministra de Educación



EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIEL DE SU ORIGINAL
 Fecha: 7-2-21
 Firma: [Signature]

Sección 3. - Informe de Avance Físico, Financiero - Principales Inversiones

I DATOS GENERALES

| | | |
|---------------------|-----------------|--|
| Ejercicio: | 2021 | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97. |
| Mes a Reportar: | JUNIO | |
| Entidad: | 11130008 | |
| Unidad Ejecutora: | MINEDUC | |
| Préstamo: | BID 361A /OC-GU | |
| Código Presupuesto: | 52-0402-0126 | |

II PRINCIPALES INVERSIONES

| II.1. No. Componente | II.2. Nombre del Componente | II.3. Inversión (Producto) | II.4. NOG | II.5. SNIP | Fecha de Inicio de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | % Ejecución Física | % Ejecución Financiera | II.6. Observaciones | |
|----------------------|---|---|--|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--|
| 1 | Habilitación y remozamiento de centros escolares | Adquisición de módulos educativos preprimaria monolingüe y preprimaria bilingüe | Módulos prefabricados para centros educativos de educación preprimaria bilingüe y monolingüe | 10580042 | | 11/10/2019 | 2/11/2020 | 80.11% | 80.11% | En el mes de abril 2021, fueron cancelados 54 módulos pendientes del año 2020. |
| 1 | Habilitación y remozamiento de centros escolares | Mobiliario | Adquisición de Mobiliario Escolar para Establecimientos Educativos del Ministerio de Educación | 11185600 | | 18/06/2020 | 20/12/2020 | 99.41% | 99.41% | |
| 2 | Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes | Textos | Textos, impresión de libros de la serie Descubro y aprendo para niños y niñas de 4, 5 y 6 años del nivel educativo preprimaria | 13301241 | | 30/12/2020 | 24/03/2021 | 0% | 0% | |

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 7.7.21
Firma: [Firma]

[Firma]

Firma Elaborado Por

Lic. Luis Alfonso Rodas Guzmán
Director en Funciones
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación

[Firma]

Firma Aprobado Por

M.Sc. Claudia Ruiz Casasola de Estrada
Ministra de Educación

