


Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Marzo / 2025**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE EDUCACION RURAL V -PROEDUC V**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

|                                       |                      |                               |                     |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| Número de Préstamo                    | KFW-PROEDUC V        | Fecha de última actualización | 07/04/2025          |
| Código Presupuestario                 | 5205050013           | Fecha del Decreto             | 27/10/2015          |
| Organismo Financiero                  | KFW                  | Fecha de Suscripción          | 18/10/2016          |
| Moneda del Préstamo                   | EUR                  | Fecha de Vigencia             | 18/10/2016          |
| Monto contratado                      | 21,000,000.00        | Fecha de Elegibilidad         | 18/10/2016          |
| Monto contratado Entidad ejecutora    | 21,000,000.00        | Fecha de cierre actual        | 31/12/2024          |
| Monto Entidad Ejecutora Dolares       | 22,667,400.00        | Meses de Prórroga             | 0                   |
| Monto contratado Entidad ejecutora Q. | 174,801,921.84       | Plazo de ejecución            | 100.00%             |
| Desembolsos realizados a la fecha     | 18,542,974.53 81.80% | Monto por desembolsar USD\$   | 4,124,425.47 18.20% |

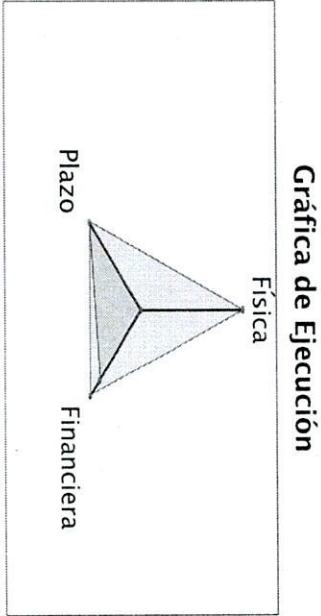

Tipo de cambio: 7.7116 X 1 USD



| Ejecución Presupuestaria Anual |               | Desembolsos Mensuales Marzo      |              | Indicadores de Avance Anuales 2025                                             |               | Total                |       |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------|
| Asignación                     | 25,000,000.00 | Desembolso planificado en el mes | 0.00         | Desembolsos Acumulados del Año                                                 | 0             | Ejecución Financiera | 0.00% |
| Presupuestaria anual           |               |                                  |              | Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos   | 0.00% / 0.00% |                      |       |
| Presupuesto Vigente anual      | 56,374,750.00 | Desembolso realizado en el mes   | 0.00         | Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados | 0.11% / 6.66% |                      |       |
| Presupuesto Devengado          | 65,720.38     | Diferencia                       | 0.00         | Plazo de ejecución Actual                                                      | 100.00%       |                      |       |
| Porcentaje de Ejecución        | 0.12%         | Próximo desembolso del mes       | Abril        | Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual                              | 6.5427        |                      |       |
|                                |               | Presupuesto planificado próximo  | 3,821,035.27 |                                                                                |               |                      |       |



## Metas año fiscal

| Producto                                                                                                                                                                                            | Unidad de medida | Meta cuatrimestre I |      | Meta cuatrimestre II |      | Meta cuatrimestre III |      | Meta anual  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------|----------------------|------|-----------------------|------|-------------|------|
|                                                                                                                                                                                                     |                  | Planificado         | Real | Planificado          | Real | Planificado           | Real | Planificado | Real |
| Componente: Acceso a Educación Técnica                                                                                                                                                              |                  |                     |      |                      |      |                       |      |             |      |
| Construcción de Institutos Tecnológicos                                                                                                                                                             | Unidad           | 3                   |      | 0                    |      | 0                     |      | 3           |      |
| Mobiliario y Proyector para laboratorios de Física, Química y Biología para 7 INEDs, ubicados en Sta. Cruz del Quiché, Cobán, La Tinta, Huehuetenango, Chiquimula, Jacaltenango y San Pedro Pinula. | Unidad           | 7                   |      | 0                    |      | 0                     |      | 7           |      |
| Equipo de cómputo para 53 laboratorios en centros educativos del nivel diversificado                                                                                                                | Unidad           | 53                  |      | 0                    |      | 0                     |      | 53          |      |
| Equipo para talleres especializados en mecánica para un estimado de 15 centros educativos del nivel diversificado                                                                                   | Unidad           | 15                  |      | 0                    |      | 0                     |      | 15          |      |
| Equipo para talleres especializados en electricidad para un estimado de 7 centros educativos del nivel diversificado                                                                                | Unidad           | 7                   |      | 0                    |      | 0                     |      | 7           |      |
| Equipo para talleres especializados en construcción para 3 centros educativos del nivel diversificado                                                                                               | Unidad           | 3                   |      | 0                    |      | 0                     |      | 3           |      |
| Equipo para Laboratorios de Física, Química y Biología/Talleres de Ciencias Biológicas para 24 Centros Educativos del Nivel Diversificado                                                           | Unidad           | 24                  |      | 0                    |      | 0                     |      | 24          |      |
| Equipo para Salud y Seguridad Ocupacional en 2 Institutos Tecnológicos y 100 Talleres/Laboratorios                                                                                                  | Unidad           | 102                 |      | 0                    |      | 0                     |      | 102         |      |
| Contratación de consultores individuales para realizar el diseño y monitoreo de la readecuación del Sistema Eléctrico de 20 Talleres/Laboratorios en Establecimientos de Nivel Diversificado        | Unidad           | 1                   |      | 0                    |      | 0                     |      | 1           |      |
| Equipamiento para mantenimiento de 2 Institutos Tecnológicos                                                                                                                                        | Unidad           | 2                   |      | 0                    |      | 0                     |      | 2           |      |

| Producto                                                                                                                                             | Unidad de medida | Meta cuatrimestre I |      | Meta cuatrimestre II |      | Meta cuatrimestre III |      | Meta anual  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------|----------------------|------|-----------------------|------|-------------|------|
|                                                                                                                                                      |                  | Planificado         | Real | Planificado          | Real | Planificado           | Real | Planificado | Real |
| Readecuación del Sistema Eléctrico en 20 talleres/laboratorios en Establecimientos Educativos del Nivel Diversificado                                | Porcentaje       | 0                   |      | 10                   |      | 0                     |      | 10          |      |
| <b>Componente: Diseño e Implementación Curricular</b>                                                                                                |                  |                     |      |                      |      |                       |      |             |      |
| Contratación de consultorías para implementación curricular (formación de personal docente, administrativo e instructores de los centros educativos) | Unidad           | 1                   |      | 0                    |      | 0                     |      | 1           |      |
| Reproducción: 1) Material de diseños curriculares, 2) Cualificaciones de carreras a ser implantadas y 3) Módulos Formativos                          | Unidad           | 2                   |      | 0                    |      | 0                     |      | 2           |      |
| <b>Componente: Fortalecimiento Institucional</b>                                                                                                     |                  |                     |      |                      |      |                       |      |             |      |
| Consultoría internacional                                                                                                                            | Unidad           | 0                   |      | 1                    |      | 0                     |      | 1           |      |
| Servicios de auditoría del programa                                                                                                                  | Unidad           | 1                   |      | 0                    |      | 0                     |      | 1           |      |
| Publicaciones para Licitaciones                                                                                                                      | Unidad           | 4                   | 2    | 0                    |      | 0                     |      | 4           | 2    |
| Redacción, diagramación e impresión de las distintas intervenciones del Proyecto                                                                     | Unidad           | 0                   |      | 1                    |      | 0                     |      | 1           |      |



## 2

2



| Adquisición                                                                                                                                          | Método                           | Preparación de documentos |            | Lanzamiento de evento |            | Recepción y evaluación de |            | Adjudicación |            | Firma de contrato |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------|--------------|------------|-------------------|------------|
|                                                                                                                                                      |                                  | Planificado               | Real       | Planificado           | Real       | Planificado               | Real       | Planificado  | Real       | Planificado       | Real       |
| BIEN                                                                                                                                                 | Adjudicación directa             | 02/01/2025                |            | 18/02/2025            |            | 20/03/2025                |            | 22/04/2025   |            | 24/04/2025        |            |
| Readecuación del Sistema Eléctrico en 20 talleres/laboratorios en Establecimientos Educativos del Nivel Diversificado                                |                                  |                           |            |                       |            |                           |            |              |            |                   |            |
| SERVICIO                                                                                                                                             | Licitaciones locales             | 28/01/2025                | 20/01/2025 | 02/04/2025            |            | 02/05/2025                |            | 28/05/2025   |            | 30/05/2025        |            |
| Diseño e Implementación Curricular                                                                                                                   |                                  |                           |            |                       |            |                           |            |              |            |                   |            |
| Contratación de consultorías para implementación curricular (formación de personal docente, administrativo e instructores de los centros educativos) |                                  |                           |            |                       |            |                           |            |              |            |                   |            |
| SERVICIO                                                                                                                                             | Adjudicación directa             | 02/01/2025                |            | 02/01/2025            |            | 06/01/2025                |            | 07/01/2025   |            | 07/01/2025        |            |
| Reproducción: 1) Material de diseños curriculares, 2) Cualificaciones de carreras a ser implantadas y 3) Módulos Formativos                          |                                  |                           |            |                       |            |                           |            |              |            |                   |            |
| SERVICIO                                                                                                                                             | Adjudicación directa             | 31/10/2024                | 31/10/2024 | 04/11/2024            | 04/11/2024 | 22/11/2024                | 22/11/2024 | 06/01/2025   | 06/01/2025 | 06/01/2025        | 06/01/2025 |
| Fortalecimiento Institucional                                                                                                                        |                                  |                           |            |                       |            |                           |            |              |            |                   |            |
| Servicios de auditoria del programa                                                                                                                  |                                  |                           |            |                       |            |                           |            |              |            |                   |            |
| Servicio de auditoria segundo semestre                                                                                                               | Adjudicación directa             | 02/10/2024                |            | 08/11/2024            |            | 18/12/2024                |            | 18/12/2024   |            | 19/12/2024        |            |
| Funcionamiento de Asistencia Técnica Internacional                                                                                                   |                                  |                           |            |                       |            |                           |            |              |            |                   |            |
| Servicio                                                                                                                                             | Licitación Publica Internacional | 30/05/2018                |            | 28/09/2018            |            | 30/10/2018                |            | 28/11/2018   |            | 27/12/2018        |            |
| Redacción, diagramación e impresión de las distintas intervenciones del Proyecto                                                                     |                                  |                           |            |                       |            |                           |            |              |            |                   |            |
| SERVICIO                                                                                                                                             | Adjudicación directa             | 14/02/2025                |            | 21/02/2025            |            | 28/02/2025                |            | 10/03/2025   |            | 17/03/2025        |            |



## Ejecución Financiera Anual

| Insuno                                                                                                                                                                                              | Enero | Febrero      | Marzo        | Abril         | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| Acceso a Educación Técnica                                                                                                                                                                          |       |              |              |               |      |       |       |        |            |         |           |           |               |
| Construcción de Institutos Tecnológicos                                                                                                                                                             |       |              |              |               |      |       |       |        |            |         |           |           |               |
| SERVICIO                                                                                                                                                                                            | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 1,919,384.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,919,384.00  |
| Mobiliario y Proyector para laboratorios de Física, Química y Biología para 7 INEDs, ubicados en Sta. Cruz del Quiché, Cobán, La Tinta, Huehuetenango, Chiquimula, Jacaltenango y San Pedro Pinula. |       |              |              |               |      |       |       |        |            |         |           |           |               |
| BIEN                                                                                                                                                                                                | 0.00  | 1,791,689.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,791,689.00  |
| Equipo de cómputo para 53 laboratorios en centros educativos del nivel diversificado                                                                                                                |       |              |              |               |      |       |       |        |            |         |           |           |               |
| BIEN                                                                                                                                                                                                | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 25,709,500.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 25,709,500.00 |
| Equipo para talleres especializados en mecánica para un estimado de 15 centros educativos del nivel diversificado                                                                                   |       |              |              |               |      |       |       |        |            |         |           |           |               |
| BIEN                                                                                                                                                                                                | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 6,860,460.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,860,460.00  |
| Equipo para talleres especializados en electricidad para un estimado de 7 centros educativos del nivel diversificado                                                                                |       |              |              |               |      |       |       |        |            |         |           |           |               |
| BIEN                                                                                                                                                                                                | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 3,651,134.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,651,134.00  |
| Equipo para talleres especializados en construcción para 3 centros educativos del nivel diversificado                                                                                               |       |              |              |               |      |       |       |        |            |         |           |           |               |
| BIEN                                                                                                                                                                                                | 0.00  | 0.00         | 1,843,980.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,843,980.00  |
| Equipo para Laboratorios de Física, Química y Biología/Talleres de Ciencias Biológicas para 24 Centros Educativos del Nivel Diversificado                                                           |       |              |              |               |      |       |       |        |            |         |           |           |               |
| BIEN                                                                                                                                                                                                | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 9,451,783.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,451,783.00  |
| Equipo para Salud y Seguridad Ocupacional en 2 Institutos Tecnológicos y 100 Talleres/Laboratorios                                                                                                  |       |              |              |               |      |       |       |        |            |         |           |           |               |



[illegible]

Contratación de consultores individuales para realizar el diseño y monitoreo de la readecuación del Sistema Eléctrico de 20 Talleres/Laboratorios en Establecimientos de Nivel Diversificado

[illegible]

### Equipamiento para mantenimiento de 2 Institutos Tecnológicos

|      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| BIEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,780.00 |
|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------------|

# Readecuación del Sistema Eléctrico en 20 talleres/laboratorios en Establecimientos Educativos del Nivel Diversificado

[illegible][illegible]

## Diseño e Implementación Curricular

Contratación de consultorías para implementación curricular (formación de personal docente, administrativo e instructores de los centros educativos)

[illegible]

**Reproducción: 1) Material de diseños curriculares, 2) Cualificaciones de carreras a ser implantadas y 3) Módulos Formativos**

[illegible][illegible]

## Fortalecimiento Institucional

### Servicios de auditoría del programa


| Servicio de auditoría segundo semestre |      |      |      |      |            |      |      |      |            |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------------|
|                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,720.00 |



| Insumo                                                                                  | Enero | Febrero      | Marzo        | Abril         | Mayo       | Junio        | Julio | Agosto       | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------|--------------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| <b>Publicaciones para Licitaciones</b>                                                  |       |              |              |               |            |              |       |              |            |         |           |           |               |
| SERVICIO                                                                                | 0.00  | 0.00         | 30,000.00    | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 30,000.00     |
| <b>Funcionamiento de Asistencia Técnica Internacional</b>                               |       |              |              |               |            |              |       |              |            |         |           |           |               |
| Servicio                                                                                | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 1,895,606.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,895,606.00  |
| <b>Redacción, diagramación e impresión de las distintas intervenciones del Proyecto</b> |       |              |              |               |            |              |       |              |            |         |           |           |               |
| SERVICIO                                                                                | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 150,000.00 | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 150,000.00    |
| <b>Total componente</b>                                                                 | 0.00  | 0.00         | 30,000.00    | 0.00          | 150,000.00 | 2,070,326.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,250,326.00  |
| <b>Total</b>                                                                            | 0.00  | 1,946,689.00 | 1,873,980.00 | 49,686,461.00 | 150,000.00 | 2,291,106.00 | 0.00  | 1,400,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 57,348,236.00 |



### Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

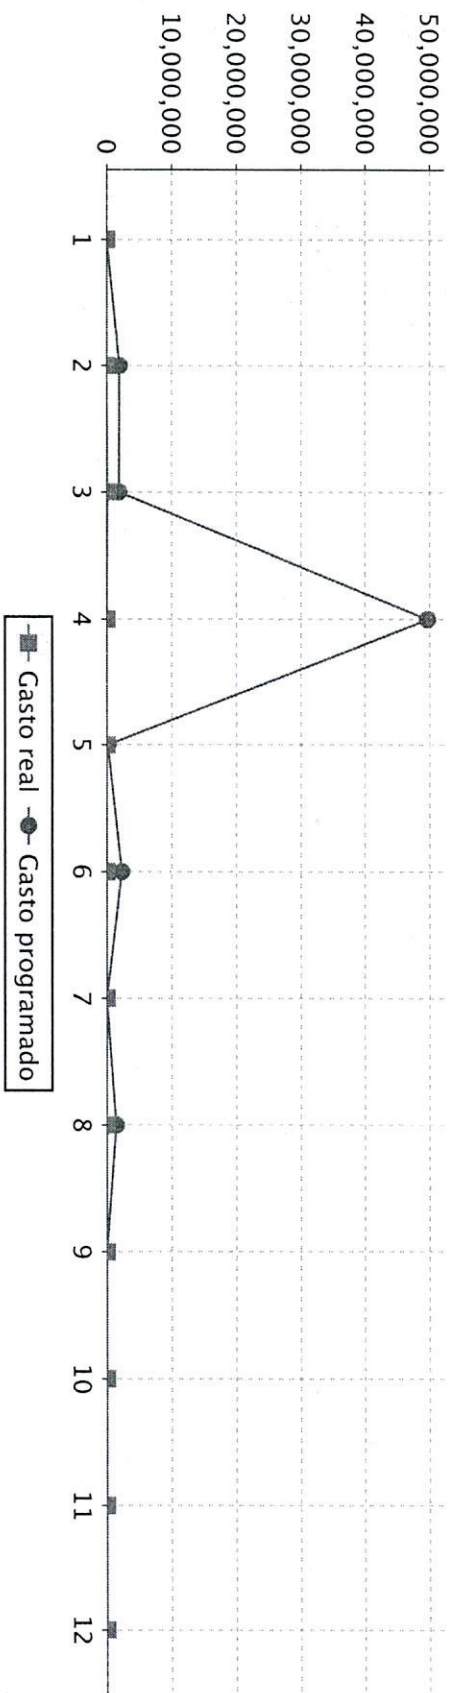[illegible]



## Proyección de desembolsos

| Mes       | Enero | Febrero | Marzo | Abril        | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-----------|-------|---------|-------|--------------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Programad | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 3,821,035.27 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Realizado | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Variación | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 3,821,035.27 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      |



PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 2/04/2025  
HORA : 11:20.52  
REPORTE : R00817366.rpt

DEVENGADO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIE

BRE OC

MBRE NC

MEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

[illegible]



### Dinámico de Gastos Mensualizado

**Expresado en Quetzales**

ORGANISMO = 505, CORRELATIVO = 13

- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 2/04/2025  
HORA : 11:20.52  
REPORTE : R00817366.rpt

**EJERCICIO:** 2,025

[illegible]



Observaciones /Desafíos

Alertivos

Elaborado por: (nombre y firma):

  
Ana María Solís Quiñonez  
ANALISTA FINANCIERO  
Dirección Planificación Educativa -DIPLAN-  
Ministerio de Educación

  
Licenciado Francisco Alfredo Saborío  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN-  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
GUATEMALA, C.A.

Aprobado por: (Nombre y firma): Licenciada Anabella María Giracca Méndez, Guatemala, C.A.

  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
MINISTRA DE EDUCACIÓN

Fecha de actualización: 4/4/2025 – 17:48 PM

