



Ministerio de Educación

Guatemala, 08 de diciembre de 2025
Oficio DIPLAN-FE-6940-2025

M. A. Ricardo Ernesto Marroquín Flores
Director
Cooperación Nacional e Internacional -DICONIME-
Ministerio de Educación
Su Despacho

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GUATEMALA, C.A.

RECIBIDO
09 DIC 2025


HORA: 16:12 FIRMA:

M. A. Marroquín:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitir el Oficio DIPLAN-FE-6939-2025 emitido por el Licenciado Francisco Alfredo Sapón Orellana, Director de Planificación Educativa -DIPLAN-, que contiene los Informes de Avance Físico y Financiero al mes de noviembre de 2025, para su conocimiento y efectos correspondientes.

Los informes descritos son elaborados, revisados y son responsabilidad de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, del Ministerio de Educación, de conformidad con el Artículo 29 de la Ley Orgánica del Presupuesto y Acuerdo Ministerial No. 17-2014.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

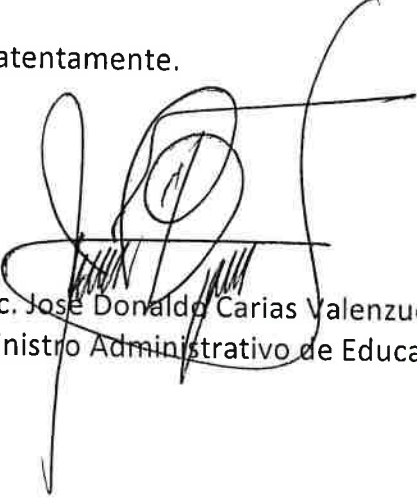
M. Sc. José Donald Carias Valenzuela
Viceministro Administrativo de Educación



Adjunto: lo indicado
FASO/MRGL/eg
Cc. Financiamiento Externo





Ministerio de Educación

Guatemala, 08 de diciembre de 2025
Oficio DIPLAN-FE-6940-2025

M. A. Ricardo Ernesto Marroquín Flores
Director
Cooperación Nacional e Internacional -DICONIME-
Ministerio de Educación
Su Despacho

M. A. Marroquín:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitir el Oficio DIPLAN-FE-6939-2025 emitido por el Licenciado Francisco Alfredo Sapón Orellana, Director de Planificación Educativa -DIPLAN-, que contiene los Informes de Avance Físico y Financiero al mes de noviembre de 2025, para su conocimiento y efectos correspondientes.

Los informes descritos son elaborados, revisados y son responsabilidad de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, del Ministerio de Educación, de conformidad con el Artículo 29 de la Ley Orgánica del Presupuesto y Acuerdo Ministerial No. 17-2014.

Sin otro particular, la saludo atentamente.


M. Sc. José Donald Carias Valenzuela
Viceministro Administrativo de Educación



Adjunto: lo indicado
FASO/MRGL/eg
Cc. Financiamiento Externo





Ministerio de Educación

Guatemala, 09 de diciembre de 2025
Oficio DIPLAN-FE-6939-2025

Licenciada
Anabella María Giracca Méndez
Ministra de Educación
Ministerio de Educación
Su despacho

Señora Ministra:

En cumplimiento a lo que establece el Artículo 53 Bis del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; adjunto para su aprobación y firma los informes del avance físico y financiero y del desempeño de préstamos multianuales, correspondientes al mes de noviembre de 2025, mismos que fueron debidamente revisados conforme Oficio DIPLAN-FE-6938-2025, emitido por la Asistencia Técnica Financiera de la DIPLAN.

Las operaciones incluidas son:

1. Proyecto de Educación Rural V, PROEDUC V, contrato de préstamo KfW No. 28060.
2. Programa Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva de la República de Guatemala, BCIE No. 2138.

Los informes descritos son elaborados, revisados y son responsabilidad de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN- y deben trasladarse a la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional -DICONIME-, quien los enviará oficialmente a las dependencias que conforme a la Ley corresponden.

Atentamente,


Lcdo. Francisco Alfredo Sapon Orellana
Director
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación



Adjunto: lo indicado
FASO/MRGL/eg
cc: Financiamiento Externo



Ministerio de Educación

Guatemala, 04 de diciembre de 2025
Oficio DIPLAN-FE-6938-2025

Licenciado

Francisco Alfredo Sapón Orellana

Director

Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-

Presente

Estimado Licenciado Sapón:

Atentamente me dirijo a usted, para solicitar firma para los informes de avances físicos y financieros del contrato de préstamo Número 28060, Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V) y Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva de la República de Guatemala -BCIE- No. 2138, correspondientes al mes de noviembre de 2025, los cuales serán remitidos a la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional -DICONIME-.

Dichos informes fueron elaborados y revisados por la Unidad Financiera del Financiamiento Externo de esta Dirección, conforme a los datos generados del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, correspondiente al mes de noviembre de 2025.

Sin otro particular, me suscribo deferentemente.

Licenciado Manuel Rodolfo González Lima
Asistencia Técnica Financiera
Dirección de Planificación Educativa
-DIPLAN-

MRGLP/eg
C. c. Archivo

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2025
Mes a Reportar: NOVIEMBRE
Entidad: 11130008
Unidad Ejecutora: MINEDUC
Préstamo: PROEDUC V
Código Presupuesto: 52-0505-0013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO										
II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes			
Componente 1			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Acceso a la Educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Mts. Cuadrados	0	0	0	0.00%		0.00		0.00%
	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Entidad	11	102	0	0%	25,000,000.00	46,689,340.00	31,137,826.50	66.69%
	Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados	Entidad	9	0	0	0	0.00	0.00		0.00%
Componente 2										
Diseño e implementación curricular	implementación curricular	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	108,000.00	62,412.50	0.00%
Componente										
Fortalecimiento institucional	Imprevistos	Varios	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	10,749,248.00	1,211,228.60	0.00%
	Consultoría Internacional	Varios	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	2,695,606.00	2,599,092.54	0.00%
			20	102	0	0.00%	25,000,000.00	60,242,194.00	35,010,560.14	58.12%

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes				
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Meta Total	III.4 Meta Anual	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
Acceso a la Educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educaiva del ciclo diversificado	15835	0	0	0	POA/REPORTES SICOIN	
	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	11	102	102	0	POA/REPORTES SICOIN	
	Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados	9	0	0	0	POA/REPORTES SICOIN	
		15855	102	102	0		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación % Física		IV.3 Alertivos EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO PRESENTADO EN ESTE INFORME, COMPRENDE EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE SIETE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, UBICADAS EN HUEHUETENANGO, QUICHÉ, QUICHÉ NORTE, JALAPA, CHIQUEMULA, ALTA Y BAJA VERAPAZ	
50.72%	55.37%	2.65%			
IV.2 GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera			
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	2.75%			
53.37%	58.12%				

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO		
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL	% DE EJECUCIÓN
84.93%	154,800,956.15	87%

Ldo. Francisco Alfredo Sapon Orellana
Director
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación

M.Sc. José Donaldo Carias Valenzuela
Viceministro Administrativo
Ministerio de Educación

1. DATOS GENERALES

10/06/2012	Fecha de último desembolso:
18/05/2012	Fecha de suscripción:
32-0000-0013	Código Presupuesto:
PROBUD V	Prestamo:
MONEDUC	Unidad Ejecutora:
III-0000	Entidad:
NOVEMBER	Mes a Reportar:
2012	Ejercicio:

Componente	II.1.	Descripción Meta	II.3.	Unidad de Medida	Meta Física	Meta Financiera	II.4.	Metas Préstamo	II.5.	Fechas Previstas del Progreso o Ampliaciones	II.6.	Avance Físico al Año	II.7.	Avance Financiero al Año	II.8.	Avance Físico Acumulado	II.9.	Avance Financiero Acumulado	II.10.	Observaciones
Componente 1 Acceso a Educación Técnica																				
Infraestructura Física		Centros educativos (Viviendo Bajo Desembarazo)			1	10 100 400 00	10,100,400.00	30/04/2019	31/12/2019	30/04/2019	100.0%	100.0%	11,587,000.00	10,018,998.88	86.46%	8	100.00%	10,018,998.88	86.46%	
		Construcción, equipamiento y mantenimiento de infraestructura educativa (de sala de enseñanza)									100.0%	100.0%	93,712,990.00	83,440.00	0.09%	6	0.00%	-43,480.00	0.00%	
		Instalación de tecnología de audio y videoconferencia y											14,964,310.00	476,510.00	3.18%	8		1,386,310.00	12.57%	
Fortalecimiento Institucional		Comunicación Institucional											18,058,819.00	4,377,636.12	24.24%	N/A	0	-1,173,636.12	-6.48%	
		Verificación											132,123,679.00	17,079,613.79	12.92%		0.07%	17,079,613.79	12.92%	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2020
Mes a Reportar: NOVIEMBRE
Entidad: EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora: MINEDUC
Préstamo: PROEDUC V
Código Presupuesto: 53-0505-0001
Fecha de suscripción: 18/10/2018
Fecha de último desembolso: 30/06/2020

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal	2020																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Metas Previstas del Préstamo		II.5. Fechas Vigentes Según Prórrogas o		II.6. Avance Físico al Año			II.7. Avance Financiero al Año			II.8. Avance Físico Acumulado		II.9. Avance Financiero Acumulado		II.10. Observaciones			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **				
Componente 1 Acceso a educación técnica																				
Infraestructura física	Centros escolares del nivel medio ciclo Diversificado, reparados, remozados	Entidad	6	2,302,575.00	1/01/2020	30/04/2020	5	0	0.00%	1,416,000.00	451,000.00	31.85%	0	0.00%	451,000.00	31.85%				
	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura	Mts. Cuadrados	16,824	68,191,848.00	30/04/2020	31/12/2020	10526	203	1.93%	53,769,183.00	779,440.00	1.45%	203	1.93%	779,440.00	1.45%				
	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Entidad	5	20,207,600.00	30/04/2020	31/12/2020	5	0	0.00%	12,782,600.00	0.00	0.00%	0	0.00%	-	0.00%				
Componente 2 Diseño e implementación Curricular	Diseño y desarrollo de materiales curriculares	Evento	1	1,100,000.00	30/04/2020	31/12/2020	1	0	0.00%	1,100,000.00	870,000.00	79.09%	0	0.00%	870,000.00	79.09%				
Fortalecimiento institucional	Consultoría Internacional	Varios	N/A	7,734,977.00	1/01/2020	31/12/2020	N/A		0.00%	1,291,099.00	171,290.00	13.27%	0	0.00%	171,290.00	13.27%				
	Consultoría Internacional	Varios	N/A	0.00	1/01/2020	31/12/2020	N/A	0	0.00%	2,133,000.00	1,422,407.68	66.69%	0	0.00%	1,422,407.68	66.69%				
				99,537,000.00			10537	203	1.93%	72,491,882.00	3,694,137.68	5.10%	203	1.93%	3,694,137.68	5.10%				

Ejercicio Fiscal	2021																				
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Metas Previstas del Préstamo		II.5. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.6. Avance Físico al Año			II.7. Avance Financiero al Año			II.8. Avance Físico Acumulado		II.9. Avance Financiero Acumulado		II.10. Observaciones				
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **					
Componente 1 Acceso a educación técnica Infraestructura física	Centros escolares del nivel medio ciclo Diversificado, reparados, remozados	Entidad	6	2,302,575.00	1/01/2021	30/04/2021	6	0	0.00%	24,369,880.00	0.00	0.00%	0	0.00%	-	0.00%					
	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura	Mts. Cuadrados	16,824	68,191,848.00	1/04/2021	15/08/2021	6546	30.88	0.47%	45,506,015.00	2,103,660.84	4.62%	31	0.47%	2,103,660.84	4.62%					
	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Entidad	5	20,207,600.00	1/01/2021	31/12/2021	7	0	0.00%	7,944,372.00	0.00	0.00%	0	0.00%	-	0.00%					
Componente 2 Diseño e implementación Curricular	Diseño y desarrollo de materiales curriculares	Evento	1	1,100,000.00	1/01/2021	31/12/2021	1	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0	0.00%	-	0.00%					
Fortalecimiento institucional	Imprevistos	Varios	N/A				1	0	0.00%	219,000.00	70,582.38	32.23%	0	0.00%	70,582.38	32.23%					
	Consultoría Internacional	Varios	N/A	7,734,977.00	1/01/2021	31/12/2021	1	0	0.00%	3,905,438.00	3,308,254.00	84.71%	0	N/A	3,308,254.00	84.71%					
				99,537,000.00			6562	30.88	0.47%	81,944,705.00	5,482,497.22	6.69%	31	0.47%	5,482,497.22	6.69%					

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2023
 Mes a Reportar: NOVIEMBRE
 Entidad: 11130000
 Unidad Ejecutora: MMEIUC
 Préstamo: PROEDUCY
 Código Presupuesto: 52-0105-0023
 Fecha de suscripción: 18/10/2018
 Fecha de último desembolso: 30/04/2025

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal	2022																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10.			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Observaciones			
Componente 1 Acceso a educación técnica Infraestructura física	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Mts. Cuadrados	0	31,666,213.00	1/01/2022	31/12/2022	4,773	0	0.00%	31,666,213.00	17,564,691.59	55.47%	0.00	0.00%	17,564,691.59	55.47%				
	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Entidad	102	3,777,438.00	1/01/2022	31/12/2022	12	0	0.00%	3,777,438.00	9,684,431.91	256.38%	0	0.00%	9,684,431.91	256.38%				
	Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados	Entidad	0	11,095,831.00	1/01/2022	31/12/2022	5	0	0.00%	11,095,831.00	10,280,809.97	92.65%	0	0.00%	10,280,809.97	92.65%				
Fortalecimiento institucional	Imprevistos	Evento		191,428.00	1/01/2022	31/12/2022	0	0	0.00%	191,428.00	105,803.76	55.27%	0	0.00%	105,803.76	55.27%				
	Consultoría Internacional	Varios	N/A	1,812,596.00	1/01/2022	31/12/2022	0	0	0.00%	1,812,596.00	1,211,858.23	66.86%	0	0.00%	1,211,858.23	66.86%				
TOTAL				48,543,506.00			4790	0	0.00%	48,543,506.00	38,847,595.46	80.03%	0.00	0.00%	38,847,595.46	80.03%				

Ejercicio Fiscal	2023																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10.			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Observaciones			
Componente 1 Acceso a educación técnica Infraestructura física	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Mts. Cuadrados	5,303	5,740,313.00	1/01/2023	31/12/2023	5,303	3903.47	73.61%	44,524,953.00	33,414,669.16	75.05%	3,903.47	73.61%	33,414,669.16	75.05%				
	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Entidad	11	2,156,848.00	1/01/2023	31/12/2023	11	2	18.18%	2,156,848.00	483,900.00	22.44%	2	18.18%	483,900.00	22.44%				
	Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados	Entidad	2	67,249.00	1/01/2023	31/12/2023	2	2	100.00%	607,657.00	572,181.34	94.16%	2	100.00%	572,181.34	94.16%				
Diseño e implementación curricular	Implementación curricular	Unidad	N/A	50,000.00	1/01/2023	31/12/2023	N/A	N/A	0.00%	50,000.00	0.00			0.00%						
Fortalecimiento institucional	Imprevistos	Evento	N/A	130,000.00	1/01/2023	31/12/2023	N/A	N/A	0.00%	315,486.00	217,786.00	0.00%	N/A	0.00%	217,786.00	69.03%				
	Consultoría Internacional	Varios	N/A	1,117,590.00	1/01/2023	31/12/2023	N/A	N/A	0.00%	3,719,778.00	3,076,185.29	82.70%	N/A	0.00%	3,076,185.29	82.70%				
TOTAL				9,262,000.00			5316	3907.47	73.50%	51,374,722.00	37,764,721.79	73.51%	3,907.47	73.50%	37,764,721.79	73.51%				

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2024
Mes a Reportar: NOVIEMBRE
Entidad: 11130008
Unidad Ejecutora: MINEDUC
Préstamo: PROEDUC V
Código Presupuesto: 52-0005-0013
Fecha de suscripción: 18/10/2018
Fecha de último desembolso: 30/06/2025

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4.6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal 2024																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente 1 Acceso a educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Mts. Cuadrados	793	5,740,313.00	1/01/2024	31/12/2024	178	0	0.00%	887,891.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	0.00%	
	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Entidad	11	2,156,848.00	1/01/2024	31/12/2024	7	5	71.43%	64,967,165.00	9,684,431.91	14.91%	5	71.43%	9,684,431.91	14.91%	
	Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados	Entidad	1	67,249.00	1/01/2024	31/12/2024	0	0	0.00%	536,249.00	0.00	0.00%	0	0.00%	-	0.00%	
Diseño e implementación curricular	Implementación curricular	Unidad	N/A	50,000.00	1/01/2024	31/12/2024	N/A	N/A	0.00%	304,000.00	0.00	0.00%	N/A	0.00%	-	-	
Fortalecimiento institucional	Imprevistos	Evento	N/A	130,000.00	1/01/2024	31/12/2024	N/A	N/A	0.00%	367,282.00	183,081.28	0.00%	N/A	N/A	183,081.28	49.85%	
	Consultoría Internacional	Varios	N/A	1,117,590.00	1/01/2024	31/12/2024	N/A	N/A	0.00%	2,737,546.00	1,582,110.88	57.79%	N/A	N/A	1,582,110.88	57.79%	
TOTAL				9,262,000.00			185	5	2.70%	69,800,133.00	11,449,624.07	16.40%	5.00	2.70%	11,449,624.07	16.40%	

Ejercicio Fiscal 2025																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente 1 Acceso a educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Mts. Cuadrados	0	0.00			0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	0.00%	
	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Entidad	102	46,689,340.00	1/01/2025	30/06/2025	102	0	0.00%	46,689,340.00	31,137,826.50	66.69%	0	0.00%	31,137,826.50	66.69%	
	Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados	Entidad	0	0.00			0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0	0.00%	-	0.00%	
Diseño e implementación curricular	Implementación curricular	Unidad	N/A	0.00			N/A	N/A	0.00%	108,000.00	62,412.50	57.79%	N/A	0.00%	-	-	
Fortalecimiento institucional	Imprevistos	Evento	N/A	0.00			N/A	N/A	0.00%		0.00	0.00%	N/A	N/A	-	0.00%	
	Consultoría Internacional	Varios	N/A	0.00			N/A	N/A	0.00%	10,749,248.00	1,211,228.60	11.27%	N/A	N/A	1,211,228.60	11.27%	
TOTAL				46,689,340.00			102	0	0.00%	60,242,194.00	35,010,560.14	58.12%	0.00	0.00%	35,010,560.14	58.12%	

III. Resumen				
III.1. Año	III.2. Avance Físico del Año	III.3. Avance Financiero del Año	III.4. Avance Físico Acumulado	III.5. Avance Financiero Acumulado
2018	0%	27.48%	N/A	5,478,204.00
2019	0.02%	12.92%	0.02%	17,073,615.79
2020	1.93%	5.10%	1.93%	3,694,137.68
2021	0.47%	6.59%	0.47%	5,482,497.22
2022	0.00%	80.03%	0.00%	38,847,595.46
2023	73.50%	73.51%	73.50%	37,764,721.79
2024	2.70%	16.40%	2.70%	11,449,624.07
2025	0.00%	0.00%	0.00%	35,010,560.14
Total				154,800,956.15


Lcdo. Francisco Alfredo Sapón Orellana
Director
Dirección de Planificación Educativa - DIPLAN-
Ministerio de Educación


M.Sc. José Domingo Carías Valenzuela
Viceministro Administrativo
Ministerio de Educación



Sección 3. - Informe de Avance Físico, Financiero - Principales Inversiones

I DATOS GENERALES

Ejercicio:	2025	Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
Mes a Reportar:	NOVIEMBRE	
Entidad:	1113-0008	
Unidad Ejecutora:	MINEDUC	
Préstamo:	PROEDUC V	
Código Presupuesto:	52-0505-0013	

II PRINCIPALES INVERSIONES

II.1. No. Componente	II.2. Nombre del Componente	II.3. Inversión (Producto)	II.4. NOG	II.5. SNIP	Fecha de Inicio de Ejecución	Fecha Final de Ejecución	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera	II.6. Observaciones
Acceso a la educación técnica	Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados	REHABILITACIÓN DEL INEBE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA	14110903	N/A	9/12/2021	7/04/2022	100.00%	100.00%	Concluido
		REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SAJACABAJÁ, QUICHÉ	14110903	N/A	19/01/2022	6/10/2022	100.00%	100.00%	Concluido
Acceso a la educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, UBICADO EN EL CANTÓN SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO.	14126478	225120, 225122	18/02/2022	31/05/2023	100.00%	100.00%	Concluido
		CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, UBICADO EN LA ALDEA EL PINALITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	14126478		5/04/2022	31/03/2023	100.00%	100.00%	Concluido
Acceso a la educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Construcción Instituto Diversificado municipio de Nebaj, Quiché	16832825	225121	30/11/2022	25/11/2023	2.80%	0.00%	El contrato fue rescindido con fecha 4/10/2023
Acceso a la educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Construcción Instituto Diversificado municipio de Jacaltenango, Huehuetenango	14126478	225122	18/02/2022	19/06/2023	100%	100%	El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Construcción Instituto Diversificado municipio de San Pedro Pinula, Jalapa	1412678	225120	15/04/2022	28/06/2023	100%	100%	El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Rehabilitación del INEB, ubicado en el municipio de Santa Cruz Barrillas, departamento de Huehuetenango.	14110903	N/A	13/02/2022	14/05/2022	100%	100%	El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Rehabilitación de la EOM regional, ubicada en el Caserio La Cruz Regional, Cúicco, departamento de Huehuetenango.	14110903	N/A	15/03/2022	13/07/2022	100%	100%	El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Rehabilitación de, INEBE con Orientación Ocupacional, Dr. Silvano Antonio Carias Recinos, municipio de Jalapa, Jalapa.	14110903	N/A	15/03/2022	13/07/2022	100%	100%	El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Rehabilitación del Instituto Nacional de Educación Diversificada, municipio de San Andrés Sajcabajá, Quiché	14110903	N/A	15/03/2022	13/06/2022	100%	100%	El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Licitación Pública Nacional No. LPN-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2023 Adquisición de equipamiento para Taller de construcción para un (1) Instituto Tecnológico.	19716028	N/A	20/12/2023	31/01/2024	100%	100%	El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Adquisición de equipamiento para taller de procesamiento de alimentos productos lácteos, taller de procesamiento de frutas y vegetales y taller de cocina y gastronomía. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-02-2023	19823940	N/A	8/12/2023	19/01/2024	100%	100%	El contrato se encuentra recepcionado y liquidado

Acceso a la educación técnica	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Licitación Pública Internacional No. LPI-KW-PROEDUC V-BNS-01-2023 Adquisición de equipamiento para talleres de mecánica diésel para dos (2) Institutos Tecnológicos.	19723717	225120, 225122	10/04/2024	10/09/2024	100.00%	100.00%	El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Licitación Pública Internacional No. LPI-KW-PROEDUC V-BNS-03-2023 Adquisición de equipo y mobiliario para Laboratorios de Física, Química y Biología para centros educativos.	20626592	N/A	15/04/2024	15/12/2024	100.00%	100.00%	FECHA ÚLTIMA ADJUDICACIÓN 08/03/2024
Acceso a la educación técnica	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Licitación Pública Internacional No. LPI-KW-PROEDUC V-BNS-04-2023 Adquisición de equipo para laboratorios de cómputo para dos (2) Institutos Tecnológicos del Nivel Diversificado	20625774	225120, 225122	22/05/2024	27/08/2024	100.00%	100.00%	FECHA ÚLTIMA ADJUDICACIÓN 14/02/2024
Acceso a la educación técnica	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Licitación Pública Nacional No. LPN-KW-PROEDUC V-BNS-03-2023 Adquisición de equipo para laboratorios de cómputo para tres (3) Institutos del Nivel Diversificado	20977425	225120, 225122	14/03/2024	26/08/2024	100.00%	100.00%	FECHA ÚLTIMA ADJUDICACIÓN 14/02/2024
Acceso a la educación técnica	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Adquisición de equipo para Laboratorios de física, química y biología para siete (7) Centros Educativos, ubicados en Alta Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché	22886087	N/A	23/10/2024		0.00%	0.00%	FECHA ÚLTIMA ADJUDICACIÓN 23/08/2024
Acceso a la educación técnica	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Adquisición de equipo de Computo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado	24276502	N/A	29/01/2025	29/08/2025	100.00%	100.00%	FECHA ÚLTIMA ADJUDICACIÓN 05/02/2025
Acceso a la educación técnica	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Adquisición de equipo para Talleres especializados en Mecánica para centros educativos del nivel diversificado	24405205	N/A	5/02/2025	8/09/2025	100.00%	100.00%	FECHA ÚLTIMA ADJUDICACIÓN 28/01/2025
Acceso a la educación técnica	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Adquisición de equipo para Laboratorios de física, química y biología / Talleres de ciencias biológicas para Centros Educativos del nivel diversificado	23908319	N/A	6/01/2025				FECHA ÚLTIMA ADJUDICACIÓN 27/12/2024
Acceso a la educación técnica	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Adquisición de equipo para Talleres especializados en Construcción para centros educativos del nivel diversificado	23908548	N/A	7/02/2025	14/10/2025	100.00%	100.00%	FECHA ÚLTIMA ADJUDICACIÓN 04/02/2025
Acceso a la educación técnica	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Adquisición de equipo para Talleres especializados en Electricidad para 7 Centros Educativos del nivel diversificado	24244236	N/A	6/01/2025	15/07/2025	100.00%	100.00%	FECHA ÚLTIMA ADJUDICACIÓN 27/12/2024
Acceso a la educación técnica	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Adquisición de 3 generadores de energía eléctrica para 3 Centros Educativos del Nivel Diversificado	N/A	N/A	25/06/2025	8/07/2025	100.00%	100.00%	El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Adquisición de Licencias de Software para los Institutos Tecnológicos ubicados en Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.	N/A	N/A	25/06/2025	11/07/2025	100.00%	100.00%	El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Fortalecimiento Institucional	Infraestructura de dirección departamental	Adquisición de mobiliario y equipamiento de siete Direcciones Departamentales	26866692	N/A	5/09/2025	28/11/2025	100.00%	100.00%	FINALIZADO


Lcdo. Francisco Alfredo Sapón Orellana
Director
 Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN
 Ministerio de Educación


M.Sc. José Donaldo Carías Valenzuela
Viceministro Administrativo
 Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 VICEDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 GUATEMALA, C. A.

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2025
 Mes a Reportar: NOVIEMBRE
 Entidad: 11130008
 Unidad Ejecutora: MINEDUC
 Préstamo: BCIE
 Código Presupuesto: 502-0401-0067

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
N/A	Apoyo a proyectos de Inversión en Infraestructura Social y productiva de la República de Guatemala	N/A	N/A	N/A	N/A	0%				0%	

TOTAL

0%

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Meta Total	III.4 Meta Anual	III.5 Vigente (Año)	Avance del mes			III.8 Notas Aclaratorias
					III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recurso comparativo				IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR							
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA					
0%		0%					
		Variación % Física		0%		IV. 3 Alertivos No se reporta ejecución mensual debido a que no se registro ningún desembolso. A la vez, no se asignó presupuesto para el año 2025.	
IV. 2 GESTIÓN AL MES							
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA					
0%		0%					
		Variación % Financiera		0%			


* Índices calculados variación a la meta en el año.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO

Ejecución Física Total	Ejecución Financiera Total
100%	100%

Lcdo. Francisco Alfredo Sapan Orellana
 Director
 Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
 Ministerio de Educación



M.Sc. José Donaldo Carías Valenzuela
 Viceministro Administrativo
 Ministerio de Educación



1. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

B. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)																		
Ejercicio Fiscal	2015																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado	% Ejecución		
N/A		N/A	N/A	N/A														
			0.00					0.00			0.00			#B/DV/EI				
Ejercicio Fiscal	2016																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado	% Ejecución		
N/A		N/A	N/A	N/A														
			0.00					0.00			0.00							
Ejercicio Fiscal	2017																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado	% Ejecución		
N/A		N/A	N/A	N/A														
			0.00					0.00			0.00							
Ejercicio Fiscal	2018																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado	% Ejecución		
N/A		N/A	N/A	N/A														
			0.00					0.00			0.00							
Ejercicio Fiscal	2019																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado	% Ejecución		
N/A		N/A	N/A	N/A														
			0.00					0.00			0.00							
Ejercicio Fiscal	2020																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado	% Ejecución		
N/A		N/A	N/A	N/A														
			0.00					0.00			0.00							
Ejercicio Fiscal	2021																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución		
N/A		N/A	N/A	N/A														
			0.00					0.00			0.00							

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

III. Resumen				
III.1. Año	III.2. Avance Físico del Año	III.3. Avance Financiero del Año	III.4. Avance Físico Acumulado	III.5. Avance Financiero Acumulado

M.Sc. José Donald Carias Valenzuela
Viceministro Administrativo
Ministerio de Educación

Sección 3. - Informe de Avance Físico, Financiero - Principales Inversiones

I DATOS GENERALES

Ejercicio:	2025	<p>Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.</p> <p>Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.</p> <p>Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.</p>
Mes a Reportar:	NOVIEMBRE	
Entidad:	11130008	
Unidad Ejecutora:	MINEDUC	
Préstamo:	80E	
Código Presupuestario:	52-0401-0067	

II PRINCIPALES INVERSIONES

II.1. No. Componente	II.2. Nombre del Componente	II.3. Inversión (Producto)	II.4. NOG	II.5. SNIP	Fecha de Inicio de Ejecución	Fecha Final de Ejecución	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera	II.6. Observaciones


Lcde. Francisco Alfredo Sapón Orellana
 Director
 Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN
 Ministerio de Educación


M. Sc. Jose Donaldo Carras Valenzuela
 Viceministro Administrativo
 Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 VICEDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 GUATEMALA, C. A.
