

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Enero / 2023**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE EDUCACION RURAL V -PROEDUC V**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V	Fecha de última actualización	13/02/2023
Código Presupuestario	5205050013	Fecha del Decreto	27/10/2015
Organismo Financiero	KFW	Fecha de Suscripción	18/10/2016
Moneda del Préstamo	EUR	Fecha de Vigencia	18/10/2016
Monto contratado	21,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/10/2016
Monto contratado Entidad ejecutora	21,000,000.00	Fecha de cierre actual	31/12/2024
Monto Entidad Ejecutora Dolares	22,776,600.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	178,764,422.76	Plazo de ejecución	77.00%
Desembolsos realizados a la fecha	11,435,681.93 50.21%	Monto por desembolsar USD\$	11,340,918.07 49.79%

Gráfica de Ejecución

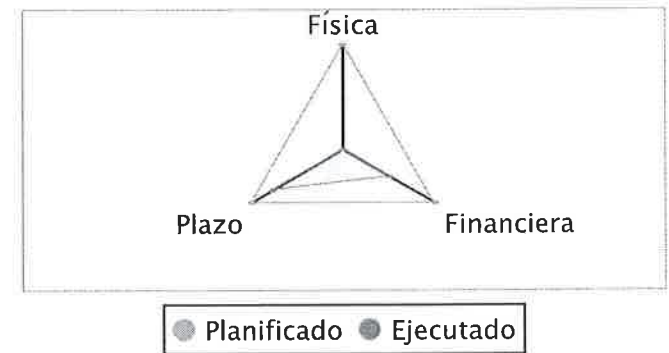

Tipo de cambio: 7.8486 X 1 USD



Handwritten signature/initials

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Enero		Indicadores de Avance Anuales 2023		Total	
Asignación Presupuestaria anual	9,262,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	9,262,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	0.00% / 0.00%		
Porcentaje de Ejecución	0.00%	Próximo desembolso del mes	Abril	Plazo de ejecucion Actual	77.00%		
		Presupuesto planificado próximo	3,886,999.20	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0.9956		

Handwritten signature

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Acceso a Educación Técnica									
Supervision Tecnica de Obras	Unidad	0		0		6		6	
Construcción de Institutos Tecnológicos	Unidad	3		0		0		3	
Mobiliario y Equipo para obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y Recreativo INED´s JALAPA Y HUEHUETENANGO	Unidad	0		2		0		2	
Mobiliario y equipo para las obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y recreativo, INED Nebaj, Quiché	Unidad	0		0		1		1	
Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de los INED´s JALAPA y HUEHUETENANGO	Unidad	0		2		0		2	
Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de INED Nebaj, Quiché	Unidad	0		0		1		1	
Equipo de laboratorios, de Química, Física y Biología de INED´s de JALAPA Y HUEHUETENANGO	Unidad	0		2		0		2	
Equipo de Laboratorio de Química, Física y Biología del INED de Nebaj, Quiché	Unidad	0		0		1		1	
Equipo para Talleres Especializados para los INED´s de JALAPA y HUEHUETENANGO	Unidad	0		2		0		2	
Equipo para Talleres Especializados para el INED de Nebaj, Quiché	Unidad	0		0		1		1	
Componente: Diseño e Implementación Curricular									

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Implementación curricular (reproducción de material)	Unidad	0		1		0		1	
Componente: Fortalecimiento Institucional									
Consultoría internacional	Unidad	0		0		1		1	
Servicios de auditoría del programa	Unidad	0		0		1		1	
Publicaciones para Licitaciones	Unidad	2		1		0		3	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Acceso a Educación Técnica											
Construcción de Institutos Tecnológicos											
Construcción Instituto Diversificado, Chisec Alta Verapaz	Licitación Pública Internacional	22/12/2022	09/01/2023	20/02/2023		11/04/2023		01/06/2023		09/06/2023	
Construcción Instituto Diversificado, Rabinal, Baja Verapaz	Licitación Pública Internacional	22/12/2022	09/01/2023	22/02/2023		17/04/2023		09/06/2023		19/06/2023	
Mobiliario y Equipo para obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y Recreativo INED´s JALAPA Y HUEHUETENANGO											
Bienes	Licitaciones locales	07/02/2023		02/03/2023		11/04/2023		01/06/2023		08/06/2023	
Mobiliario y equipo para las obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y recreativo, INED Nebaj, Quiché											
Bien	Licitaciones locales	20/02/2023		15/03/2023		21/04/2023		13/06/2023		20/06/2023	
Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de los INED´s JALAPA y HUEHUETENANGO											
Bien	Licitaciones locales	23/02/2023		20/03/2023		26/04/2023		16/06/2023		23/06/2023	
Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de INED Nebaj, Quiché											
Bien	Licitaciones locales	02/06/2023		27/06/2023		03/08/2023		23/09/2023		30/09/2023	
Equipo de laboratorios, de Química, Física y Biología de INED´s de JALAPA Y HUEHUETENANGO											
Bien	Licitaciones locales	23/02/2023		23/03/2023		29/04/2023		19/06/2023		26/06/2023	
Equipo de Laboratorio de Química, Física y Biología del INED de Nebaj, Quiché											
Bien	Licitaciones locales	02/06/2023		30/06/2023		06/08/2023		26/09/2023		03/10/2023	

Fca

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Equipo para Talleres Especializados para los INED´s de JALAPA y HUEHUETENANGO											
Bien	Licitación Pública Internacional	08/02/2023		08/03/2023		29/04/2023		19/06/2023		26/06/2023	
Equipo para Talleres Especializados para el INED de Nebaj, Quiché											
Bien	Licitaciones locales	02/06/2023		30/06/2023		21/08/2023		11/10/2023		18/10/2023	
Diseño e Implementación Curricular											
Implementación curricular (reproducción de material)											
Servicio (Implementación curricular)	Adjudicación directa	02/01/2023		06/02/2023		13/02/2023		20/02/2023		28/02/2023	
Fortalecimiento Institucional											
Publicaciones para Licitaciones											
Servicio (Publicaciones de Licitaciones)	Adjudicación directa	02/01/2023		13/01/2023		16/01/2023		20/01/2023		23/01/2023	

Few

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Acceso a Educación Técnica													
Supervision Tecnica de Obras													
Servicio (Supervisión de obras 5 INED'S y auxiliar Ingeniería eléctrica)	0.00	87,861.00	48,549.00	70,930.00	40,330.00	71,747.35	70,930.00	104,835.00	24,198.00	135,435.00	0.00	104,835.00	759,650.35
Construcción de Institutos Tecnológicos													
Construcción Instituto Diversificado, Chisec Alta Verapaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868,959.38	0.00	2,803,439.06	0.00	4,672,398.44	9,344,796.88
Construcción Instituto Diversificado, Rabinal, Baja Verapaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,902.45	0.00	2,843,853.67	0.00	4,739,756.12	9,479,512.24
Construcción Instituto Diversificado, Jacaltenango Huehuetenango	0.00	9,465,887.00	2,200,000.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,665,887.12
Construcción Instituto Diversificado, San Pedro Pinula, Jalapa	0.00	10,252,974.39	2,563,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,816,217.99
Construcción Instituto Diversificado, Nebaj, Quiché	0.00	0.00	4,103,566.00	0.00	4,573,980.40	0.00	4,573,980.40	0.00	0.00	4,573,980.20	0.00	0.00	17,825,507.00
Mobiliario y Equipo para obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y Recreativo INED's JALAPA Y HUEHUETENANGO													
Bienes	0.00	0.00	1,329,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,533.34
Mobiliario y equipo para las obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y recreativo, INED Nebaj, Quiché													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,766.67	0.00	0.00	664,766.67
Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de los INED's JALAPA y HUEHUETENANGO													
Bien	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00
Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de INED Nebaj, Quiché													

PCV

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	565,000.00
Equipo de laboratorios, de Química, Física y Biología de INED's de JALAPA Y HUEHUETENANGO													
Bien	0.00	0.00	692,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,550.00
Equipo de Laboratorio de Química, Física y Biología del INED de Nebaj, Quiché													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,750.00	0.00	0.00	384,750.00
Equipo para Talleres Especializados para los INED's de JALAPA y HUEHUETENANGO													
Bien	0.00	0.00	1,378,000.45	1,342,818.00	0.00	0.00	0.00	1,403,551.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124,369.51
Equipo para Talleres Especializados para el INED de Nebaj, Quiché													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,005.70	0.00	0.00	26,005.70	0.00	52,011.40
Total componente	0.00	19,806,722.39	12,315,442.51	2,543,748.00	4,614,310.40	71,747.35	4,644,910.40	5,299,253.61	24,198.00	11,406,224.60	591,005.70	9,516,989.56	70,834,552.52
Diseño e Implementación Curricular													
Implementación curricular (reproducción de material)													
Servicio (Implementación curricular)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total componente	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Fortalecimiento Institucional													
Consultoría internacional													
Servicio (Funcionamiento de la Asistencia Técnica Internacional)	0.00	512,140.83	0.00	580,453.87	0.00	0.00	580,453.87	0.00	0.00	580,453.86	0.00	0.00	2,253,502.43


FEW

2

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Servicios de auditoria del programa													
Servicio (contratación de una firma externa de auditoria)	0.00	26,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
Publicaciones para Licitaciones													
Servicio (Publicaciones de Licitaciones)	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
Total componente	0.00	502,140.83	0.00	684,453.87	0.00	12,000.00	580,453.87	24,000.00	12,000.00	580,453.88	0.00	0.00	2,455,502.43
Total	0.00	20,368,663.22	12,415,442.51	3,328,201.87	4,714,310.40	83,747.35	5,225,364.27	5,323,253.01	30,189.00	11,986,678.46	591,005.70	9,516,988.56	73,590,054.98

400

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

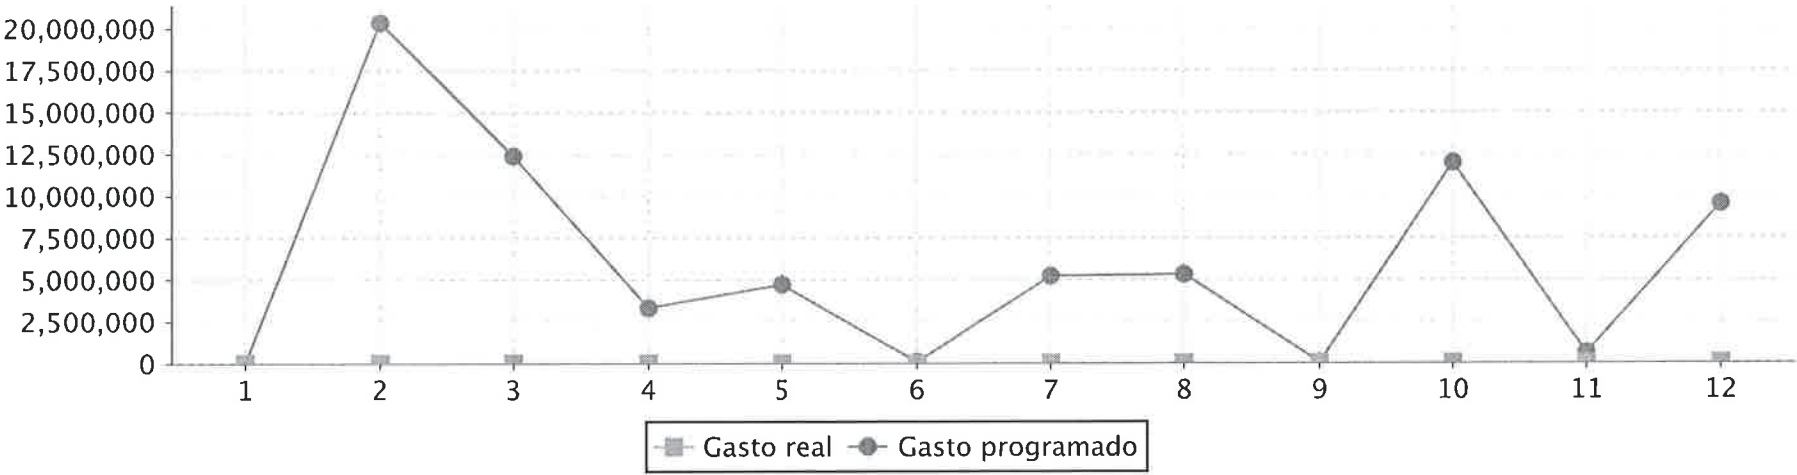

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	20,368,863.22	12,415,442.51	3,328,201.87	4,714,310.40	83,747.35	5,225,364.27	5,323,253.61	36,198.00	11,986,678.46	591,005.70	9,516,989.56
Total Gasto real	0.00											
Total Gasto programado	73,590,054.95											

Fes

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	0.00	0.00	0.00	3,886,999.20	0.00	0.00	0.00	5,416,309.51	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	3,886,999.20	0.00	0.00	0.00	5,416,309.51	0.00	0.00	0.00	0.00

FLA

Observaciones /Desafíos

- 1) Se firmaron contratos para la Construcción de los INEDS de Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pínula, Jalapa, los cuales se encuentran en ejecución.
- 2) En septiembre de 2022 se firmó contrato para la Construcción del INED ubicado en Nebaj, Quiché, el cual inicio su ejecución a finales de noviembre de 2022.

Alertivos

Elaborado por: (nombre y firma):

[Firma]
Lic. Marco Antonio Turcios E.
Coordinador Administrativo Financiero
Departamento Administrativo
Financiero -DIPLAN-
Ministerio de Educación

[Firma]
M. Sc. Ingrid Sucely De León Piedrasanta de Díaz

M. Sc. Ingrid Sucely de León Piedrasanta
DIRECTORA
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación

Aprobado por: (Nombre y firma): M. Sc. Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada



Fecha de actualización: 13/2/2023 - 8:52 AM

Fed

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ORGANISMO = 505, CORRELATIVO = 13
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 9/02/2023
 HORA : 15:27.51
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130008-0105	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA	9,212,000.00	0.00	9,212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,212,000.00	9,212,000.00	0.00	0.00
11130008-0124	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		9,262,000.00	0.00	9,262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,262,000.00	9,262,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 9/02/2023
HORA : 11:12.52
REPORTE : R00817366.rpt

[illegible]
