

# Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Noviembre / 2023**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE EDUCACION RURAL V -PROEDUC V**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

|                                       |                      |                               |                     |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| Número de Préstamo                    | KFW-PROEDUC V        | Fecha de última actualización | 13/12/2023          |
| Código Presupuestario                 | 5205050013           | Fecha del Decreto             | 27/10/2015          |
| Organismo Financiero                  | KFW                  | Fecha de Suscripción          | 18/10/2016          |
| Moneda del Préstamo                   | EUR                  | Fecha de Vigencia             | 18/10/2016          |
| Monto contratado                      | 21,000,000.00        | Fecha de Elegibilidad         | 18/10/2016          |
| Monto contratado Entidad ejecutora    | 21,000,000.00        | Fecha de cierre actual        | 31/12/2024          |
| Monto Entidad Ejecutora Dolares       | 22,963,500.00        | Meses de Prórroga             | 0                   |
| Monto contratado Entidad ejecutora Q. | 179,767,463.40       | Plazo de ejecución            | 87.00%              |
| Desembolsos realizados a la fecha     | 15,097,338.55 65.74% | Monto por desembolsar USD\$   | 7,866,161.45 34.26% |

**Gráfica de Ejecución**

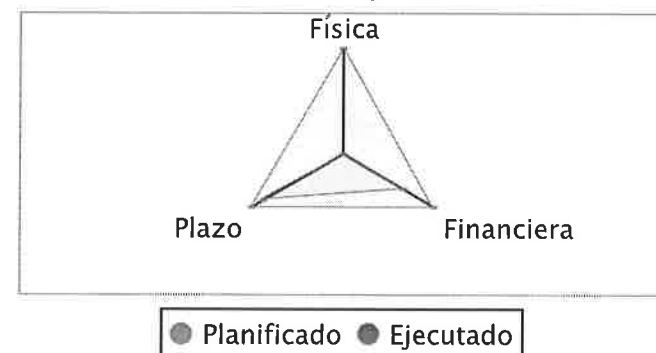

Tipo de cambio: 7.8284 X 1 USD



| Ejecución Presupuestaria Anual  |               | Desembolsos Mensuales Noviembre  |      | Indicadores de Avance Anuales 2023                                             |                  | Total                |        |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------|
| Asignación Presupuestaria anual | 9,262,000.00  | Desembolso planificado en el mes | 0.00 | Desembolsos Acumulados del Año                                                 | 2186987.09       | Ejecución Financiera | 10.00% |
| Presupuesto Vigente anual       | 62,666,978.00 | Desembolso realizado en el mes   | 0.00 | Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos   | 23.51% / 100.00% |                      |        |
| Presupuesto Devengado           | 36,627,572.91 | Diferencia                       | 0.00 | Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados | 50.64% / 87.07%  |                      |        |
| Porcentaje de Ejecución         | 58.45%        | Próximo desembolso del mes       | Mes  | Plazo de ejecucion Actual                                                      | 87.00%           |                      |        |
|                                 |               | Presupuesto planificado próximo  | 0.00 | Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual                              | 0.9956           |                      |        |

## Metas año fiscal

| Producto                                                                                                                                             | Unidad de medida | Meta cuatrimestre I |      | Meta cuatrimestre II |      | Meta cuatrimestre III |      | Meta anual  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------|----------------------|------|-----------------------|------|-------------|------|
|                                                                                                                                                      |                  | Planificado         | Real | Planificado          | Real | Planificado           | Real | Planificado | Real |
| Componente: Acceso a Educación Técnica                                                                                                               |                  |                     |      |                      |      |                       |      |             |      |
| Supervision Tecnica de Obras                                                                                                                         | Unidad           | 0                   |      | 0                    |      | 6                     | 5    | 6           | 5    |
| Construcción de Institutos Tecnológicos                                                                                                              | Unidad           | 3                   |      | 0                    |      | 0                     | 2    | 3           | 2    |
| Mobiliario y Equipo para obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y Recreativo INED's JALAPA Y HUEHUETENANGO | Unidad           | 0                   |      | 2                    |      | 0                     | 2    | 2           | 2    |
| Mobiliario y equipo para las obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y recreativo, INED Nebaj, Quiché       | Unidad           | 0                   |      | 0                    |      | 1                     | 0    | 1           | 0    |
| Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de los INED's JALAPA Y HUEHUETENANGO                                               | Unidad           | 0                   |      | 2                    |      | 0                     | 0    | 2           | 0    |
| Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de INED Nebaj, Quiché                                                              | Unidad           | 0                   |      | 0                    |      | 1                     |      | 1           |      |
| Equipo de laboratorios, de Química, Física y Biología de INED's de JALAPA Y HUEHUETENANGO                                                            | Unidad           | 0                   |      | 2                    |      | 0                     |      | 2           |      |
| Equipo de Laboratorio de Química, Física y Biología del INED de Nebaj, Quiché                                                                        | Unidad           | 0                   |      | 0                    |      | 1                     |      | 1           |      |
| Equipo para Talleres Especializados para los INED's de JALAPA y HUEHUETENANGO                                                                        | Unidad           | 0                   |      | 2                    |      | 0                     |      | 2           |      |
| Equipo para Talleres Especializados para el INED de Nebaj, Quiché                                                                                    | Unidad           | 0                   |      | 0                    |      | 1                     |      | 1           |      |
| Componente: Diseño e Implementación Curricular                                                                                                       |                  |                     |      |                      |      |                       |      |             |      |

| Producto                                             | Unidad de medida | Meta cuatrimestre I |      | Meta cuatrimestre II |      | Meta cuatrimestre III |      | Meta anual  |      |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------|----------------------|------|-----------------------|------|-------------|------|
|                                                      |                  | Planificado         | Real | Planificado          | Real | Planificado           | Real | Planificado | Real |
| Implementación curricular (reproducción de material) | Unidad           | 0                   |      | 1                    |      | 0                     |      | 1           |      |
| <b>Componente: Fortalecimiento Institucional</b>     |                  |                     |      |                      |      |                       |      |             |      |
| Consultoría internacional                            | Unidad           | 0                   | 1    | 0                    |      | 1                     |      | 1           | 1    |
| Servicios de auditoría del programa                  | Unidad           | 0                   | 1    | 0                    |      | 1                     |      | 1           | 1    |
| Publicaciones para Licitaciones                      | Unidad           | 2                   | 1    | 1                    | 2    | 0                     |      | 3           | 3    |

# Plan Adquisiciones Año Fiscal

| Adquisición                                                                                                                                          | Metodo                           | Preparación de documentos |            | Lanzamiento de evento |            | Recepción y evaluación de |            | Adjudicación |      | Firma de contrato |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------|--------------|------|-------------------|------|
|                                                                                                                                                      |                                  | Planificado               | Real       | Planificado           | Real       | Planificado               | Real       | Planificado  | Real | Planificado       | Real |
| Acceso a Educación Técnica                                                                                                                           |                                  |                           |            |                       |            |                           |            |              |      |                   |      |
| Construcción de Institutos Tecnológicos                                                                                                              |                                  |                           |            |                       |            |                           |            |              |      |                   |      |
| Construcción Instituto Diversificado, Chisec Alta Verapaz                                                                                            | Licitación Pública Internacional | 22/12/2022                | 09/01/2023 | 20/02/2023            | 18/04/2023 | 11/04/2023                | 18/07/2023 | 01/06/2023   |      | 09/06/2023        |      |
| Construcción Instituto Diversificado, Rabinal, Baja Verapaz                                                                                          | Licitación Pública Internacional | 22/12/2022                | 09/01/2023 | 22/02/2023            | 18/04/2023 | 17/04/2023                | 19/07/2023 | 09/06/2023   |      | 19/06/2023        |      |
| Mobiliario y Equipo para obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y Recreativo INED's JALAPA Y HUEHUETENANGO |                                  |                           |            |                       |            |                           |            |              |      |                   |      |
| Bienes                                                                                                                                               | Licitaciones locales             | 07/02/2023                | 28/02/2023 | 02/03/2023            | 25/09/2023 | 11/04/2023                | 29/09/2023 | 01/06/2023   |      | 08/06/2023        |      |
| Mobiliario y equipo para las obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y recreativo, INED Nebaj, Quiché       |                                  |                           |            |                       |            |                           |            |              |      |                   |      |
| Bien                                                                                                                                                 | Licitaciones locales             | 20/02/2023                |            | 15/03/2023            |            | 21/04/2023                |            | 13/06/2023   |      | 20/06/2023        |      |
| Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de los INED's JALAPA y HUEHUETENANGO                                               |                                  |                           |            |                       |            |                           |            |              |      |                   |      |
| Bien                                                                                                                                                 | Licitaciones locales             | 23/02/2023                | 15/06/2023 | 20/03/2023            | 06/09/2023 | 26/04/2023                | 25/10/2023 | 16/06/2023   |      | 23/06/2023        |      |
| Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de INED Nebaj, Quiché                                                              |                                  |                           |            |                       |            |                           |            |              |      |                   |      |
| Bien                                                                                                                                                 | Licitaciones locales             | 02/06/2023                |            | 27/06/2023            |            | 03/08/2023                |            | 23/09/2023   |      | 30/09/2023        |      |
| Equipo de laboratorios, de Química, Física y Biología de INED's de JALAPA Y HUEHUETENANGO                                                            |                                  |                           |            |                       |            |                           |            |              |      |                   |      |
| Bien                                                                                                                                                 | Licitaciones locales             | 23/02/2023                | 06/09/2023 | 23/03/2023            | 06/09/2023 | 29/04/2023                | 24/10/2023 | 19/06/2023   |      | 26/06/2023        |      |
| Equipo de Laboratorio de Química, Física y Biología del INED de Nebaj, Quiché                                                                        |                                  |                           |            |                       |            |                           |            |              |      |                   |      |
| Bien                                                                                                                                                 | Licitaciones locales             | 02/06/2023                |            | 30/06/2023            |            | 06/08/2023                |            | 26/09/2023   |      | 03/10/2023        |      |

| Adquisición                                                                   | Metodo                           | Preparación de documentos |            | Lanzamiento de evento |            | Recepción y evaluación de |            | Adjudicación |            | Firma de contrato |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------|--------------|------------|-------------------|------|
|                                                                               |                                  | Planificado               | Real       | Planificado           | Real       | Planificado               | Real       | Planificado  | Real       | Planificado       | Real |
| Equipo para Talleres Especializados para los INED´s de JALAPA y HUEHUETENANGO |                                  |                           |            |                       |            |                           |            |              |            |                   |      |
| Bien                                                                          | Licitación Pública Internacional | 08/02/2023                | 24/05/2023 | 08/03/2023            | 28/06/2023 | 29/04/2023                | 16/08/2023 | 19/06/2023   | 27/09/2023 | 26/06/2023        |      |
| Equipo para Talleres Especializados para el INED de Nebaj, Quiché             |                                  |                           |            |                       |            |                           |            |              |            |                   |      |
| Bien                                                                          | Licitaciones locales             | 02/06/2023                |            | 30/06/2023            |            | 21/08/2023                |            | 11/10/2023   |            | 18/10/2023        |      |
| Diseño e Implementación Curricular                                            |                                  |                           |            |                       |            |                           |            |              |            |                   |      |
| Implementación curricular (reproducción de material)                          |                                  |                           |            |                       |            |                           |            |              |            |                   |      |
| Servicio (Implementación curricular)                                          | Adjudicación directa             | 02/01/2023                |            | 06/02/2023            |            | 13/02/2023                |            | 20/02/2023   |            | 28/02/2023        |      |
| Fortalecimiento Institucional                                                 |                                  |                           |            |                       |            |                           |            |              |            |                   |      |
| Publicaciones para Licitaciones                                               |                                  |                           |            |                       |            |                           |            |              |            |                   |      |
| Servicio (Publicaciones de Licitaciones)                                      | Adjudicación directa             | 02/01/2023                |            | 13/01/2023            |            | 16/01/2023                |            | 20/01/2023   |            | 23/01/2023        |      |


# Ejecución Financiera Anual

| Insumo                                                                                                                                                      | Enero | Febrero       | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio     | Julio        | Agosto       | Septiembre | Octubre      | Noviembre | Diciembre    | Total         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| <b>Acceso a Educación Técnica</b>                                                                                                                           |       |               |              |              |              |           |              |              |            |              |           |              |               |
| <b>Supervision Tecnica de Obras</b>                                                                                                                         |       |               |              |              |              |           |              |              |            |              |           |              |               |
| Servicio (Supervisión de obras 5 INED'S y auxiliar Ingeniería eléctrica)                                                                                    | 0.00  | 87,861.00     | 48,549.00    | 70,930.00    | 40,330.00    | 71,747.33 | 70,930.00    | 104,835.00   | 24,198.00  | 135,435.00   | 0.00      | 104,835.00   | 759,650.33    |
| <b>Construcción de Institutos Tecnológicos</b>                                                                                                              |       |               |              |              |              |           |              |              |            |              |           |              |               |
| Construcción Instituto Diversificado, Chisec Alta Verapaz                                                                                                   | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 1,868,959.38 | 0.00       | 2,803,439.06 | 0.00      | 4,672,398.44 | 9,344,796.88  |
| Construcción Instituto Diversificado, Rabinal, Baja Verapaz                                                                                                 | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 1,895,902.45 | 0.00       | 2,843,853.67 | 0.00      | 4,739,756.12 | 9,479,512.24  |
| Construcción Instituto Diversificado, Jacaltenango Huehuetenango                                                                                            | 0.00  | 9,465,887.00  | 2,200,000.12 | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 11,665,887.12 |
| Construcción Instituto Diversificado, San Pedro Pinula, Jalapa                                                                                              | 0.00  | 10,252,974.35 | 2,563,243.60 | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 12,816,217.95 |
| Construcción Instituto Diversificado, Nebaj, Quiché                                                                                                         | 0.00  | 0.00          | 4,103,566.00 | 0.00         | 4,573,980.40 | 0.00      | 4,573,980.40 | 0.00         | 0.00       | 4,573,980.20 | 0.00      | 0.00         | 17,825,507.00 |
| <b>Mobiliario y Equipo para obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y Recreativo INED's JALAPA Y HUEHUETENANGO</b> |       |               |              |              |              |           |              |              |            |              |           |              |               |
| Bienes                                                                                                                                                      | 0.00  | 0.00          | 1,329,533.34 | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 1,329,533.34  |
| <b>Mobiliario y equipo para las obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y recreativo, INED Nebaj, Quiché</b>       |       |               |              |              |              |           |              |              |            |              |           |              |               |
| Bien                                                                                                                                                        | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 664,766.67   | 0.00      | 0.00         | 664,766.67    |
| <b>Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de los INED's JALAPA y HUEHUETENANGO</b>                                               |       |               |              |              |              |           |              |              |            |              |           |              |               |
| Bien                                                                                                                                                        | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 1,130,000.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 1,130,000.00  |
| <b>Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de INED Nebaj, Quiché</b>                                                              |       |               |              |              |              |           |              |              |            |              |           |              |               |

| Insumo                                                                                           | Enero | Febrero       | Marzo         | Abril        | Mayo         | Junio     | Julio        | Agosto       | Septiembre | Octubre       | Noviembre  | Diciembre    | Total         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Bien                                                                                             | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 565,000.00 | 0.00         | 565,000.00    |
| <b>Equipo de laboratorios, de Química, Física y Biología de INED's de JALAPA Y HUEHUETENANGO</b> |       |               |               |              |              |           |              |              |            |               |            |              |               |
| Bien                                                                                             | 0.00  | 0.00          | 692,550.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 692,550.00    |
| <b>Equipo de Laboratorio de Química, Física y Biología del INED de Nebaj, Quiché</b>             |       |               |               |              |              |           |              |              |            |               |            |              |               |
| Bien                                                                                             | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 384,750.00    | 0.00       | 0.00         | 384,750.00    |
| <b>Equipo para Talleres Especializados para los INED's de JALAPA y HUEHUETENANGO</b>             |       |               |               |              |              |           |              |              |            |               |            |              |               |
| Bien                                                                                             | 0.00  | 0.00          | 1,378,000.49  | 1,342,818.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 1,403,551.08 | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 4,124,369.57  |
| <b>Equipo para Talleres Especializados para el INED de Nebaj, Quiché</b>                         |       |               |               |              |              |           |              |              |            |               |            |              |               |
| Bien                                                                                             | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 26,005.70    | 0.00       | 0.00          | 26,005.70  | 0.00         | 52,011.40     |
| <b>Total componente</b>                                                                          | 0.00  | 19,806,722.39 | 12,315,442.51 | 2,543,748.00 | 4,614,310.40 | 71,747.35 | 4,644,910.40 | 5,299,253.61 | 24,198.00  | 11,406,224.60 | 591,005.70 | 9,516,989.58 | 70,834,552.52 |
| <b>Diseño e Implementación Curricular</b>                                                        |       |               |               |              |              |           |              |              |            |               |            |              |               |
| <b>Implementación curricular (reproducción de material)</b>                                      |       |               |               |              |              |           |              |              |            |               |            |              |               |
| Servicio (Implementación curricular)                                                             | 0.00  | 0.00          | 100,000.00    | 100,000.00   | 100,000.00   | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 300,000.00    |
| <b>Total componente</b>                                                                          | 0.00  | 0.00          | 100,000.00    | 100,000.00   | 100,000.00   | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 300,000.00    |
| <b>Fortalecimiento Institucional</b>                                                             |       |               |               |              |              |           |              |              |            |               |            |              |               |
| <b>Consultoría internacional</b>                                                                 |       |               |               |              |              |           |              |              |            |               |            |              |               |
| Servicio (Funcionamiento de la Asistencia Técnica Internacional)                                 | 0.00  | 512,140.83    | 0.00          | 580,453.87   | 0.00         | 0.00      | 580,453.87   | 0.00         | 0.00       | 580,453.86    | 0.00       | 0.00         | 2,253,502.43  |

| Insumo                                                    | Enero | Febrero       | Marzo         | Abril        | Mayo         | Junio     | Julio        | Agosto       | Septiembre | Octubre       | Noviembre  | Diciembre    | Total         |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| <b>Servicios de auditoria del programa</b>                |       |               |               |              |              |           |              |              |            |               |            |              |               |
| Servicio (contratación de una firma externa de auditoria) | 0.00  | 26,000.00     | 0.00          | 104,000.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 130,000.00    |
| <b>Publicaciones para Licitaciones</b>                    |       |               |               |              |              |           |              |              |            |               |            |              |               |
| Servicio (Publicaciones de Licitaciones)                  | 0.00  | 24,000.00     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 12,000.00 | 0.00         | 24,000.00    | 12,000.00  | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 72,000.00     |
| <b>Total componente</b>                                   | 0.00  | 562,140.83    | 0.00          | 684,453.87   | 0.00         | 12,000.00 | 580,453.87   | 24,000.00    | 12,000.00  | 580,453.86    | 0.00       | 0.00         | 2,455,502.43  |
| <b>Total</b>                                              | 0.00  | 20,368,863.22 | 12,415,442.51 | 3,328,201.87 | 4,714,310.40 | 83,747.35 | 5,225,364.27 | 5,323,253.61 | 36,198.00  | 11,986,678.46 | 591,005.70 | 9,516,989.56 | 73,590,054.95 |

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

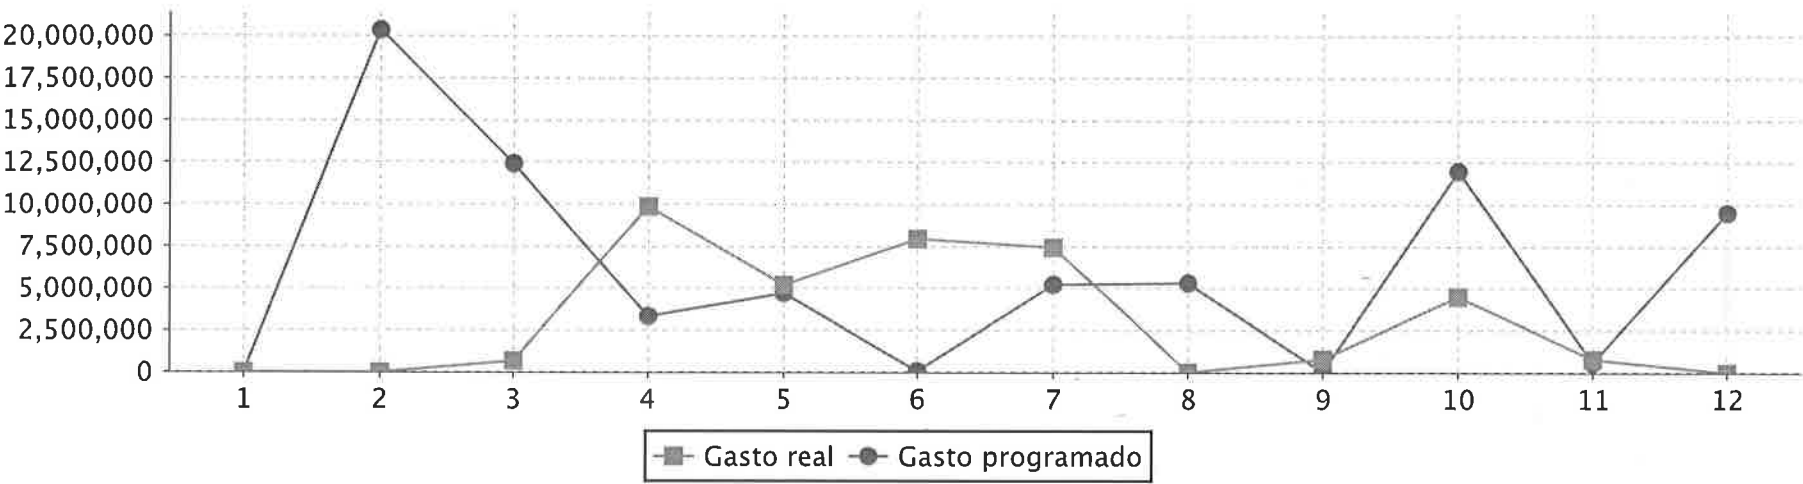

| Mes                    | Enero | Febrero       | Marzo         | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio        | Agosto       | Septiembre | Octubre       | Noviembre  | Diciembre    |
|------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|
| Gasto real             | 0.00  | 0.00          | 683,446.79    | 9,867,105.65 | 5,182,750.40 | 7,956,232.02 | 7,442,440.85 | 13,950.00    | 812,090.13 | 4,508,341.41  | 799,842.54 | 0.00         |
| Gasto programado       | 0.00  | 20,368,863.22 | 12,415,442.51 | 3,328,201.87 | 4,714,310.40 | 83,747.35    | 5,225,364.27 | 5,323,253.61 | 36,198.00  | 11,986,678.46 | 591,005.70 | 9,516,989.56 |
| Total Gasto real       |       |               | 37,266,199.79 |              |              |              |              |              |            |               |            |              |
| Total Gasto programado |       |               | 73,590,054.95 |              |              |              |              |              |            |               |            |              |

Proyección de desembolsos

| Mes       | Enero | Febrero | Marzo | Abril        | Mayo | Junio | Julio | Agosto       | Septiembre | Octubre    | Noviembre | Diciembre |
|-----------|-------|---------|-------|--------------|------|-------|-------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Programad | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 3,886,999.20 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 5,416,309.51 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| Realizado | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 2,111,720.52 | 0.00       | 75,266.57  | 0.00      | 0.00      |
| Variación | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 3,886,999.20 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 3,304,588.99 | 0.00       | -75,266.57 | 0.00      | 0.00      |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Dinámico de Gastos Mensualizado**  
 Expresado en Quetzales  
**FUENTE = 52, ORGANISMO = 505, CORRELATIVO = 13**  
**- Entidad - Renglon -**  
**DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 15/12/2023  
 HORA : 17:46.21  
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DEVENGADO                                                                                               | ENERO | FEBRERO | MARZO      | ABRIL        | MAYO         | JUNIO        | JULIO        | AGOSTO    | SEPTIEMBRE | OCTUBRE      | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE | TOTAL         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
| <b>11130008 MINISTERIO DE EDUCACIÓN</b>                                                                 |       |         |            |              |              |              |              |           |            |              |            |           |               |
| 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                                                           | 0.00  | 0.00    | 6,975.00   | 0.00         | 13,950.00    | 6,975.00     | 0.00         | 13,950.00 | 0.00       | 27,900.00    | 0.00       | 0.00      | 69,750.00     |
| 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                                             | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 338,000.00   | 0.00         | 0.00      | 206,179.34 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 544,179.34    |
| 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA                                         | 0.00  | 0.00    | 74,018.00  | 0.00         | 0.00         | 74,018.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 148,036.00    |
| 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                                           | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS                                        | 0.00  | 0.00    | 47,531.00  | 36,196.80    | 90,032.00    | 65,203.33    | 162,635.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 209,764.66 | 0.00      | 611,362.79    |
| 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                                                        | 0.00  | 0.00    | 554,922.79 | 690,552.06   | 0.00         | 0.00         | 634,721.77   | 0.00      | 605,910.79 | 0.00         | 590,077.88 | 0.00      | 3,076,185.29  |
| 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO                                                                          | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO                                                                                 | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                          | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 272 PRODUCTOS DE VIDRIO                                                                                 | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                                                                 | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 286 HERRAMIENTAS MENORES                                                                                | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                                                                   | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL                                                          | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 297 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD                                            | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 299 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 321 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                      | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 322 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN                                                                   | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 323 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                      | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 324 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO                                               | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 326 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                                                           | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 328 EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                                                          | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 329 EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                   | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 332 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                         | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN                                                 | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 9,140,356.79 | 5,078,768.40 | 7,472,035.69 | 6,645,084.08 | 0.00      | 0.00       | 4,480,441.41 | 0.00       | 0.00      | 32,816,686.37 |
| <b>TOTAL 11130008 MINISTERIO DE EDUCACIÓN</b>                                                           | 0.00  | 0.00    | 683,446.79 | 9,867,105.85 | 5,182,750.40 | 7,956,232.02 | 7,442,440.85 | 13,950.00 | 812,090.13 | 4,508,341.41 | 799,842.54 | 0.00      | 37,266,199.79 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                    | 0.00  | 0.00    | 683,446.79 | 9,867,105.85 | 5,182,750.40 | 7,956,232.02 | 7,442,440.85 | 13,950.00 | 812,090.13 | 4,508,341.41 | 799,842.54 | 0.00      | 37,266,199.79 |

### Observaciones /Desafíos

- 1) El plazo de ejecución de los contratos para la Construcción de los INEDS de Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pínula, Jalapa, fue finalizado, alcanzando el 100% de avance físico y financiero, ambos han sido recepcionados y liquidados.
- 2) En septiembre de 2022 se firmó contrato para la Construcción del INED ubicado en Nebaj, Quiché. Con fecha 04 de octubre de 2023 dicho contrato fue rescindido mediante Acuerdo Ministerial No. 3052-2023.
- 3) En el caso del evento de Licitación respecto a la Construcción de los Institutos Diversificados ubicados en los municipios de Chisec, Alta Verapaz y Rabinal, Baja Verapaz, se cuenta con la No Objeción al Informe emitido por el Comité de Evaluación de Ofertas, mediante el cual no Adjudico dicho evento, declarado desierto.

### Alertivos

Elaborado por: (nombre y firma):

  
**Dra. Aura Marina Solís Quiñone**  
**ANALISTA FINANCIERO**  
Dirección Planificación Educativa -DIPLAN/  
Ministerio de Educación

M. Sc. Ingrid Sucely De León Piedrasanta de Olaz

  
**M. Sc. Ingrid Sucely de León Piedrasanta**  
**DIRECTORA**  
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-  
Ministerio de Educación



Aprobado por: (Nombre y firma): M. Sc. Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada



Fecha de actualización: 13/12/2023 – 4:14 PM

