

Plan Anual de Ejecución

¹Mes reportado

ENERO

²Ejercicio Fiscal

2020


³Proyecto/Programa:

PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA

⁴Organismo Ejecutor:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

⁵ Número de Préstamo	BID 2018 / OC-GU		¹³ Fecha de última actualización	14/01/2019	
⁶ Código Presupuestario	5204020108		¹⁴ Fecha del decreto	19/02/2009	
⁷ Organismo Financiero	BID		¹⁵ Fecha de suscripción	25/02/2009	
⁸ Entidad ejecutora	MINEDUC		¹⁶ Fecha de Vigencia	25/02/2009	
⁹ Unidad Ejecutora	DIPLAN		¹⁷ Fecha de Elegibilidad	23/06/2009	
¹⁰ Moneda del Préstamo	UD		¹⁸ Fecha de cierre	27/04/2018	
¹¹ Monto aprobado	150,000,000.00		¹⁹ Meses de Prórroga	50	
¹² Monto aprobado Q.	1,155,667,500.00		²⁰ Plazo de ejecución	N/A	
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	82,000,000.00	100%	²¹ Monto por desembolsar USD\$	N/A	%

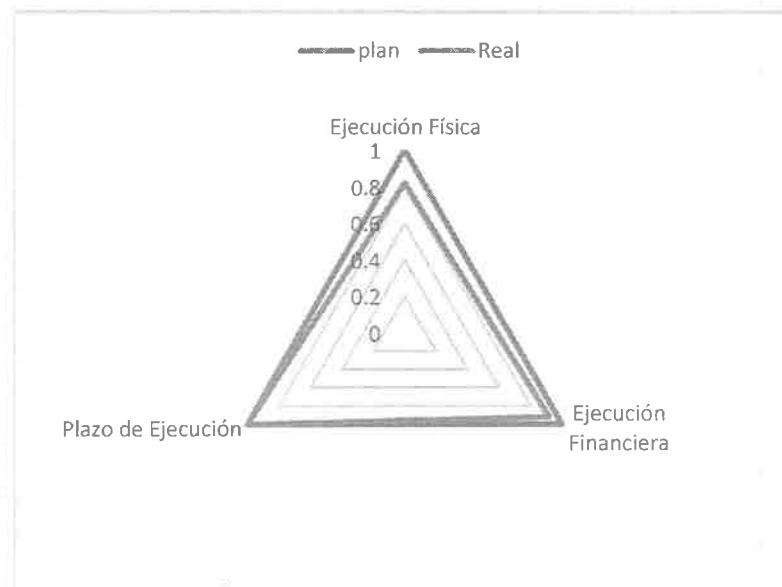

²³Suscripción Con. Previas

Ejecución

Cierre

Planificación de Cierre

Programa MI ESCUELA PROGRESA, Préstamo BID 2018/OC-GU

Descripción	Fecha	Estatus	Observaciones
Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".		Finalizado	Envío de constancia a MINFIN el 15/03/2019
Cierre y/o Inhabilitación de las cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo; en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU01010000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común.		Finalizado	Envío de constancia a MINFIN el 15/03/2019
Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa		Finalizado	
Copia de Auditoria Final del Programa		Finalizado	Envío de constancia a MINFIN el 15/03/2019
Copia del Informe Final del Programa		Finalizado	Envío de constancia a MINFIN el 15/03/2019
Copia del Pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.		Finalizado	Envío de constancia a MINFIN el 15/03/2019
Traslado de documentación al MINFIN			

^{A7} Observaciones/Desafíos

- El Banco Interamericano de Desarrollo –BID- está verificando que todos los requisitos de cierre del Programa Mi Escuela Progres, estén cumplidos por el ejecutor MINEDUC y los co-ejecutores UCEE y FODES para poder solicitar oficialmente la constancia de cierre del Programa.

^{A8} Riesgos:


Elaborado por: (nombre y firma)



Aura Marina Solís Quiñonez

Licda. Aura Marina Solís Quiñonez
ANALISTA FINANCIERO
Dirección Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación

Aprobado por: (nombre y firma)



Claudia Ruiz Casasola de Estrada



Fecha de actualización: 06/03/2020

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Enero / 2020**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y LA CALIDAD EDUCATIVA**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	BID-3618-OC-GU	Fecha de última actualización	06/03/2020
Código Presupuestario	5204020126	Fecha del Decreto	03/05/2018
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	10/05/2018
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	10/05/2018
Monto contratado	150,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	11/06/2018
Monto contratado Entidad ejecutora	150,000,000.00	Fecha de cierre actual	05/10/2023
Monto Entidad Ejecutora Dolares	150,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	1,149,600,000.00	Plazo de ejecución	20.00%
Desembolsos realizados a la fecha	32,949,844.66 21.97%	Monto por desembolsar USD\$	117,050,155.34 78.03%

Gráfica de Ejecución

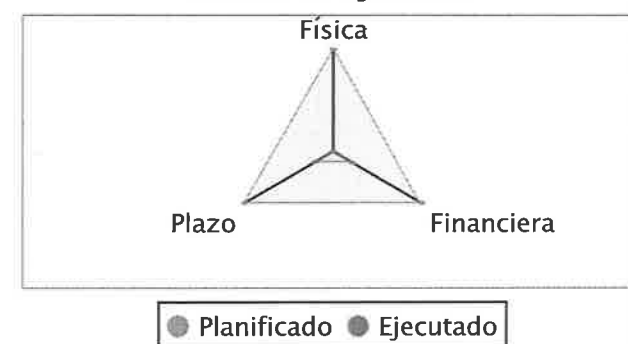

Tipo de cambio: 7.664 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Enero		Indicadores de Avance Anuales 2020		Total	
Asignación Presupuestaria anual	2,731,043.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	2,731,043.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	152,000.00	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	0.00% / 0.00%		
Porcentaje de Ejecución	5.57%	Próximo desembolso del mes	Mayo	Plazo de ejecucion Actual	34.00%		
		Presupuesto planificado próximo	27,000,000.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0.0520		

Metas año fiscal


Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Habilitación y remozamiento de centros escolares									
Transferencias a organizaciones de padres de familia (OPF)	Unidad	0		1297		563		1860	
Módulos Educativos	Unidad	337		0		563		900	
Mobiliario y Equipo para Módulos Educativos	Unidad	337		0		563		900	
Componente: Mejora de la enseñanza y los aprendizajes									
Equipo Tecnológico	Unidad	0		0		1360		1360	
Libros de Lectura	Unidad	0		0		8350		8350	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Habilitación y remozamiento de centros escolares											
Módulos Educativos											
Módulos prefabricados FASE II	Licitación Pública Internacional	13/04/2020		22/05/2020		21/07/2020		04/08/2020		10/08/2020	
Mobiliario Escolar											
Mobiliario escolar	Licitación Pública Internacional	10/09/2019	10/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	25/10/2019	25/10/2019	05/11/2019		07/02/2020	
Mobiliario escolar FASE II	Licitación Pública Internacional	18/06/2020		18/08/2020		28/09/2020		19/10/2020		23/10/2020	
Mejora de la enseñanza y los aprendizajes											
Equipo Tecnológico											
Equipo tecnológico	Licitación Pública Internacional	30/03/2020		25/05/2020		27/07/2020		03/08/2020		07/08/2020	
Libros de Lectura											
Libros de lectura	Licitación Pública Internacional	26/03/2020		03/04/2020		02/06/2020		12/06/2020		17/06/2020	

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Habilitación y remozamiento de centros escolares													
Módulos Educativos													
Módulos prefabricados	0.00	0.00	23,818,780.30	27,137,790.87	14,837,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,794,500.00
Módulos prefabricados FASE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario Escolar													
Mobiliario escolar	0.00	0.00	0.00	3,116,726.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116,726.98
Mobiliario escolar FASE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total componente	0.00	0.00	23,818,780.30	30,254,517.85	14,837,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,911,226.98
Mejora de la enseñanza y los aprendizajes													
Equipo Tecnológico													
Equipo tecnológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,469,347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,469,347.24
Libros de Lectura													
Libros de lectura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,887,928.00	0.00	12,887,928.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,469,347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12,887,928.00	0.00	134,357,275.24
Total	0.00	0.00	23,818,780.30	30,254,517.85	14,837,928.83	121,469,347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12,887,928.00	0.00	203,268,502.22

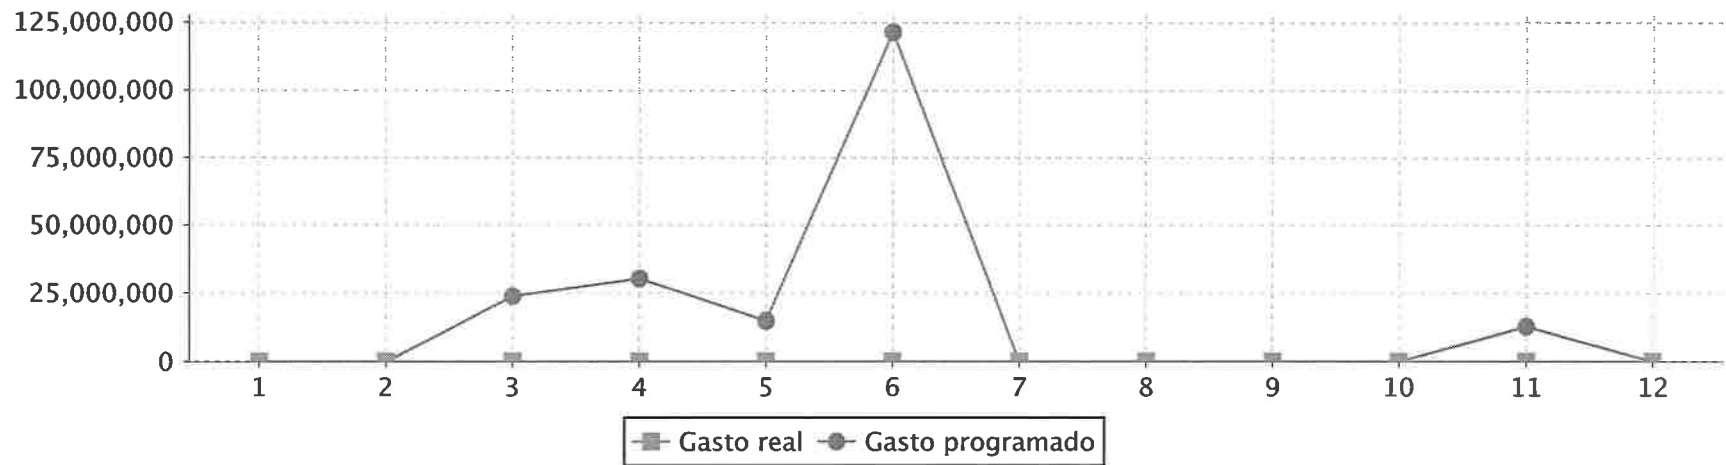

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	0.00	23,818,780.30	30,254,517.85	14,837,928.83	121,469,347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12,887,928.00	0.00
Total Gasto real			0.00									
Total Gasto programado			203,268,502.22									

Proyección de desembolsos

[illegible]

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Aura Marina Solís Quiñonez

..cda. Aura Marina Solís Quiñonez
ANALISTA FINANCIERO
Dirección Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación

Aprobado por: (nombre y firma) Claudia Ruiz Casasola de Estrada



Fecha de actualización

6/3/2020 - 9:38 AM

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Febrero / 2020**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE EDUCACION RURAL V -PROEDUC V**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V	Fecha de última actualización	11/03/2020
Código Presupuestario	5205050013	Fecha del Decreto	27/10/2015
Organismo Financiero	KFW	Fecha de Suscripción	18/10/2016
Moneda del Préstamo	EUR	Fecha de Vigencia	18/10/2016
Monto contratado	21,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/10/2016
Monto contratado Entidad ejecutora	21,000,000.00	Fecha de cierre actual	31/12/2021
Monto Entidad Ejecutora Dolares	23,058,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	177,057,770.40	Plazo de ejecución	59.00%
Desembolsos realizados a la fecha	4,207,035.82 18.25%	Monto por desembolsar USD\$	18,850,964.18 81.75%

Gráfica de Ejecución

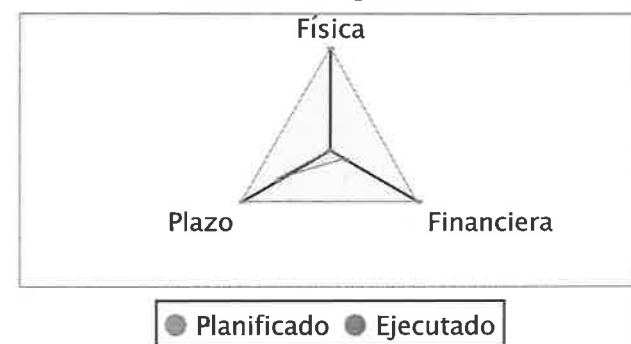

Tipo de cambio: 7.6788 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Febrero		Indicadores de Avance Anuales 2020		Total	
Asignación Presupuestaria anual	99,537,000.00	Desembolso planificado en el mes	1,083,539.00	Desembolsos Acumulados del Año	27132.19	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	99,537,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.14% / 5.61%		
Presupuesto Devengado	209,108.87	Diferencia	1,083,539.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	0.00% / 10.44%		
Porcentaje de Ejecución	0.21%	Próximo desembolso del mes	Marzo	Plazo de ejecucion Actual	65.00%		
		Presupuesto planificado próximo	1,674,606.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	5.1561		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Acceso a Educación Técnica									
Infraestructura Física	Porcentaje	0		0		5		5	
Rehabilitación de infraestructura	Unidad	0		0		6		6	
Útiles educacionales y culturales	Unidad	0		0		5		5	
Útiles educacionales y culturales	Unidad	0		0		5		5	
Mobiliario para los espacios administrativos	Unidad	0		0		5		5	
Equipo de computo para laboratorios de información y comunicación	Unidad	0		0		17		17	
Equipos para Talleres Especializados	Unidad	0		0		10		10	
Equipo para laboratorios de Química, Física y Biología	Unidad	0		0		5		5	
Componente: Fortalecimiento Institucional									
Servicios de auditoria del programa	Unidad	0		1		0		1	

Plan Adquisiciones Año Fiscal


Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Acceso a Educación Técnica											
Infraestructura Física											
Construcción de institutos de diversificado	Licitación Pública Internacional	30/01/2019		06/03/2019		16/05/2019		25/07/2019		21/02/2020	
Equipo educacional, cultural y educativo											
Equipo educacional, cultural y recreativo	Licitación Pública Internacional	27/04/2020		27/05/2020		07/08/2020		26/08/2020		01/09/2020	
Rehabilitación de infraestructura											
Rehabilitación de infraestructura	Licitación Pública Internacional	02/03/2020		01/04/2020		13/04/2020		23/04/2020		28/04/2020	
Útiles educacionales y culturales											
Útiles educacionales y culturales	Licitación Pública Internacional	27/04/2020		27/05/2020		07/08/2020		26/08/2020		01/09/2020	
Mobiliario para los espacios administrativos											
Mobiliario y equipo	Licitación Pública Internacional	27/04/2020		27/05/2020		07/08/2020		26/08/2020		01/09/2020	
Equipo de computo para laboratorios de información y comunicación											
Equipo de computo	Licitación Pública Internacional	27/04/2020		27/05/2020		07/08/2020		26/08/2020		01/09/2020	
Equipos para Talleres Especializados											
Equipo para talleres especializados	Licitación Pública Internacional	27/04/2020		27/05/2020		07/08/2020		26/08/2020		01/09/2020	
Equipo para laboratorios de Química, Física y Biología											

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Equipo para laboratorios de química, física y biología	Licitación Pública Internacional	27/04/2020		27/05/2020		07/08/2020		26/08/2020		01/09/2020	
Fortalecimiento Institucional											
Servicios de auditoria del programa											
Servicios de auditoria del programa	Solicitud de precios	02/01/2020		03/01/2020		14/02/2020		23/03/2020		27/03/2020	

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Acceso a Educación Técnica													
Infraestructura Física													
Construcción de institutos de diversificado	0.00	16,327,905.00	9,319,918.00	0.00	14,729,428.00	13,047,885.00	0.00	20,621,200.00	14,911,869.00	0.00	23,567,086.00	1,962,088.00	114,487,379.00
Equipo educacional, cultural y educativo													
Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873,833.00	0.00	1,873,833.00
Rehabilitación de infraestructura													
Rehabilitación de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200,000.00	0.00	23,200,000.00
Útiles educativos y culturales													
Útiles educativos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
Mobiliario para los espacios administrativos													
Mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,000.00	0.00	1,305,000.00
Equipo de computo para laboratorios de información y comunicación													
Equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900,000.00	0.00	11,900,000.00
Equipos para Talleres Especializados													
Equipo para talleres especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865,000.00	1,865,000.00
Equipo para laboratorios de Química, Física y Biología													

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Equipo para laboratorios de química, física y biología	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
Total componente	0.00	16,327,905.00	9,319,918.00	0.00	14,729,428.00	13,047,885.00	0.00	20,621,200.00	14,911,869.00	0.00	61,990,919.00	5,327,088.00	156,276,212.00
Fortalecimiento Institucional													
Servicios de auditoria del programa													
Servicios de auditoria del programa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
Total	0.00	16,327,905.00	9,319,918.00	0.00	14,729,428.00	13,112,885.00	0.00	20,621,200.00	14,911,869.00	0.00	61,990,919.00	5,327,088.00	156,341,212.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

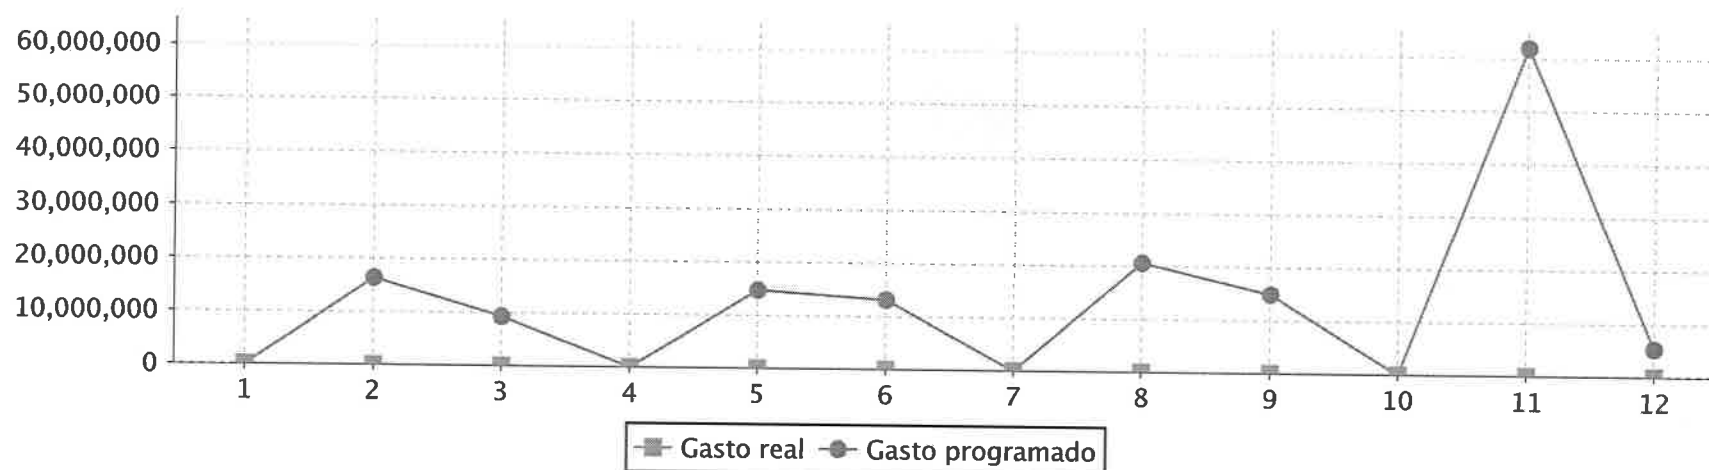[illegible]

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	0.00	1,083,539.00	1,674,606.00	954,689.00	2,874,398.00	1,336,565.00	2,023,685.00	1,922,100.00	2,896,308.00	1,543,800.00	2,196,791.00	798,277.00
Realizado	27,132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	-27,132.19	1,083,539.00	1,674,606.00	954,689.00	2,874,398.00	1,336,565.00	2,023,685.00	1,922,100.00	2,896,308.00	1,543,800.00	2,196,791.00	798,277.00

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Aura Marina Solís Quiñonez

Cda. Aura Marina Solís Quiñonez
ANALISTA FINANCIERO
Dirección Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación

Aprobado por: (nombre y firma) Claudia Ruiz Casasola de Estrada



Fecha de actualización

11/3/2020 - 9:32 AM
