

Guatemala, 2 de septiembre de 2022
Oficio DIPLAN-FE-5245-2022

Licenciada

Oneida Beatriz Aguilar Alfaro

Directora

Dirección de Cooperación Nacional e Internacional –DICONIME-
Ministerio de Educación

Licenciada Aguilar:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitir el Oficio DIPLAN-FE-5244-2022 emitido por la M. Sc. Ingrid Sucely de León Piedrasanta, Directora de Planificación Educativa -DIPLAN-, para su conocimiento y efectos correspondientes.

Los informes descritos son elaborados, revisados y son responsabilidad de la Dirección de Planificación Educativa –DIPLAN-, del Ministerio de Educación, de conformidad con el Artículo 29 de la Ley Orgánica del Presupuesto y Acuerdo Ministerial No. 17-2014.

Sin otro particular, la saludo atentamente.



M. Sc. Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada
Ministra de Educación



Adjunto: lo indicado
ISdLP/FAPG/dl
Cc. Financiamiento Externo


PBX: (502) 2411-9595

www.mineduc.gob.gt Síguenos en:  MineducGuat   MineducGT

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GUATEMALA, C.A.

RECEBIDO
14 SEP 2022

HORA: 13:34 FIRMA: 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL
Fecha: 13-9-22
Firma: 

Guatemala, 02 de septiembre de 2022
Oficio DIPLAN-FE-5244-2022

M.Sc. Claudia Patricia Ruíz Casasola de Estrada
Ministra de Educación
Ministerio de Educación
Su despacho

Respetable Señora Ministra:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 53 Bis del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; adjunto para su aprobación y firma los informes del avance físico y financiero y del desempeño de préstamos multianuales, correspondientes al mes de agosto de 2022.

Las operaciones incluidas son:

1. Programa Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa, Contrato de Préstamo BID-3618/OC-GU.
2. Proyecto de Educación Rural V, PROEDUC V, contrato de préstamo KfW-2008 65 725.
3. Programa Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva de la República de Guatemala, BCIE No. 2138.

Los informes descritos son elaborados, revisados y son responsabilidad de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN- y deben trasladarse a la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional -DICONIME-, quien los enviará oficialmente a las dependencias que conforme la Ley corresponde.

Sin otro particular, me suscribo atentamente.


M.Sc. Ingrid Sucely de León Piedrasanta
DIRECTORA
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación



Adjunto: lo indicado
ISdLP/FAPG/di
cc: Financiamiento Externo

PBX: (502) 2411-9595

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL
Fecha: 13-9-22
Firma: [Signature]

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2022
Mes a Reportar: AGOSTO
Entidad: 11130008
Unidad Ejecutora: MINEDUC
Préstamo: BCIE
Código Presupuestario: 52-0401-0067

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
N/A	Apoyo a proyectos de inversión en infraestructura Social y productiva de la República de Guatemala	N/A	N/A	N/A	N/A	0%					0%	REPORTE DE SICOM
TOTAL											0%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Meta Total	III.4 Meta Anual	Avance del mes				III.8 Notas Aclaratorias
				III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Medios de verificación	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
Ejecución Física	Ejecución Financiera	Variación % Física	0%	No se reporta ejecución debido a que no se registro ningún desembolso. A la vez, no se asignó presupuesto para el año 2022.	IV.3 Alertivos		
0%	0%	0%	0%				
IV.2 GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera	0%				
Ejecución Física	Ejecución Financiera						
0%	0%						

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO


Ejecución Física Total	Ejecución Financiera Total
0%	0%


 M.Sc. Ingrid Sweeny de León Piedrasanta
DIRECTORA
 Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
 Ministerio de Educación


 M.Sc. Claudia Ruiz Castañola de Estrada
Ministra de Educación

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13-9-22

Firma: 

FE0

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2022
 Mes a Reportar: AGOSTO
 Entidad: 13130008
 Unidad Ejecutora: MINEDUC
 Préstamo: BCIE
 Código Presupuesto: 52-0401-0067
 Fecha de suscripción: 6/02/2015
 Fecha de último desembolso:

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.


Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal 2015																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución	
N/A		N/A	N/A	N/A													
			0.00					0.00			0.00						
Ejercicio Fiscal 2016																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución	
N/A		N/A	N/A	N/A													
			0.00					0.00			0.00						
Ejercicio Fiscal 2017																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución	
N/A		N/A	N/A	N/A													
			0.00					0.00			0.00						
Ejercicio Fiscal 2018																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución	
N/A		N/A	N/A	N/A													
			0.00					0.00			0.00						
Ejercicio Fiscal 2019																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución	
N/A		N/A	N/A	N/A													
			0.00					0.00			0.00						
Ejercicio Fiscal 2020																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución	

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13-9-22

Firma: 

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2022
Mes a Reportar: AGOSTO
Entidad: 11130008
Unidad Ejecutora: MINEDUC
Préstamo: PROEDUC V
Código Presupuesto: 52-0505-0013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gob. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación REPORTES DE SICOIN
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 1 Acceso a la Educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Mts. Cuadrados	8069	4773	553.63	11.60%	53,331,903.00	31,666,213.00	1,092,843.70	3.45%	
	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Entidad	14	12	0	0	10,500,051.00	4,681,500.00		0.00%	
	Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados	Entidad	5	5	0	0	6,693,691.00	13,037,652.00	8,328,846.54	63.88%	
Componente											
Fortalecimiento Institucional	Imprevistos	Varios	0	0	0	0	288,759.00	191,428.00	105,803.76	55.27%	
	Consultoría Internacional	Varios	0	0	0	0	3,085,596.00	3,085,596.00	575,646.28	18.66%	
			8088	4790	553.63	11.56%	73,900,000.00	52,662,389.00	10,103,180.28	19.18%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Meta Total	Avance del mes				
			III.4 Meta Anual	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
Acceso a la Educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	4773	4773	4773	553.63	REPORTE DE SICOIN	
	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	12	12	12	0	REPORTE DE SICOIN	
	Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados	5	5	5	0	REPORTE DE SICOIN	
		4790	4790	4790	553.63		

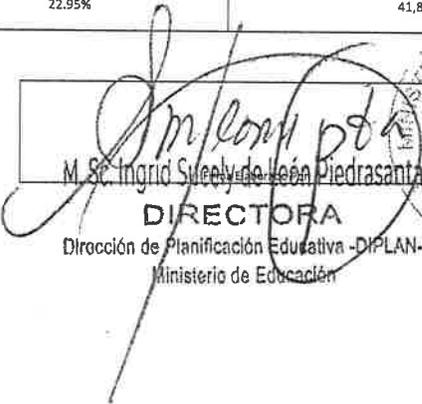
IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.3 Alertas	
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación % Física	5.29%	En el mes de agosto 2022 se realizó el pago de la estimación No.1 del Contrato de Construcción de INED ubicado en Jacaltenango, departamento de Huehuetenango; Pago de las estimaciones 2 y 3 de los trabajos de rehabilitación de centro educativo del Municipio y departamento de Jalapa.	
6.27%	12.90%				
IV.2 GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera	6.28%		
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA				
11.56%	19.18%				

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL
22.95%	41,831,634.97


M. Sc. Ingrid Suredy León Piedrasanta
DIRECTORA
 Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
 Ministerio de Educación




M. Sc. Claudia Ruiz Casasola de Estrada
Ministra de Educación



fw

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13-9-22
 Firma: [Signature]

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2022
 Mes a Reportar: AGOSTO
 Entidad: 11330008
 Unidad Ejecutora: MINEDUC
 Préstamo: PROEDUC V
 Código Presupuesto: 52-0505-0013
 Fecha de suscripción: 10/05/2018
 Fecha de último desembolso: 28/04/2022

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal 2018																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Metas Previstas del Préstamo		II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.6. Avance Físico al Año			II.7. Avance Financiero al Año			II.8. Avance Físico Acumulado		II.9. Avance Financiero Acumulado		II.10. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **			
Componente 1: Acceso a Educación Técnica																			
Infraestructura física	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Establecimientos	4	8,700,000.00						8,700,000.00	0	0.00%	0	0%					
Equipo	Equipamiento de centros educativos a nivel diversificado	Establecimientos	4	1,942,328.00						1,942,328.00	0	0.00%	0	0%					
Fortalecimiento institucional	Consultoría internacional	N/A	N/A	9,295,932.00						9,295,932.00	5,478,204.00	58.93%	N/A	N/A		5,478,204.00	58.93%		
			19,938,260.00																
									19,938,260.00			5,478,204.00							
												27.48%							
															27.43%				

Ejercicio Fiscal 2019																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Metas Previstas del Préstamo		II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.6. Avance Físico al Año			II.7. Avance Financiero al Año			II.8. Avance Físico Acumulado		II.9. Avance Financiero Acumulado		II.10. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **			
Componente 1 Acceso a Educación Técnica																			
Infraestructura física	Centros escolares del nivel medio ciclo Diversificado, reparados, remarcados	Entidad	4	10,160,400.00	1/01/2019	30/04/2019	4	4	100.00%	11,589,400.00	10,019,989.68	86.46%	4	100.00%		10,019,989.68	86.46%		
	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Mts. Cuadrados	16,824	95,715,930.00	30/04/2019	31/12/2019	16824	0	0.00%	95,715,930.00	43,480.00	0.05%	0	0.00%		43,480.00	0.05%		
	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Entidad					N/A	N/A		14,756,210.00	2,636,510.00	17.87%	N/A	0		2,636,510.00	17.87%		
Fortalecimiento institucional	Consultoría internacional	Varios		105,876,330.00			N/A	N/A		10,059,539.00	4,373,636.11	43.48%	N/A	0		4,373,636.11	43.48%		
			105,876,330.00																
									132,121,079.00			17,073,615.79							
												12.92%							
												0.02%							
															17,073,615.79				
															12.92%				

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13-9-22

Firma:

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2022
Mes a Reportar: AGOSTO
Entidad: 11130008
Unidad Ejecutora: MINEDUC
Préstamo: PROEDUC V
Código Presupuesto: 52-0505-0013
Fecha de suscripción: 18/04/2018
Fecha de último desembolso: 24/04/2022

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.


II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal		2020																
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Metas Previstas del Préstamo		II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o		II.6. Avance Físico al Año			II.7. Avance Financiero al Año			II.8. Avance Físico Acumulado		II.9. Avance Financiero Acumulado		II.10. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Componente 1 Acceso educación técnica																		
Infraestructura física	Centros escolares del nivel medio ciclo Diversificado, reparados, remozados	Entidad	6	2,302,575.00	1/01/2020	30/04/2020	5	0	0.00%									
	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura	Mts. Cuadrados	16,824	68,191,848.00	30/04/2020	31/12/2020	10526	203	1.93%	1,416,000.00	451,000.00	31.85%	0	0.00%	451,000.00	31.85%		
	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Entidad	5	20,207,600.00	30/04/2020	31/12/2020	5	0	0.00%	53,769,183.00	779,440.00	1.45%	203	1.93%	779,440.00	1.45%		
Componente 2 Diseño e implementación Curricular																		
Fortalecimiento Institucional	Diseño y desarrollo de materiales curriculares	Evento	1	1,100,000.00	30/04/2020	31/12/2020	1	0	0.00%	12,782,600.00	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%		
	Consultoría Internacional	Varios	N/A	7,734,977.00	1/01/2020	31/12/2020	N/A		0.00%	1,291,099.00	171,290.00	13.27%	0	0.00%	171,290.00	13.27%		
				0.00	1/01/2020	31/12/2020	M/A	0	0.00%	2,133,000.00	1,422,407.68	66.69%	0	0.00%	1,422,407.68	66.69%		
			99,537,000.00				10537	203	1.93%	72,491,882.00	3,694,137.68	5.10%	203	1.93%	3,694,137.68	5.10%		

Ejercicio Fiscal		2021																
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Metas Previstas del Préstamo		II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.6. Avance Físico al Año			II.7. Avance Financiero al Año			II.8. Avance Físico Acumulado		II.9. Avance Financiero Acumulado		II.10. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Componente 1 Acceso educación técnica Infraestructura física																		
Infraestructura física	Centros escolares del nivel medio ciclo Diversificado, reparados, remozados	Entidad	6	2,302,575.00	1/01/2021	30/04/2021	6	0	0.00%	24,369,880.00	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%		
	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura	Mts. Cuadrados	16,824	68,191,848.00	1/04/2021	15/08/2021	6546	30.88	0.47%	45,506,015.00	2,103,660.84	4.62%	31	0.47%	2,103,660.84	4.62%		
	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Entidad	5	20,207,600.00	1/01/2021	31/12/2021	7	0	0.00%	7,944,372.00	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%		
Componente 2 Diseño e implementación Curricular																		
Fortalecimiento Institucional	Diseño y desarrollo de materiales curriculares	Evento	1	1,100,000.00	1/01/2021	31/12/2021	1	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%		
	Imprevistos	Varios	N/A				1	0	0.00%	219,000.00	70,582.38	32.23%	0	0.00%	70,582.38	32.23%		
				7,734,977.00	1/01/2021	31/12/2021	1	0	0.00%	3,905,438.00	3,308,254.00	84.71%	0	N/A	3,308,254.00	84.71%		
			99,537,000.00				6562	30.88	0.47%	81,944,705.00	5,482,497.22	6.69%	31	0.47%	5,482,497.22	6.69%		

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13-9-22

Firma: 

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

DATOS GENERALES

Ejercicio: 2022
Mes a Reportar: AGOSTO
Entidad Ejecutora: MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Préstamo: PROYECTO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA
Código Presupuestario: 52-0005-0003
Fecha de suscripción: 30/09/2018
Fecha de último desembolso: 20/04/2022

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Meta		II.5. Fecha de Finalización		II.6. Ejecutado Anual		II.7. Ejecutado Anual		II.8. Ejecutado Acumulado		II.9. Ejecutado Acumulado Global		II.10. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente 1 Acceso a educación técnica Infraestructura física	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Mts. Cuadrados	4,773	31,666,213.00	1/01/2022	31/12/2022	4,773	553.63	11.60%	1,092,883.70	3.45%	553.63	1,092,883.70	3.45%	
	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Entidad	12	4,681,500.00	1/01/2022	31/12/2022	12	0	0.00%	0.00	0.00%	0		0.00%	
	Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados	Entidad	5	13,037,652.00	1/01/2022	31/12/2022	5	0	0.00%	13,037,652.00	63.88%	0	8,328,846.54	63.88%	
Fortalecimiento Institucional	Imprevistos	Evento	0	191,428.00	1/01/2022	31/12/2022	0	0	0.00%	191,428.00	0.00%	0	105,803.76	55.27%	
	Consultoría Internacional	Varios	N/A	3,085,596.00	1/01/2022	31/12/2022	0	0	0.00%	3,085,596.00	18.66%	0	575,646.28	18.66%	
TOTAL				52,662,389.00			4790	553.63	11.56%	52,662,389.00	19.18%	553.63	10,103,180.28	19.18%	

III.1. Año	III.2. Resumen			III.5. Avance Financiero Acumulado
	III.2. Avance Físico del Año	III.3. Avance Financiero del Año	III.4. Avance Físico Acumulado	
2018	0%	27.48%	N/A	5,478,204.00
2019	0.02%	12.97%	0.02%	17,073,615.79
2020	1.93%	5.10%	1.93%	3,694,137.68
2021	0.47%	6.69%	0.47%	5,482,497.22
2022	11.60%	19.18%	11.56%	10,103,180.28
Total				41,831,634.97



M.Sc. Ingrid Sucey de León Piedrasanta
 DIRECTORA
 Dirección de Planificación Educativa -DIPLA-
 Ministerio de Educación

M.Sc. Claudia Ruiz Casosola de Estrada
 Ministra de Educación

PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL
 Fecha: 13-9-22
 Firma:

Sección 3. - Informe de Avance Físico, Financiero - Principales Inversiones

I DATOS GENERALES

Ejercicio:	2022
Mes a Reportar:	AGOSTO
Entidad:	1111-0008
Unidad Ejecutora:	MINEDUC
Préstamo:	PROEDUC V
Código Presupuestal:	52-005-0013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 510-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorporará un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II PRINCIPALES INVERSIONES

II.1. No. Componente	II.2. Nombre del Componente	II.3. Inversión (Producto)	II.4. NOG	II.5. SNIP	Fecha de Inicio de Ejecución	Fecha Final de Ejecución	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera	II.6. Observaciones
Acceso a la educación técnica	Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados	REHABILITACIÓN DEL INEB UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	14110903	N/A	13/12/2021	13/03/2022	100.00%	90.00%	
		REHABILITACIÓN DE LA EOM REGIONAL, UBICADA EN EL CASERÍO LA CRUZ REGIONAL, MUNICIPIO DE CUILCO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	14110903	N/A	8/02/2021	6/04/2022	100.00%	90.00%	
		REHABILITACIÓN DEL LINEBE CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DR. SILVANO ANTONIO CARIAS REYNOS, MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	14110903	N/A	9/12/2021	7/04/2022	100.00%	90.00%	
		REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SAUCABAJÁ, QUICHÉ	14110903	N/A	19/01/2022	19/04/2022	25.00%	25.00%	
Acceso a la educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de Infraestructura educativa del ciclo diversificado	CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, UBICADO EN EL CANTON SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO.	14126478		18/02/2022	14/01/2023	21.46%	0.00%	
Acceso a la educación técnica	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, UBICADO EN LA ALDEA EL PINALITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	14126478	225120, 225122	5/04/2022	31/12/2022	10.06%	0.00%	
Acceso a la educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA PARA 5 CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN ALTA VERAPAZ, CHIJOMULA, HUEHUETENANGO Y QUICHÉ	15615642	N/A					Desierto
		CONSTRUCCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO NEBAL, QUICHÉ	16982825	225121					A partir de la recepción de ofertas (11 de Julio 2022) se encuentra en evaluación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 M.Sc. Claudia Ruiz Casasola de Estrada
 Ministra de Educación

M. Sc. Ingrid Sucely de León Piedrasanta
 DIRECTORA
 Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
 Ministerio de Educación

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13-9-22

Firma: [Signature]

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

Ejercicio: 2022
Mes a Reportar: AGOSTO
Entidad: 11130008
Unidad Ejecutora: MINEDUC
Préstamo: BID 3618/OC-GU
Código Presupuestal: 52-0402-0126

I DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Las titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdu. Gu. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con el establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO											
II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 1 Habilitación y remodelamiento de centros escolares	Remozamiento de Centros Escolares vía OPF	Transferencias	2112	1478	0	0	159,602,376.00	123,890,099.00	1,135,722.56	0.92%	REPORTES DE SICOIN POA
	Módulos educativos	Módulos	611	377	114	30.24	120,251,377.00	97,282,428.00	39,191,498.25	30.01%	
	Censo de Infraestructura	Unidad	1	1	0	0	19,667,198.00	15,086,227.00	-	0.00%	
	Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario	Unidad	319	319	0	0	19,401,816.00	12,357,941.00	-	0.00%	
	Equipamiento de módulos	Equipo	446	377	0	0	3,749,390.00	9,614,666.00	-	0.00%	
Componente 2 Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Equipo Tecnológico	Equipo	982	1896	1035	54.59	88,543,284.00	129,045,181.00	74,625,125.00	57.83%	
	Servicios de desarrollo curricular	N/A	1	1	0	0	1,705,887.00	1,705,887.00	110,000.00	18.47%	
	Capacitación a docentes FID / PADEP	Docente	2682	2682	0	0	27,597,900.00	27,597,900.00	9,858,410.00	34.92%	
Componente 3 Administración, supervisión y evaluación	Administración del programa	N/A	0	0	0	0	3,700,982.00	6,194,253.00	3,388,433.96	54.67%	
	Evaluación	Varios	1	1	0	0	5,679,130.00	5,679,130.00	-	0.00%	
			7497	7337	1149	16.11	449,900,000.00	428,253,788.00	118,292,199.77	27.63%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Meta Total	III.4 Meta Anual	Avance del mes			
				III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Adclaratorias
Habilitación y remodelamiento de centros escolares	Remozamiento de Centros Escolares vía OPF	1478	1478	1478	0	REPORTE DE SICOIN	
	Módulos educativos	377	377	377	114	REPORTE DE SICOIN	
	Censo de Infraestructura	1	1	1	0	REPORTE DE SICOIN	
	Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario	319	319	319	0	POA	
	Equipamiento de módulos	377	377	377	0	REPORTE DE SICOIN	
Mejora de la calidad de la enseñanza	Equipo Tecnológico	1896	1896	1896	1035	REPORTE DE SICOIN	
	Servicios de desarrollo curricular	1	1	1	0	REPORTE DE SICOIN	
	Capacitación a Docentes FID / PADEP	2682	2682	2682	0	REPORTE DE SICOIN	
Administración, supervisión y evaluación	Administración del programa	0	0	0	0	REPORTE DE SICOIN	
	Evaluación	1	1	1	0	REPORTE DE SICOIN	
		7132	7132	7132	1149		


IV. BALANCE DE LA GESTIÓN


IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación % Física	15.98%	Variación % Financiera	1.26%
15.98%	26.36%				
IV.2 GESTIÓN AL MES				IV.3 Alertivos	
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA				
16.11	27.62%				

En el mes de agosto 2022, se realizó el pago de 9 módulos educativos de la fase II. Se efectuaron pagos de consultores evaluadores para OPF y Módulos educativos. Se realizaron los pagos del primer semestre de FID 40% de la 6ta y 7ma Cohorte, 60% de la 6ta y 7ma Cohorte.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO	
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL
36.46%	421,124,024.02


M. Sc. Ingrid Sucely de León Piedrasanta
 DIRECTORA
 Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
 Ministerio de Educación


M. Sc. Claudia Ruiz Casola de Estrada
 Ministra de Educación



EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13-9-22

Firma: [Signature]

800

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

DATOS GENERALES

Ejercicio: 2022
 Mes a Reportar: AGOSTO
 Entidad: 11130008
 Unidad Ejecutora: MINECUC
 Préstamo: MD 3618/OC-GU
 Código Presupuesto: 52-0402-0126
 Fecha de suscripción: 10/07/2018
 Fecha de último desembolso: 11/09/2022

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal		2018																
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Metas Previstas del Préstamo		II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.6. Avance Físico al Año			II.7. Avance Financiero al Año			II.8. Avance Físico Acumulado		II.9. Avance Financiero Acumulado		II.10. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Componente 1																		
Habilitación y mejoramiento de centros escolares	Habilitación de centros escolares																	
Habilitación de centros escolares por el nivel de educación preprimaria	Habilitación de centros escolares por el nivel de educación preprimaria																	
Fortalecimiento a los programas de Apoyo del Organismo Ejecutor	Fortalecimiento a los programas de Apoyo del Organismo Ejecutor																	
Mejoramiento de las aulas determinadas en los niveles de educación preprimaria y primaria	Mejoramiento de las aulas determinadas en los niveles de educación preprimaria y primaria	Establecimientos	0	29,502			0	0	0.00%				0.00%	0			0.00%	
Componente 2																		
Mejora de la calidad de los docentes	Mejora de la calidad de los docentes	Documento	2,343,200	45,934,432			0	0	0.00%	0	0	0%	0				0.00%	
Componente 3																		
Administración, seguimiento, monitoreo y evaluación	Administración del programa	N/A	N/A	0				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0				0.00%	
Evaluación	Administración del programa	N/A	N/A	0				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0				0.00%	
			\$5,461,634.00															

Ejercicio Fiscal		2019																
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Metas Previstas del Préstamo		II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.6. Avance Físico al Año			II.7. Avance Financiero al Año			II.8. Avance Físico Acumulado		II.9. Avance Financiero Acumulado		II.10. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Componente 1																		
Habilitación y mejoramiento de centros escolares	Habilitación de módulos educativos	Módulos	500	49,954,685.79	2/01/2018	20/12/2019	500	0	0.00%	49,953,055.79	0.00	0.00%	0	0.00%		0.00%		
Habilitación y mejoramiento de centros escolares	Habilitación de metalabios escolar	Unidad	500	5,399,305.21	2/01/2019	20/12/2019	500	0	0.00%	5,399,305.21	0.00	0.00%	0	0.00%		0.00%		
Componente 2																		
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Docentes de preprimaria capacitados	Docente	1,500	6,600,000.00	2/02/2019	30/11/2019	1,500	1,234	81.60%	6,600,000.00	5,385,600.00	81.60%	1,234	81.60%	5,185,600.00	81.60%		
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de textos escolares	Texto	499,537	10,026,616.00	2/01/2019	2/09/2019	499,537	499,537	100.00%	10,026,616.00	9,581,119.64	95.56%	499,537	95.56%	9,581,119.64	95.56%		
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de textos escolares	Texto	2,360,402	34,384,279.00	2/01/2019	30/04/2019	2,360,402	2,360,402	100.00%	24,384,279.00	24,297,026.34	99.64%	2,360,402	99.64%	24,297,026.34	99.64%		
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Capacitación a docentes / directores	Docente	1,340	3,758,079.00	1/07/2019	4/12/2019	1,340	0	0.00%	2,704,079.00	0.00	0.00%	0	0.00%		0.00%		
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de equipo tecnológico	Equipo	1,340	99,549,503.00	2/01/2019	13/09/2019	1,340	0	0.00%	99,549,503.00	0.00	0.00%	0	0.00%		0.00%		
Componente 3																		
Administración, seguimiento, monitoreo y evaluación	Administración del programa	Vanos	N/A	15,072,125.00	1/03/2019	31/12/2019	N/A	N/A	N/A	15,072,125.00	2,397,900.00	15.96%	N/A	15.96%	2,397,900.00	15.96%		
			\$285,159															
			\$285,159															
			99.88%															
			\$233,582,959.00															
			\$11,661,648.02															
			17.84%															
			\$2,881,183															
			99.88%															

Fecha: 13-9-22
 ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2022
 Mesa a Reportar: AGOSTO
 Entidad: 11130004
 Unidad Ejecutora: MINEDUC
 Préstamo: MD 3614/OC-GU
 Código Presupuesto: 52-0402-0326
 Fecha de suscripción: 14/09/2021
 Fecha de último desembolso: 13/09/2022

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dfo. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal	2020																	
	II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Componente 1																		
Habilitación y remodelamiento de centros escolares	Adquisición de módulos educativos preprimaria monolingüe	Módulos	137	26,734,500.00			137	81	58.12%	26,734,500.00	15,999,000.00	59.84%	81	59.12%	15,999,000.00	58.34%		
	Adquisición de módulos educativos preprimaria bilingüe	Módulos	200	50,660,000.00			200	135	67.50%	50,660,000.00	33,318,500.00	65.77%	135	67.50%	33,318,500.00	66.27%		
	Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria monolingüe	Mobiliario	137	2,070,080.00			137	135	98.54%	2,100,300.00	2,070,080.00	98.56%	135	98.54%	2,070,080.00	98.52%		
	Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria bilingüe	Mobiliario	200	3,027,340.00			200	200	100.00%	3,027,340.00	3,027,340.00	100.00%	200	100.00%	3,027,340.00	100.00%		
	Remanentamiento de aulas deterioradas en los niveles de educación preprimaria transferencias a DPE	Transferencia	1,070	68,325,505.00			820	733	89.39%	71,776,239.00	69,809,785.32	97.26%	733	89.39%	69,809,785.32	97.34%		
Componente 2																		
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Capacitación de docentes	Docente	1,224	16,156,800.00			1,224	1,032	84.31%	13,889,066.00	13,222,880.00	95.20%	1,032	84.31%	13,222,880.00	95.20%		
	Teléfono									11,969,780.00	0.00	0.00%	0			0.00%		
Componente 3																		
Administración, supervisión y evaluación	Administración del programa	Varios	N/A	5,375,198.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,167,194.00	2,747,106.59	65.92%	N/A	N/A	2,747,106.59	65.92%		
			188,165,304.00					3356	2723	81.14%	228,517,320.00	170,183,132.81	74.47%	2,723	81.14%	170,163,132.81		
Ejercicio Fiscal	2021																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Componente 1																		
Habilitación y remodelamiento de centros escolares	Adquisición de módulos educativos preprimaria monolingüe	Módulos	0	0.00	1/01/2021	31/12/2021	106	32	30.7%	23,136,000.00	6,245,000.00	26.99%	32	30.2%	6,245,000.00	26.99%		
	Adquisición de módulos educativos preprimaria bilingüe	Módulos	0	0.00	1/01/2021	31/12/2021	85	37	43.0%	22,119,000.00	7,805,300.00	35.30%	37	43.0%	7,805,300.00	35.30%		
	Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria monolingüe	Mobiliario	0	0.00	1/01/2021	31/12/2021	57	0	0.0%	876,543.00	0.00	0.00%	0	0.0%	0.00	0.00%		
	Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria bilingüe	Mobiliario	0	0.00	1/01/2021	31/12/2021	18	0	0.0%	568,080.00	0.00	0.00%	0	0.0%	0.00	0.00%		
	Remanentamiento de aulas deterioradas en los niveles de educación preprimaria transferencias a DPE	Transferencia	0	0.00	1/01/2021	31/12/2021	12	12	100.0%	1,350,000.00	807,438.92	59.81%	12	100.0%	807,438.92	59.81%		
	Remanentamiento de aulas deterioradas en los niveles de educación preprimaria transferencias a DPE	Transferencia	0	0.00	1/01/2021	31/12/2021	538	538	100.0%	45,134,266.00	40,323,767.30	89.34%	538	100.0%	40,323,767.30	89.34%		
Componente 2																		
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Capacitación de docentes	Docente	0	0.00	1/01/2021	31/12/2021	3331	2754	82.7%	25,974,679.00	24,179,760.00	93.09%	2,754	82.7%	24,179,760.00	93.09%		
	Tecnología	Equipo	0	0.00	1/01/2021	31/12/2021	1896	0	0.0%	64,405,953.00	0.00	0.00%	0	0.0%	0.00	0.00%		
Componente 3																		
Administración, supervisión y evaluación	Administración del programa	Varios	N/A	N/A	1/01/2021	31/12/2021	N/A	N/A	N/A	12,517,326.00	2,970,264.76	23.73%	N/A	N/A	2,970,264.76	23.73%		
	Evaluación	Varios	N/A	N/A	1/01/2021	31/12/2021	N/A	N/A	N/A	977,300.00	503,378.25	51.51%	N/A	N/A	503,378.25	51.51%		
			0.00					483305	480634	99.45%	184,923,304.00	91,007,045.42	49.21%	480,634	99.45%	91,007,045.42	49.21%	

Fecha: 13-9-22
 EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ORIGINAL

Fw

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

DATOS GENERALES

Ejercicio: 2022
Mes a Reportar: AGOSTO
Entidad: 11130008
Unidad Ejecutora: MINEDUC
Préstamo: 810 3614/OC-GU
Código Presupuesto: 52-0402-0126
Fecha de suscripción: 14/09/2018
Fecha de último desembolso: 17/09/2022

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas


Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal	2022																		
	II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Meta		II.5. Fecha		II.6. % Ejecución			II.7. % Ejecución			II.8. % Ejecución		II.9. % Ejecución		II.10. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			
Componente 1																			
Habilitación y remodelamiento de centros escolares	Remodelamiento de Centros Escolares vía ODF	Transferencias	1478	123,880,099.00	1/01/2022	31/12/2022	1478	0	0.0%										
	Módulos educativos	Módulos	377	97,282,478.00	1/01/2022	31/12/2022	377	0	0.0%	123,690,999.00	1,135,732.58	0.97%	0	0.0%					
	Convenios de infraestructura	Unidad	1	15,086,227.00	1/01/2022	31/12/2022	1	0	0.0%	97,282,478.00	29,181,494.25	30.01%	114	30.2%	1,135,732.58	6.82%			
	Consultorios formadores comunitarios en gestión escolar en niveles preprimario	Unidad	319	12,357,341.00			319	0	0.0%	15,086,227.00	0.00	0.00%	0	0.0%	29,181,494.25	36.31%			
	Equipamiento de módulos	Equipo	377	8,614,968.00	1/01/2022	31/12/2022	377	0	0.0%	12,357,341.00	0.00	0.00%	0	0.0%	15,086,227.00	5.00%			
Componente 2																			
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Equipo Tecnológico	Equipo	1838	179,045,185.00	1/01/2022	31/12/2022	1838	0	0.0%	9,614,968.00	0.00	0.00%	0	0.0%					
	Servicios de desarrollo curricular	%A	1	1,705,887.00			1	0	0.0%	179,045,185.00	74,625,125.00	41.68%	1,035	54.8%					
	Capacitación a docentes, PID / PADEP	Docente	2682	27,587,303.00	1/01/2022	31/12/2022	2682	0	0.0%	1,705,887.00	315,000.00	18.47%	0	0.0%	74,625,125.00	32.89%			
Componente 3																			
Administración, supervisión y evaluación	Administración del programa	N/A	N/A	6,194,265.00	1/01/2022	31/12/2022	N/A	NA	N/A										
	Evaluación	N/A	1	5,679,190.00			1	0	0.0%	6,194,265.00	3,386,433.96	54.67%	N/A	N/A	3,386,433.96	54.67%			
			7132	478,253,788.00			7132	1160	16.11%	428,223,786.00	118,292,199.77	27.62%	1,149	16.11%	118,292,199.77	27.62%			


III. Resumen

III.1. Año	III.2. Avance Físico del Año	III.3. Avance Financiero del Año	III.4. Avance Físico Acumulado	III.5. Avance Financiero Acumulado
2018	-	0.00%	0%	0.00
2019	99.86%	17.84%	51.51%	41,661,646.02
2020	81.14%	75.12%	81.14%	170,163,132.81
2021	99.45%	49.21%	99.45%	91,007,045.42
2022	16.11%	27.62%	16.11%	118,292,199.77
Total				421,124,024.02


 Firma Elaborado Por

M. Sc. Ingrid Sucely de León Piedrasanta
DIRECTORA
 Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
 Ministerio de Educación




M. Sc. Claudia Ruíz Casasola de Estrada
Ministra de Educación



Fecha: 13-9-22
 Copia FIEL DE SU ORIGINAL

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Sección 3. - Informe de Avance Físico, Financiero - Principales Inversiones

I DATOS GENERALES

Ejercicio:	2022
Mes a Reportar:	AGOSTO
Entidad:	1113-2008
Unidad Ejecutora:	MINEDUC
Préstamo:	BID 2019/OC-GU
Código Presupuesto:	52-002-0126

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dm. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acid. Gab. 548-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II PRINCIPALES INVERSIONES

II.1. No. Componente	II.2. Nombre del Componente	II.3. Inversión (Producto)	II.4. NOG	II.5. SNIP	Fecha de Inicio de Ejecución	Fecha Final de Ejecución	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera	II.6. Observaciones
Habilitación y remozamiento de centros escolares	Habilitación de centros escolares para el nivel de educación preprimaria	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	14411237		1/09/2021	22/08/2022	30.24%	30.01%	
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Promoción de la lectura, matemática y valores	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO	14445778		8/10/2021	17/06/2022	57.59%	57.83%	
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes		ESTRATEGIA E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN	N/A		29/11/2021	23/03/2022	N/A	100.00%	
Habilitación y remozamiento de centros escolares	Habilitación de centros escolares para el nivel de educación preprimaria	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EQUIPAR MÓDULOS PREFABRICADOS FASE II	15807525						En firma de contratos



Ingrid Sucely León Piedrasanta
 M. Sc. Ingrid Sucely León Piedrasanta
 DIRECTORA
 Dirección de Planificación Educativa -DIPLANE-
 Ministerio de Educación



Claudia Ruz Casquiza de Estrada
 M. Sc. Claudia Ruz Casquiza de Estrada
 Ministra de Educación

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL
 Fecha: 13-9-22
 Firma: *[Signature]*
