

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Enero / 2025**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE EDUCACION RURAL V -PROEDUC V**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V		Fecha de última actualización	07/02/2025	
Código Presupuestario	5205050013		Fecha del Decreto	27/10/2015	
Organismo Financiero	KFW		Fecha de Suscripción	18/10/2016	
Moneda del Préstamo	EUR		Fecha de Vigencia	18/10/2016	
Monto contratado	21,000,000.00		Fecha de Elegibilidad	18/10/2016	
Monto contratado Entidad ejecutora	21,000,000.00		Fecha de cierre actual	31/12/2024	
Monto Entidad Ejecutora Dolares	21,783,300.00		Meses de Prórroga	0	
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	168,450,258.90		Plazo de ejecución	100.00%	
Desembolsos realizados a la fecha	17,819,740.11	81.80%	Monto por desembolsar USD\$	3,963,559.89	18.20%

Gráfica de Ejecución

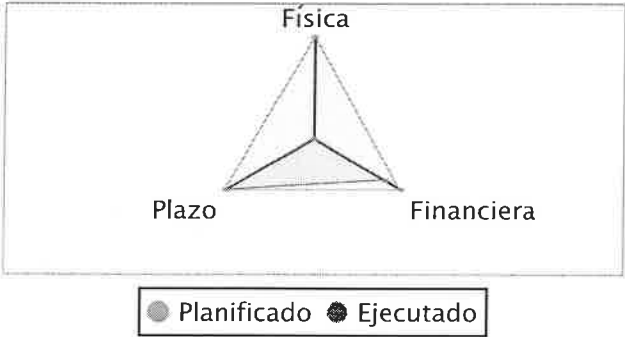

Tipo de cambio: 7.733 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Enero		Indicadores de Avance Anuales 2025		Total	
Asignación Presupuestaria anual	25,000,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	25,000,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	0.00% / 0.00%		
Porcentaje de Ejecución	0.00%	Próximo desembolso del mes	Abril	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	3,821,035.27	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	6.5427		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Acceso a Educación Técnica									
Construcción de Institutos Tecnológicos	Unidad	3		0		0		3	
Mobiliario y Proyector para laboratorios de Física, Química y Biología para 7 INEDs, ubicados en Sta. Cruz del Quiché, Cobán, La Tinta, Huehuetenango, Chiquimula, Jacaltenango y San Pedro Pinula.	Unidad	7		0		0		7	
Equipo de cómputo para 53 laboratorios en centros educativos del nivel diversificado	Unidad	53		0		0		53	
Equipo para talleres especializados en mecánica para un estimado de 15 centros educativos del nivel diversificado	Unidad	15		0		0		15	
Equipo para talleres especializados en electricidad para un estimado de 7 centros educativos del nivel diversificado	Unidad	7		0		0		7	
Equipo para talleres especializados en construcción para 3 centros educativos del nivel diversificado	Unidad	3		0		0		3	
Equipo para Laboratorios de Física, Química y Biología/Talleres de Ciencias Biológicas para 24 Centros Educativos del Nivel Diversificado	Unidad	24		0		0		24	
Equipo para Salud y Seguridad Ocupacional en 2 Institutos Tecnológicos y 100 Talleres/Laboratorios	Unidad	102		0		0		102	
Contratación de consultores individuales para realizar el diseño y monitoreo de la readecuación del Sistema Eléctrico de 20 Talleres/Laboratorios en Establecimientos de Nivel Diversificado	Unidad	1		0		0		1	
Equipamiento para mantenimiento de 2 Institutos Tecnológicos	Unidad	2		0		0		2	

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Readecuación del Sistema Eléctrico en 20 talleres/laboratorios en Establecimientos Educativos del Nivel Diversificado	Porcentaje	0		10		0		10	
Componente: Diseño e Implementación Curricular									
Contratación de consultorías para implementación curricular (formación de personal docente, administrativo e instructores de los centros educativos)	Unidad	1		0		0		1	
Reproducción: 1) Material de diseños curriculares, 2) Cualificaciones de carreras a ser implantadas y 3) Módulos Formativos	Unidad	2		0		0		2	
Componente: Fortalecimiento Institucional									
Consultoría internacional	Unidad	0		1		0		1	
Servicios de auditoría del programa	Unidad	1		0		0		1	
Publicaciones para Licitaciones	Unidad	4		0		0		4	
Redacción, diagramación e impresión de las distintas intervenciones del Proyecto	Unidad	0		1		0		1	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Acceso a Educación Técnica											
Equipo de cómputo para 53 laboratorios en centros educativos del nivel diversificado											
BIEN	Licitación Pública Internacional	01/08/2024		30/09/2024		12/11/2024		24/01/2025		28/01/2025	
Equipo para talleres especializados en mecánica para un estimado de 15 centros educativos del nivel diversificado											
BIEN	Licitación Pública Internacional	02/09/2024		14/10/2024		26/11/2024		28/01/2025		03/02/2025	
Equipo para talleres especializados en electricidad para un estimado de 7 centros educativos del nivel diversificado											
BIEN	Licitaciones locales	01/08/2024		26/09/2024		25/10/2024		27/12/2024		06/01/2025	
Equipo para talleres especializados en construcción para 3 centros educativos del nivel diversificado											
BIEN	Licitaciones locales	15/07/2024		26/08/2024		24/09/2024		29/01/2025		03/02/2025	
Equipo para Laboratorios de Física, Química y Biología/Talleres de Ciencias Biológicas para 24 Centros Educativos del Nivel Diversificado											
BIEN	Licitación Pública Internacional	15/07/2024		26/08/2024		08/10/2024		27/12/2024		06/01/2025	
Equipo para Salud y Seguridad Ocupacional en 2 Institutos Tecnológicos y 100 Talleres/Laboratorios											
BIEN	Licitaciones locales	02/12/2024		29/01/2025		28/02/2025		07/03/2025		31/03/2025	
Contratación de consultores individuales para realizar el diseño y monitoreo de la readecuación del Sistema Eléctrico de 20 Talleres/Laboratorios en Establecimientos de Nivel Diversificado											
SERVICIOI	Adjudicación directa	02/01/2025		02/01/2025		06/01/2025		07/01/2025		24/01/2025	
Equipamiento para mantenimiento de 2 Institutos Tecnológicos											

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
BIEN	Adjudicación directa	02/01/2025		18/02/2025		20/03/2025		22/04/2025		24/04/2025	
Readecuación del Sistema Eléctrico en 20 talleres/laboratorios en Establecimientos Educativos del Nivel Diversificado											
SERVICIO	Licitaciones locales	28/01/2025		02/04/2025		02/05/2025		28/05/2025		30/05/2025	
Diseño e Implementación Curricular											
Contratación de consultorías para implementación curricular (formación de personal docente, administrativo e instructores de los centros educativos)											
SERVICIO	Adjudicación directa	02/01/2025		02/01/2025		06/01/2025		07/01/2025		07/01/2025	
Reproducción: 1) Material de diseños curriculares, 2) Cualificaciones de carreras a ser implantadas y 3) Módulos Formativos											
SERVICIO	Adjudicación directa	31/10/2024		04/11/2024		22/11/2024		06/01/2025		06/01/2025	
Fortalecimiento Institucional											
Servicios de auditoria del programa											
Servicio de auditoría segundo semestre	Adjudicación directa	02/10/2024		08/11/2024		18/12/2024		18/12/2024		19/12/2024	
Funcionamiento de Asistencia Técnica Internacional											
Servicio	Licitación Pública Internacional	30/05/2018		28/09/2018		30/10/2018		28/11/2018		27/12/2018	
Redacción, diagramación e impresión de las distintas intervenciones del Proyecto											
SERVICIO	Adjudicación directa	14/02/2025		21/02/2025		28/02/2025		10/03/2025		17/03/2025	


Ejecución Financiera Anual

[illegible]

[illegible]

Items	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Publicaciones para Licitaciones													
SERVICIO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Funcionamiento de Asistencia Técnica Internacional													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,606.00
Redacción, diagramación e impresión de las distintas intervenciones del Proyecto													
SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Total componente	0.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00	2,070,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,326.00
Total	0.00	1,946,606.00	1,673,930.00	40,686,461.00	150,000.00	2,291,105.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,348,238.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

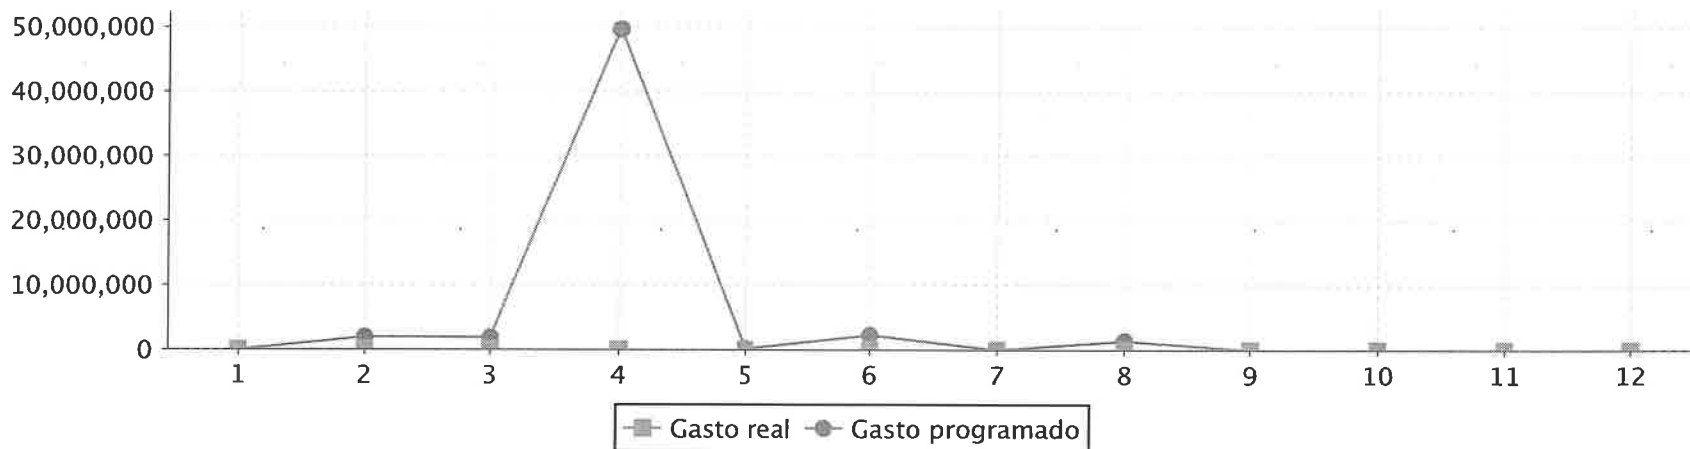

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	1,946,689.00	1,873,980.00	49,686,461.00	150,000.00	2,291,106.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real			0.00									
Total Gasto programado			57,348,236.00									

Proyección de desembolsos

[illegible]

Observaciones /Desafíos

Alertivos

Elaborado por: (nombre y firma)


Cic. Marco Antonio Turcios E.
Coordinador Administrativo Financiero
Departamento Administrativo
Financiero - DIPLAN
Ministerio de Educación

Licenciado Francisco Alfredo Sapon Orellana



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN
EDUCATIVA
-DIPLAN-
GUATEMALA, C. A.

Aprobado por: (Nombre y firma): Licenciada Anabella María Giracca Méndez



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTRA DE EDUCACIÓN
Guatemala, C. A.

Fecha de actualización: 7/2/2025 – 9:40 AM



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
CORRELATIVO = 13
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 10/02/2025
HORA : 9:58.18
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130008-0105	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00

- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

REPORT: R00817366.rpt

[illegible]
