

# Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Enero / 2022**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y LA CALIDAD EDUCATIVA**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	BID-3618-OC-GU	Fecha de última actualización	11/02/2022
Código Presupuestario	5204020126	Fecha del Decreto	03/05/2018
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	10/05/2018
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	10/05/2018
Monto contratado	150,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	08/11/2018
Monto contratado Entidad ejecutora	150,000,000.00	Fecha de cierre actual	10/05/2023
Monto Entidad Ejecutora Dolares	150,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	1,153,470,000.00	Plazo de ejecución	74.00%
Desembolsos realizados a la fecha	52,949,844.66 35.30%	Monto por desembolsar USDS	97,050,155.34 64.70%

**Gráfica de Ejecución**

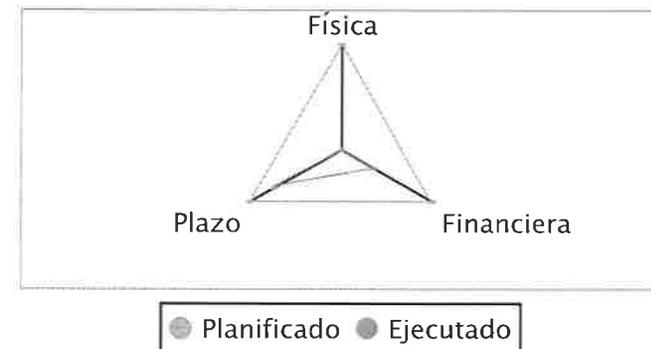

Tipo de cambio: 7.6898 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Enero		Indicadores de Avance Anuales 2022		Total	
<b>Asignación Presupuestaria anual</b>	449,900,000.00	<b>Desembolso planificado en el mes</b>	0.00	<b>Desembolsos Acumulados del Año</b>	0	<b>Ejecución Financiera</b>	0.00%
<b>Presupuesto Vigente anual</b>	449,900,000.00	<b>Desembolso realizado en el mes</b>	0.00	<b>Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos</b>	0.00% / 0.00%		
<b>Presupuesto Devengado</b>	173,000.00	<b>Diferencia</b>	0.00	<b>Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados</b>	0.05% / 0.42%		
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	0.04%	<b>Próximo desembolso del mes</b>	Marzo	<b>Plazo de ejecucion Actual</b>	70.00%		
		<b>Presupuesto planificado próximo</b>	34,356,681.23	<b>Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual</b>	13.0950		

## Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Componente: Habilitación y remozamiento de centros escolares</b>									
Mobiliario y Equipo para Módulos Educativos	Unidad	0		0		448		448	
Módulos educativos	Unidad	65		425		133		623	
Transferencias a OPF para remozamientos de centros escolares	Unidad	10		0		0		10	
Consultora para Levantamiento de Censo de Infraestructura	Porcentaje	0		0		50		50	
Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario	Unidad	0		0		319		319	
Consultores servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa	Unidad	0		0		3		3	
Valija didáctica	Unidad	0		0		319		319	
<b>Componente: Mejora de la enseñanza y los aprendizajes</b>									
Equipo Tecnológico	Unidad	982		0		0		982	
Libros de Lectura	Unidad	0		0		9570		9570	
Docentes capacitados en el PADEP (8va. cohorte profesorado)	Unidad	0		0		1496		1496	
Docentes capacitados en el PADEP (2da. cohorte licenciatura)	Unidad	0		0		585		585	
Estudiantes capacitados en FID	Unidad	0		0		601		601	

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Servicios de desarrollo curricular	Unidad	0		0		1		1	
<b>Componente: Administración y seguimiento</b>									
Consultoría de evaluación y supervisión de proyectos	Unidad	0		0		1		1	
Administración del Programa	Unidad	0		0		1		1	
Evaluación de formación de docentes / evaluación tecnología	Unidad	0		0		1		1	

# Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Habilitación y remozamiento de centros escolares</b>											
<b>Módulos Educativos</b>											
Adquisición de módulos prefabricados para centros educativos fase II del Ministerio de Educación	Licitación Pública Internacional	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	15/06/2021	15/06/2021	19/08/2021	11/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
<b>Mobiliario y Equipo para Módulos Educativos</b>											
Mobiliario y Equipo para módulos educativos	Licitación Pública Internacional	11/10/2021	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	12/01/2022	12/01/2022	07/04/2022		13/04/2022	
<b>Consultora para Levantamiento de Censo de Infraestructura</b>											
Levantamiento del censo de Infraestructura.	Licitación Pública Internacional	08/02/2022		08/02/2022		08/02/2022		08/02/2022		08/02/2022	
<b>Mejora de la enseñanza y los aprendizajes</b>											
<b>Textos escolares</b>											
Textos de lectura	Licitación Pública Internacional	08/02/2022		08/02/2022		08/02/2022		08/02/2022		08/02/2022	
<b>Equipo Tecnológico</b>											
Adquisición de equipo tecnológico para centros educativos oficiales del nivel primario	Contrataciones con Préstamos Garantizados por	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	10/08/2021	16/09/2021	01/10/2021	24/09/2021	08/10/2021	08/10/2021
<b>Administración y seguimiento</b>											
<b>Campaña de comunicación</b>											
Campaña de Comunicación	Contratación Directa	15/08/2021		07/09/2021		21/09/2021		16/11/2021		29/11/2021	


# Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Habilitación y remozamiento de centros escolares</b>													
<b>Transferencias a organizaciones de padres de familia (OPF)</b>													
Transferencias vía OPF	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
<b>Módulos Educativos</b>													
Adquisición de módulos prefabricados para centros educativos fase II del Ministerio de Educación	0.00	0.00	7,350,000.00	10,745,000.00	16,000,000.00	30,636,548.00	36,000,000.00	24,000,000.00	8,325,000.00	16,489,077.00	0.00	0.00	149,545,625.00
<b>Mobiliario y Equipo para Módulos Educativos</b>													
Mobiliario y Equipo para módulos educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,804,480.00	0.00	0.00	0.00	4,924,125.00	0.00	0.00	14,728,605.00
<b>Consultora para Levantamiento de Censo de Infraestructura</b>													
Levantamiento del censo de Infraestructura.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,226,227.00	0.00	16,226,227.00
<b>Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario</b>													
Gestión escolar de nivel preprimario	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	16,559,928.00
<b>Consultores servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa</b>													
Servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa	0.00	0.00	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	498,636.00
<b>Valija didáctica</b>													
Valija didáctica	0.00	0.00	0.00	0.00	140,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,360.00
<b>Total componente</b>	<b>1,379,994.00</b>	<b>1,379,994.00</b>	<b>9,529,857.60</b>	<b>12,174,857.60</b>	<b>17,570,217.60</b>	<b>41,870,885.60</b>	<b>37,429,857.60</b>	<b>25,429,857.60</b>	<b>9,754,857.60</b>	<b>22,843,059.60</b>	<b>17,656,084.60</b>	<b>1,429,857.60</b>	<b>198,449,381.00</b>



Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Total componente</b>	0.00	0.00	39,527,437.50	45,280,387.50	52,140,950.00	163,500.00	6,016,050.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	7,966,900.00	163,500.00	151,749,225.00
<b>Administración y seguimiento</b>													
<b>Campaña de comunicación</b>													
Campaña de Comunicación	0.00	0.00	0.00	1,932,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,868.00
<b>Consultoría de evaluación y supervisión de proyectos</b>													
Consultoría de evaluación de proyectos	0.00	0.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	6,935,900.00
<b>Administración del Programa</b>													
Varios insumos para la administración	174,000.00	248,000.00	489,565.00	551,000.00	376,000.00	376,000.00	478,500.00	376,000.00	351,000.00	391,000.00	307,000.00	391,000.00	4,509,065.00
<b>Evaluación de formación de docentes / evaluación tecnología</b>													
Consultorías varias para evaluación de docentes / tecnología	0.00	0.00	764,149.00	764,149.00	764,149.00	1,264,149.00	1,264,149.00	764,149.00	764,149.00	764,149.00	864,149.00	764,149.00	8,741,490.00
<b>Total componente</b>	174,000.00	248,000.00	1,947,304.00	3,941,607.00	1,833,739.00	2,333,739.00	2,436,239.00	1,833,739.00	1,808,739.00	1,848,739.00	1,864,739.00	1,848,739.00	22,119,323.00
<b>Total</b>	1,553,894.00	1,627,894.00	51,004,599.10	81,396,852.10	71,544,906.60	44,368,124.60	45,882,146.60	27,427,096.60	11,727,096.60	24,855,298.60	27,487,723.60	3,442,086.60	372,317,929.00

## Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

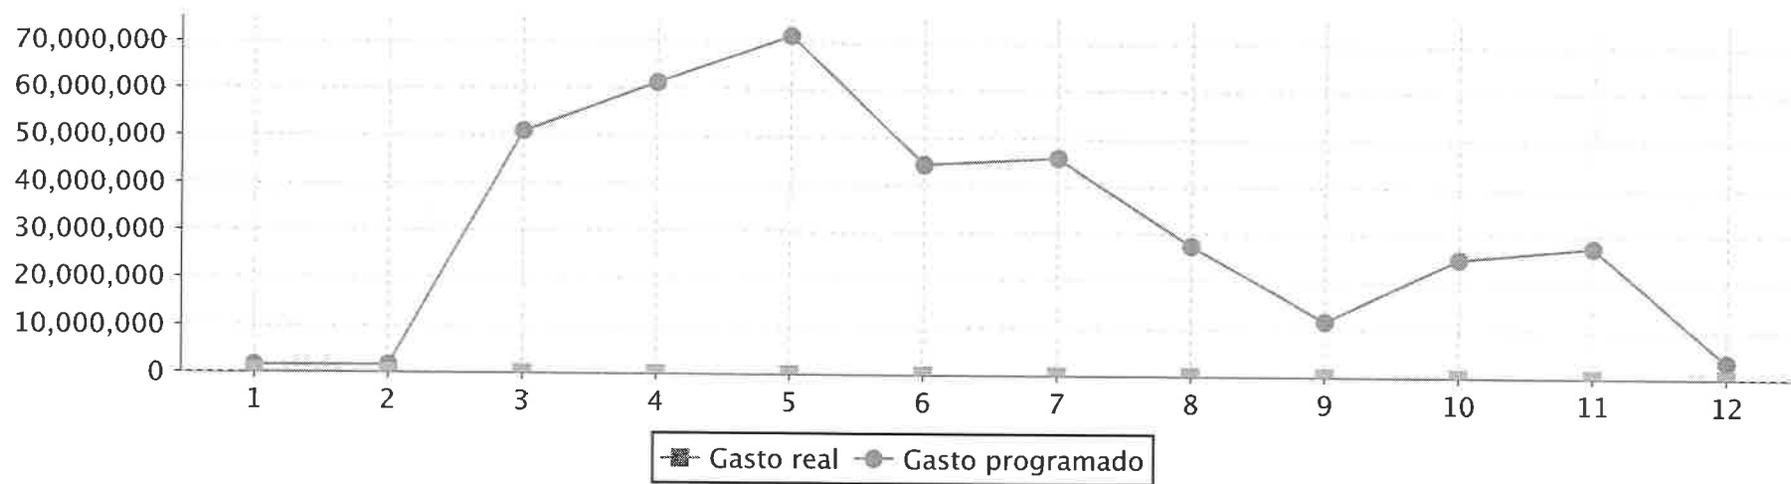

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Gasto real</b>	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gasto programado</b>	1,553,994.00	1,627,994.00	51,004,599.10	61,396,852.10	71,544,906.60	44,368,124.60	45,882,146.60	27,427,096.60	11,727,096.60	24,855,298.60	27,487,723.60	3,442,096.60
<b>Total Gasto real</b>												173,000.00
<b>Total Gasto programado</b>												372,317,929.00



Alertivos

Elaborado por: (nombre y firma): Aura Marina Solis Quiñonez



Licda. Aura Marina Solis Quiñonez  
ANALISTA FINANCIERO  
Dirección Planificación Educativa -DIPLAN-  
Ministerio de Educación

*Praxidato*  
M. A. Pilar Yela de Villa  
DIRECTORA  
Dirección de Planificación Educativa -DIPE-  
Ministerio de Educación

Aprobado por: (Nombre y firma): M. Sc. Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada



M.Sc. Claudia Ruiz Casasola de Estrada  
Ministra de Educación

