

# Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Abril / 2020**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y LA CALIDAD EDUCATIVA**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	BID-3618-OC-GU	Fecha de última actualización	07/05/2020
Código Presupuestario	5204020126	Fecha del Decreto	03/05/2018
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	10/05/2018
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	10/05/2018
Monto contratado	150,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	11/06/2018
Monto contratado Entidad ejecutora	150,000,000.00	Fecha de cierre actual	05/10/2023
Monto Entidad Ejecutora Dolares	150,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	1,156,860,000.00	Plazo de ejecución	20.00%
Desembolsos realizados a la fecha	32,949,844.66 21.97%	Monto por desembolsar USD\$	117,050,155.34 78.03%

**Gráfica de Ejecución**

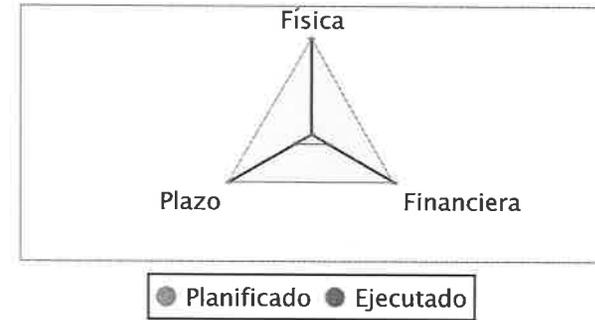

Tipo de cambio: 7.7124 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Abril		Indicadores de Avance Anuales 2020		Total	
Asignación Presupuestaria anual	2,731,043.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	188,165,304.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	73,433,307.79	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	36.13% / 26.60%		
Porcentaje de Ejecución	39.03%	Próximo desembolso del mes	Mayo	Plazo de ejecucion Actual	37.00%		
		Presupuesto planificado próximo	27,000,000.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0.0520		

# Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Componente: Habilitación y remozamiento de centros escolares</b>									
Transferencias a organizaciones de padres de familia (OPF)	Unidad	0	986	1297		563		1860	986
Módulos Educativos	Unidad	337		0		563		900	
Mobiliario y Equipo para Módulos Educativos	Unidad	337		0		563		900	
<b>Componente: Mejora de la enseñanza y los aprendizajes</b>									
Equipo Tecnológico	Unidad	0		0		1360		1360	
Libros de Lectura	Unidad	0		0		8350		8350	


# Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Habilitación y remozamiento de centros escolares</b>											
<b>Módulos Educativos</b>											
Módulos prefabricados FASE II	Licitación Pública Internacional	13/04/2020		22/05/2020		21/07/2020		04/08/2020		10/08/2020	
<b>Mobiliario Escolar</b>											
Mobiliario escolar	Licitación Pública Internacional	10/09/2019	10/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	25/10/2019	25/10/2019	05/11/2019		07/02/2020	
Mobiliario escolar FASE II	Licitación Pública Internacional	18/06/2020		18/08/2020		28/09/2020		19/10/2020		23/10/2020	
<b>Mejora de la enseñanza y los aprendizajes</b>											
<b>Equipo Tecnológico</b>											
Equipo tecnológico	Licitación Pública Internacional	30/03/2020		25/05/2020		27/07/2020		03/08/2020		07/08/2020	
<b>Libros de Lectura</b>											
Libros de lectura	Licitación Pública Internacional	26/03/2020		03/04/2020		02/06/2020		12/06/2020		17/06/2020	

# Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Habilitación y remozamiento de centros escolares</b>													
<b>Módulos Educativos</b>													
Módulos prefabricados	0.00	0.00	23,818,780.30	27,137,790.87	14,837,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,794,500.00
Módulos prefabricados FASE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Mobiliario Escolar</b>													
Mobiliario escolar	0.00	0.00	0.00	3,116,726.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116,726.98
Mobiliario escolar FASE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total componente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,818,780.30</b>	<b>30,254,517.85</b>	<b>14,837,928.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,911,226.98</b>
<b>Mejora de la enseñanza y los aprendizajes</b>													
<b>Equipo Tecnológico</b>													
Equipo tecnológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,469,347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,469,347.24
<b>Libros de Lectura</b>													
Libros de lectura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,887,928.00	0.00	12,887,928.00
<b>Total componente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,469,347.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,887,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,357,275.24</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,818,780.30</b>	<b>30,254,517.85</b>	<b>14,837,928.83</b>	<b>121,469,347.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,887,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,268,502.22</b>

## Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

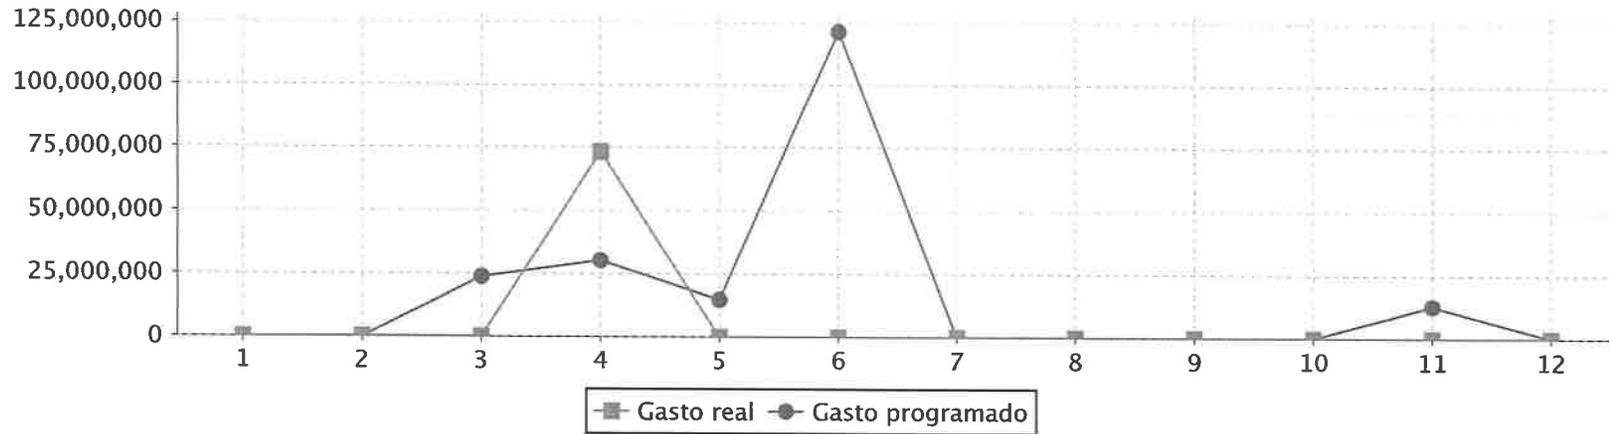

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Gasto real</b>	0.00	152,000.00	76,000.00	73,205,307.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gasto programado</b>	0.00	0.00	23,818,780.30	30,254,517.85	14,837,928.83	121,469,347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12,887,928.00	0.00
<b>Total Gasto real</b>												<b>73,433,307.79</b>
<b>Total Gasto programado</b>												<b>203,268,502.22</b>



## Observaciones / Desafíos

### Alertivos:

Elaborado por: ( nombre y firma) Aura Marina Solis Quiñonez

Aprobado por: Claudia Ruiz Casarola de Estrada



Lic. Jorge Antonio Monterroso Castillo  
DIRECTOR  
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-  
Ministerio de Educación

Fecha de actualización

7/5/2020-9:41 am
