

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Abril / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA**


Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	BID-2018/OC-GU	Fecha de última actualización	08/05/2018
Código Presupuestario	5204020108	Fecha del Decreto	19/02/2009
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	25/02/2009
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	25/02/2009
Monto contratado	150,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	23/06/2009
Monto contratado Entidad ejecutora	82,000,000.00	Fecha de cierre actual	27/04/2018
Monto Entidad Ejecutora Dolares	82,000,000.00	Meses de Prórroga	50
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	607,620,000.00	Plazo de ejecución	89.74%
Desembolsos realizados a la fecha	80,600,000.00 98.29%	Monto por desembolsar USD\$	1,400,000.00 1.71%

Gráfica de Ejecución

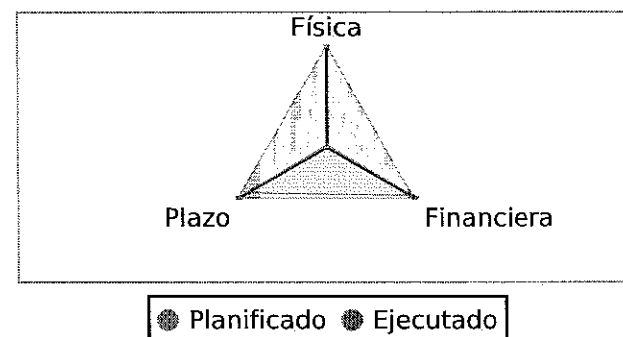

Tipo de cambio: 7.41 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Abril		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	0.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	14,043,529.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	5,465,744.90	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	38.66% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	38.92%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Mejoramiento de la infraestructura escolar.									
Mobiliario escolar para módulos educativos	Unidad	457	0	0		0		457	0
Componente: Calidad educativa con pertinencia cultural y lingüística y fortalecimiento de la gestión escolar									
Cuadernos de trabajo nivel pre primaria	Unidad	242774	242774	0		0		242774	242774


Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Mejoramiento de la infraestructura escolar.											
Mobiliario escolar para módulos educativos											
Mobiliario para módulos educativos	Licitación Pública Internacional	14/12/2017	14/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	31/01/2018	31/01/2018	06/02/2018	06/02/2018	16/02/2018	16/02/2018

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Mejoramiento de la Infraestructura escolar.													
Mobiliario escolar para módulos educativos													
Mobiliario para módulos educativos	0.00	0.00	0.00	7,474,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,474,330.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	7,474,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,474,330.00
Calidad educativa con pertinencia cultural y lingüística y fortalecimiento de la gestión escolar													
Cuadernos de trabajo nivel pre primaria													
Cuadernos de trabajo nivel pre primario	0.00	0.00	3,852,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852,325.00
Total componente	0.00	0.00	3,852,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852,325.00
Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros													
Contratación Asistencia Técnica para el Proyecto													
Asistencia técnica para el proyecto	0.00	664,521.00	332,261.00	332,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,042.00
Contratación auditoría externa													
Auditoría Externa	0.00	0.00	450,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,606.00
Arrendamiento equipo multifuncional													
Equipo multifuncional	0.00	64,279.00	32,140.00	32,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,559.00
Publicaciones													

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

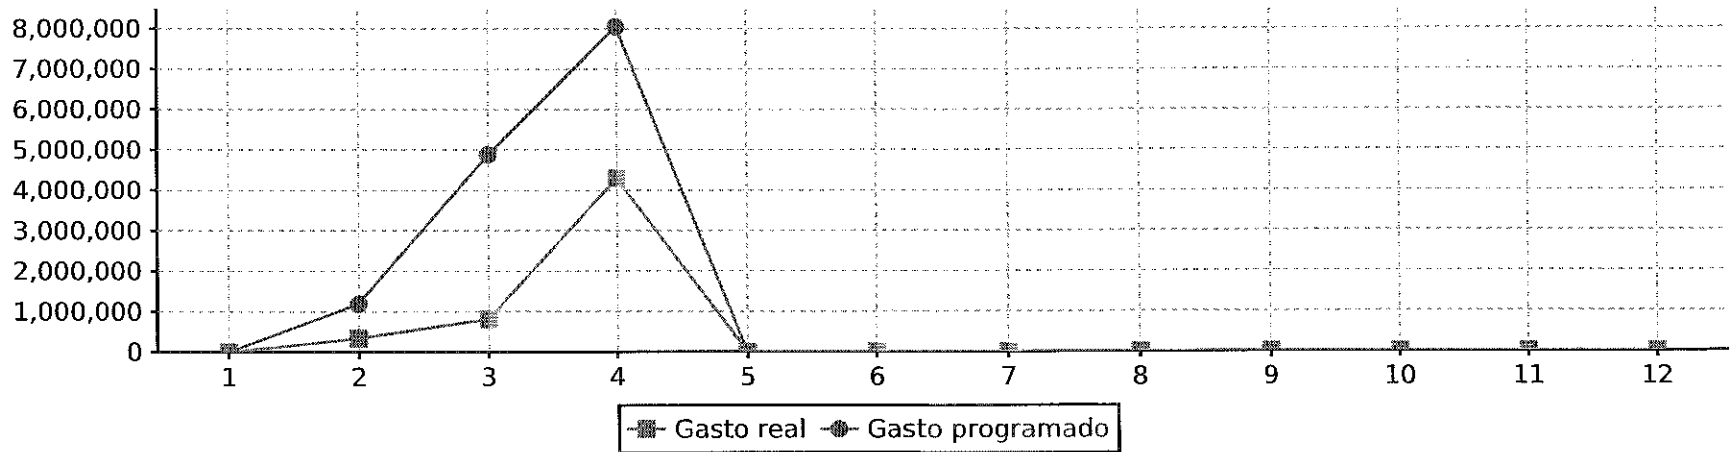

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	345,000.00	818,840.00	4,301,904.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	1,196,330.00	4,885,995.00	8,057,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real												5,465,744.90
Total Gasto programado												14,139,717.00


Guatemala, 4 de mayo de 2017
Oficio DIPLAN No. A-1012-2017


Licenciada Rosa Maria Ortega
Directora
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Señora Directora:

Con base al artículo 72 del decreto 50-2016 el cual establece: "Agilización de gestiones para la ejecución de préstamos externos de las entidades ejecutoras, la autoridad máxima de las entidades que ejecutan recursos de préstamos externos, deberá designar a su inmediato inferior, como encargado de facilitar las gestiones administrativas y financieras que sean necesarias para la ejecución de los recursos a cargo de la entidad; de dicha designación informará al Ministro de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas"; me dirijo a usted para informar que este despacho designa al licenciado Bayron Oswaldo Alonzo, Director de la Dirección de Planificación Educativa.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración y estima.

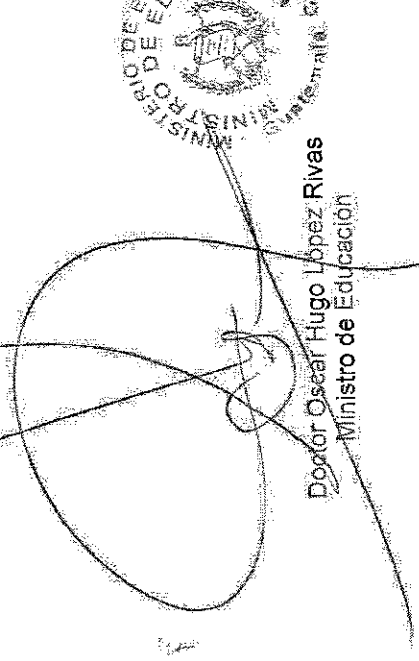
Doctor Oscar Hugo López Rivas
Ministro de Educación




OHLR/BOO/inc
cc: Archivo

Observaciones / Desafíos

Alertivos:



Elaborado por: (nombre y firma) Claudia Carolina Tánchez Urbina



Aprobado por: (nombre y firma) Bayron Oswaldo Osorio Alonzo



Fecha de actualización

8/5/2018 - 2:49 PM
