

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Febrero / 2019**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE EDUCACION RURAL V -PROEDUC V**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V		Fecha de última actualización	07/03/2019	
Código Presupuestario	5205050013		Fecha del Decreto	27/10/2015	
Organismo Financiero	KFW		Fecha de Suscripción	18/10/2016	
Moneda del Préstamo	EUR		Fecha de Vigencia	18/10/2016	
Monto contratado	21,000,000.00		Fecha de Elegibilidad	18/10/2016	
Monto contratado Entidad ejecutora	21,000,000.00		Fecha de cierre actual	31/12/2021	
Monto Entidad Ejecutora Dolares	23,940,000.00		Meses de Prórroga	0	
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	161,910,000.00		Plazo de ejecución	11.18%	
Desembolsos realizados a la fecha	2,636,206.69	11.03%	Monto por desembolsar USD\$	21,274,393.31	88.97%

Gráfica de Ejecución

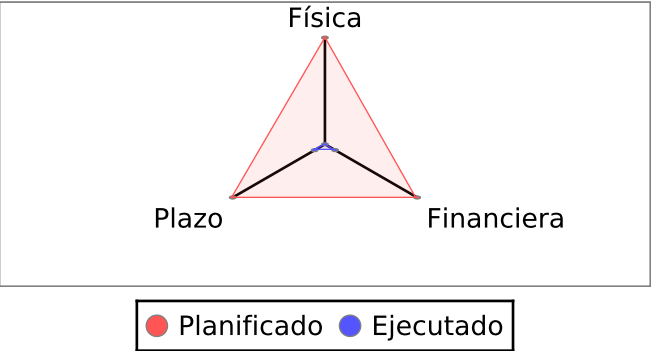

Tipo de cambio: 7.71 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Febrero		Indicadores de Avance Anaules 2019		Total	
Asignación Presupuestaria	99,537,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	99,537,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	0.00% / 3.25%		
Porcentaje de Ejecución	0.00%	Próximo desembolso del mes	Mayo	Plazo de ejecucion Actual	46.00%		
		Presupuesto planificado próximo	2,849,740.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	34.9284		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Acceso a Educación Técnica									
Infraestructura Física	Porcentaje	0		4		6		10	
Equipamiento	Porcentaje	0		4		6		10	
Supervision Tecnica de Obras	Unidad	0		6		0		6	


Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adqusición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Acceso a Educación Técnica											
Infraestructura Física											
Construcción de 6 Institutos Nacionales de Educación Diversificada en los Departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Jalapa, Huehuetenango y Quiché	Licitación Pública Internacional	04/02/2019	31/01/2019	08/02/2019		01/03/2019		22/03/2019		01/04/2019	
Equipamiento											
Mobiliario escolar para 14 centros remozados	Licitación Pública Internacional	17/01/2019	17/01/2019	08/02/2019		08/03/2019		29/03/2019		01/04/2019	
Equipo de Computo para 10 centros remozados.	Licitación Pública Internacional	18/01/2019	18/01/2019	08/02/2019		08/03/2019		15/03/2019		29/03/2019	
Adquisición de Equipo de Cómputo para Establecimientos Educativos en los Departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y Chiquimula	Licitación Pública Internacional	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	24/01/2019	24/01/2019	31/01/2019		15/02/2019	
Supervision Tecnica de Obras											
Supervision de 6 Institutos en 6 Departamentos	Solicitud de precios	08/02/2019		15/02/2019		05/04/2019		12/04/2019		26/04/2019	

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Acceso a Educación Técnica													
Infraestructura Física													
Rehabilitación de Centros Educativos en los Departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché	0.00	4,572,180.00	4,572,180.00	0.00	1,016,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,160,400.00
Construcción de 6 Institutos Nacionales de Educación Diversificada en los Departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Jalapa, Huehuetenango y Quiché	0.00	0.00	0.00	22,578,900.00	0.00	23,707,845.00	0.00	31,610,460.00	0.00	23,707,845.00	0.00	11,289,450.00	112,894,500.00
Equipamiento													
Mobiliario escolar para 14 centros remozados	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988,600.00	0.00	0.00	4,012,600.00
Equipo de Computo para 10 centros remozados.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910,000.00	0.00	8,910,000.00
Adquisición de Equipo de C ó m p u t o para Establecimientos Educativos en los Departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y Chiquimula	0.00	0.00	1,918,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,328.00
Supervision Tecnica de Obras													
Supervision de 6 Institutos en 6 Departamentos	0.00	0.00	0.00	240,334.00	359,584.00	240,334.00	359,584.00	240,334.00	359,584.00	240,334.00	359,584.00	240,334.00	2,640,006.00
Total componente	0.00	4,572,180.00	6,514,508.00	22,819,234.00	1,375,624.00	23,948,179.00	359,584.00	31,850,794.00	359,584.00	27,936,779.00	9,269,584.00	11,529,784.00	140,535,834.00
Total	0.00	4,572,180.00	6,514,508.00	22,819,234.00	1,375,624.00	23,948,179.00	359,584.00	31,850,794.00	359,584.00	27,936,779.00	9,269,584.00	11,529,784.00	140,535,834.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

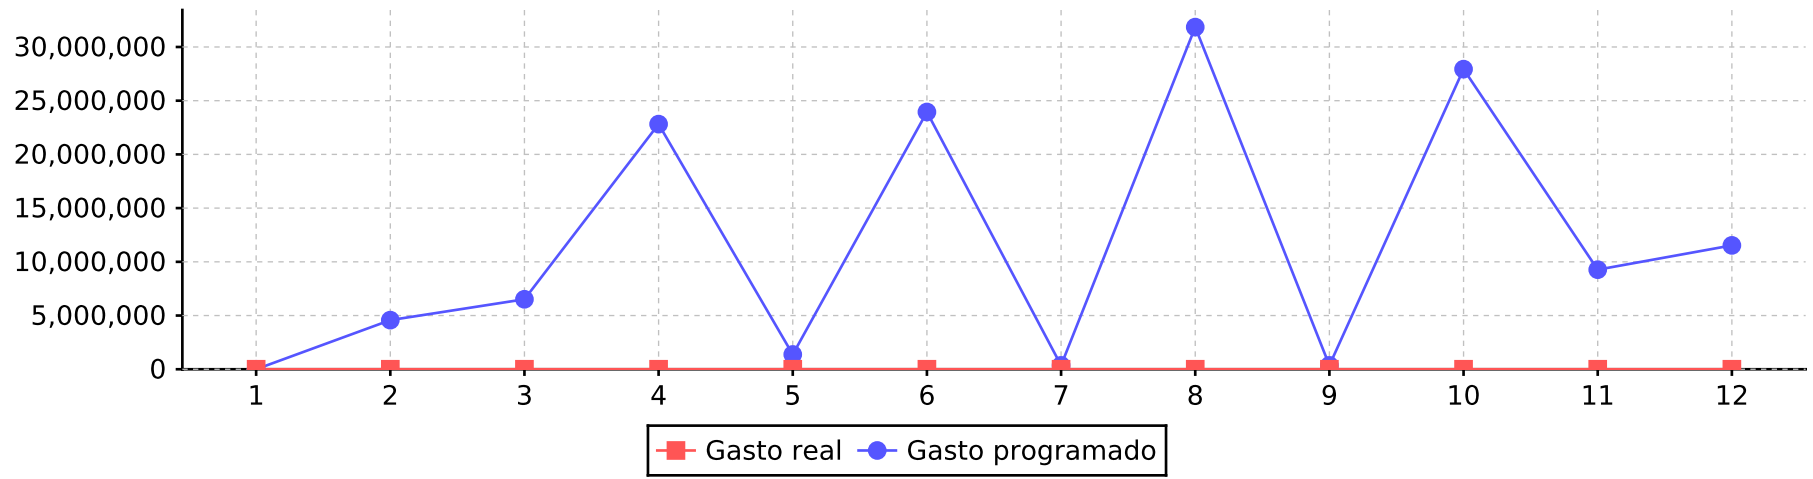

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	4,572,180.00	6,514,508.00	22,819,234.00	1,375,624.00	23,948,179.00	359,584.00	31,850,794.00	359,584.00	27,936,779.00	9,269,584.00	11,529,784.00
Total Gasto real			0.00									
Total Gasto programado			140,535,834.00									


Guatemala, 4 de mayo de 2017
Oficio DIPLAN No. A-1012-2017

Licenciada Rosa Maria Ortega
Directora
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Señora Directora:

Con base al artículo 72 del decreto 50-2016 el cual establece: "Agilización de gestiones para la ejecución de préstamos externos de las entidades ejecutoras, la autoridad máxima de las entidades que ejecutan recursos de préstamos externos, deberá designar a su inmediato inferior, como encargado de facilitar las gestiones administrativas y financieras que sean necesarias para la ejecución de los recursos a cargo de la entidad; de dicha designación informará al Ministro de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas"; me dirijo a usted para informar que este despacho designa al licenciado Bayron Oswaldo Osorio Alonzo, Director de la Dirección de Planificación Educativa.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración y estima.

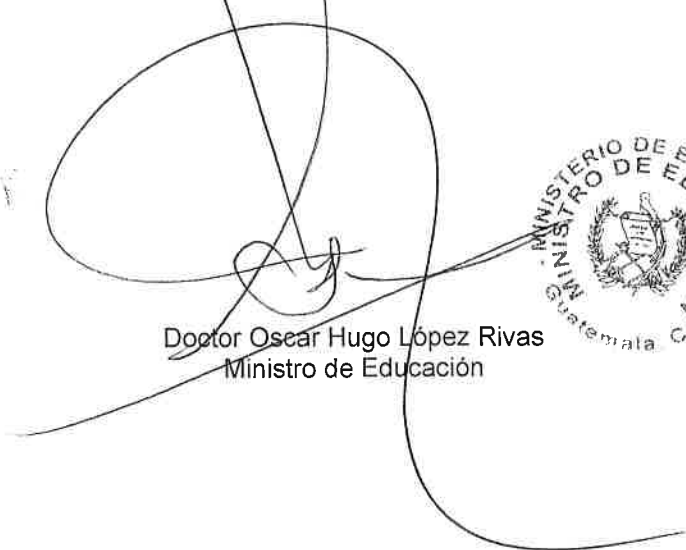

Doctor Oscar Hugo López Rivas
Ministro de Educación

OHLR/BOO/nc
cc: Archivo

Comprometidos con la Educación

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Claudia Carolina Tánchez Urbina

Aprobado por: (nombre y firma) Oscar Hugo López Rivas

Fecha de actualización 7/3/2019 - 3:14 PM
