

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Mayo / 2024**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE EDUCACION RURAL V -PROEDUC V**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V	Fecha de última actualización	12/06/2024
Código Presupuestario	5205050013	Fecha del Decreto	27/10/2015
Organismo Financiero	KFW	Fecha de Suscripción	18/10/2016
Moneda del Préstamo	EUR	Fecha de Vigencia	18/10/2016
Monto contratado	21,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/10/2016
Monto contratado Entidad ejecutora	21,000,000.00	Fecha de cierre actual	31/12/2024
Monto Entidad Ejecutora Dolares	22,837,500.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	177,392,565.00	Plazo de ejecución	93.00%
Desembolsos realizados a la fecha	15,091,777.50	66.08%	Monto por desembolsar USD\$ 7,745,722.50 33.92%

Gráfica de Ejecución

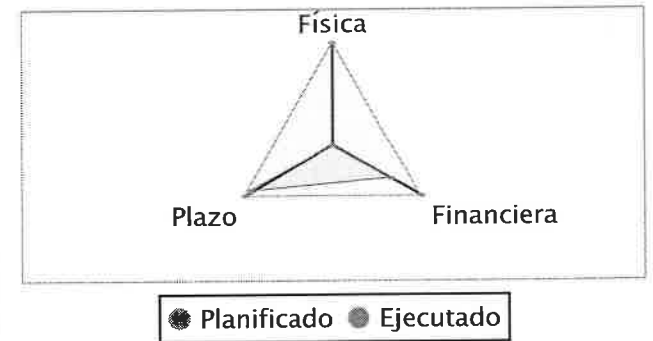

Tipo de cambio: 7.7676 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Mayo		Indicadores de Avance Anuales 2024		Total	
Asignación Presupuestaria anual	9,262,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	12,193,982.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	1,586,946.05	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	2.31% / 8.39%		
Porcentaje de Ejecución	13.01%	Próximo desembolso del mes	Junio	Plazo de ejecucion Actual	93.00%		
		Presupuesto planificado próximo	3,034,873.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	1.2062		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Acceso a Educación Técnica									
Equipo para taller de mecánica diésel Tecnológico Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.	Unidad	0		2		0		2	
Equipamiento de cocción para taller de procesamiento de alimentos para Tecnológicos de Huehuetenango y Jalapa	Unidad	0		2	2	0		2	2
Equipamiento para taller de construcción Tecnológico Jalapa	Unidad	0		1	1	0		1	1
Equipo de cómputo para laboratorio INED's Santa Cruz Barillas, Jalapa y Cuilco	Unidad	0		3		0		3	
Equipo para laboratorios de cómputo Tecnológicos de Huehuetenango y Jalapa	Unidad	0		2		0		2	
Equipo y Mobiliario para laboratorios de física, química y biología Institutos de Santa Cruz del Quiché; Cobán, Alta Verapaz; La Tinta, Alta Verapaz; Huehuetenango, Huehuetenango; Chiquimula, Chiquimula; Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.	Unidad	0		0		7		7	
Mobiliario para institutos tecnológicos (MAC, MT1, MT2 y MTGC) para Tecnológicos de Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.	Unidad	0		2		0		2	
Equipamiento de lavado y plomería, refrigeración, eléctrico menor, para Tecnológicos de Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.	Unidad	0		2		0		2	
Carros para almacenamiento y traslado de computadoras portátiles y tablets	Unidad	0		3		0		3	

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
para laboratorios de cómputo de los Institutos de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango; Jalapa, Jalapa y Cuilco, Huehuetenango.									
Equipo para laboratorios y talleres de centros educativos oficiales de nivel Diversificado en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Jalapa y Chiquimula.	Unidad	0		0		100		100	
Componente: Diseño e Implementación Curricular									
Implementación curricular (reproducción de material) para 2 Tecnológicos, Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.	Unidad	0		2		0		2	
Contratación de consultorías para implementación curricular (formación de personal docente, administrativo e instructores de los centros educativos)	Unidad	0		4	0	4		8	0
Componente: Fortalecimiento Institucional									
Servicios de auditoria del programa	Unidad	0	1	1		1		2	1
Imprevistos	Unidad	0		0		1		1	
Publicaciones para Licitaciones	Unidad	0		4		0		4	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Acceso a Educación Técnica											
Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de los INED´s JALAPA y HUEHUETENANGO											
Bien	Licitaciones locales	23/02/2023		20/03/2023		26/04/2023		06/12/2023	14/02/2024	22/02/2024	06/03/2024
Equipo de laboratorios, de Química, Física y Biología de INED´s de JALAPA Y HUEHUETENANGO											
Bien	Licitaciones locales	23/02/2023		23/03/2023		29/04/2023		07/12/2023	08/03/2024	22/02/2024	15/04/2024
Equipo para taller de mecánica diésel Tecnológico Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.											
Bien	Licitación Pública Internacional	22/07/2023	22/07/2023	06/09/2023	06/09/2023	23/10/2023	23/10/2023	18/01/2024	19/01/2024	06/02/2024	10/04/2024
Equipamiento de cocción para taller de procesamiento de alimentos para Tecnológicos de Huehuetenango y Jalapa											
Bien	Licitación Pública Internacional	02/03/2023	02/03/2023	28/06/2023	28/06/2023	18/08/2023	18/08/2023	11/11/2023	11/11/2023	29/12/2023	29/12/2023
Equipamiento para taller de construcción Tecnológico Jalapa											
Bien	Licitaciones locales	11/04/2023	11/04/2023	28/06/2023	28/06/2023	01/08/2023	01/08/2023	23/11/2023	23/11/2023	03/01/2024	03/01/2024
Equipo de cómputo para laboratorio INED's Santa Cruz Barillas, Jalapa y Cuilco											
Bien	Licitaciones locales	18/07/2023	18/07/2023	06/09/2023	06/09/2023	13/10/2023	13/10/2023	20/12/2023	14/02/2024	09/02/2024	06/03/2024
Equipo para laboratorios de cómputo Tecnológicos de Huehuetenango y Jalapa											
Bien	Licitación Pública Internacional	01/07/2023	01/07/2023	06/09/2023	06/09/2023	25/10/2023	25/10/2023	22/12/2023	14/02/2024	09/02/2024	15/04/2024
Equipo y Mobiliario para laboratorios de física, química y biología Institutos de Santa Cruz del Quiché; Cobán, Alta Verapaz; La Tinta, Alta Verapaz; Huehuetenango, Huehuetenango; Chiquimula, Chiquimula; Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.											

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Bien	Licitación Pública Internacional	23/02/2023	16/06/2023	06/09/2023	06/09/2023	24/10/2023	24/10/2023	08/03/2024	08/03/2024	12/04/2024	15/04/2024
Mobiliario para institutos tecnológicos (MAC, MT1, MT2 y MTGC) para Tecnológicos de Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.											
Bien	Licitaciones locales	15/06/2023	15/06/2023	28/12/2023	28/12/2023	25/01/2024	25/01/2024	15/02/2024	06/05/2024	04/03/2024	
Equipamiento de lavado y plomería, refrigeración, eléctrico menor, para Tecnológicos de Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.											
Bien	Licitación Pública Internacional	15/02/2024		28/02/2024		15/04/2024		06/05/2024		17/06/2024	
Carros para almacenamiento y traslado de computadoras portátiles y tablets para laboratorios de cómputo de los Institutos de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango; Jalapa, Jalapa y Cuilco, Huehuetenango.											
Bien	Licitaciones locales	15/02/2024	15/02/2024	28/02/2024	03/05/2024	28/03/2024	10/05/2024	20/05/2024		28/06/2024	
Equipo para laboratorios y talleres de centros educativos oficiales de nivel Diversificado en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Jalapa y Chiquimula.											
Bien	Licitación Pública Internacional	15/02/2024		28/02/2024		15/04/2024		06/05/2024		17/06/2024	
Diseño e Implementación Curricular											
Implementación curricular (reproducción de material) para 2 Tecnológicos, Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.											
Servicios	Solicitud de precios	15/02/2024		08/03/2024		20/03/2024		01/04/2024		15/04/2024	
Contratación de consultorías para implementación curricular (formación de personal docente, administrativo e instructores de los centros educativos)											
Servicio	Procedimiento de varias etapas	02/02/2024	06/05/2024	15/02/2024	06/05/2024	28/02/2024	17/05/2024	05/03/2024	17/05/2024	15/03/2024	
Fortalecimiento Institucional											
Servicios de auditoria del programa											
Servicio de auditoría primer semestre	Adjudicación directa	02/10/2023	01/02/2024	08/11/2023	05/02/2024	28/11/2023	12/02/2024	18/12/2023	26/02/2024	09/02/2024	26/02/2024
Servicio de auditoría segundo semestre	Adjudicación directa	02/10/2024		08/11/2024		18/12/2024		18/12/2024		19/12/2024	

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Imprevistos											
Insumo	Procedimiento de varias etapas	30/04/2024		01/08/2024		29/08/2024		30/10/2024		14/11/2024	
Publicaciones para Licitaciones											
Servicio (Publicaciones de Licitaciones)	Adjudicación directa	28/02/2024		28/02/2024		28/02/2024		28/02/2024		28/02/2024	
Servicio	Adjudicación directa	28/02/2024		15/03/2024		29/03/2024		12/04/2024		26/04/2024	
Funcionamiento de Asistencia Técnica Internacional											
Servicio	Licitación Pública Internacional	30/05/2018		28/09/2018		30/10/2018		28/11/2018		27/12/2018	


Ejecución Financiera Anual

[illegible]

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532,197.00	0.00	0.00	0.00	3,532,197.00
Mobiliario para institutos tecnológicos (MAC, MT1, MT2 y MTGC) para Tecnológicos de Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
Equipamiento de lavado y plomería, refrigeración, eléctrico menor, para Tecnológicos de Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524,689.00	0.00	0.00	0.00	2,524,689.00
Carros para almacenamiento y traslado de computadoras portátiles y tablets para laboratorios de cómputo de los Institutos de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango; Jalapa, Jalapa y Cuilco, Huehuetenango.													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,433.00	0.00	0.00	0.00	57,433.00
Equipo para laboratorios y talleres de centros educativos oficiales de nivel Diversificado en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Jalapa y Chiquimula.													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,333,190.00	15,407,280.00	16,177,644.00	0.00	0.00	48,918,114.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901,244.00	3,527,390.00	0.00	17,333,190.00	21,521,599.00	16,177,644.00	0.00	0.00	61,461,067.00
Diseño e Implementación Curricular													
Implementación curricular (reproducción de material) para 2 Tecnológicos, Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.													
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
Contratación de consultorías para implementación curricular (formación de personal docente, administrativo e instructores de los centros educativos)													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	273,600.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	600,600.00
Fortalecimiento Institucional													

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Servicios de auditoria del programa													
Servicio de auditoria primer semestre	0.00	0.00	0.00	25,456.20	101,825.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	112,000.78	267,282.00
Servicio de auditoria segundo semestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Imprevistos													
Insumo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,732.58	0.00	0.00	1,245,732.58	0.00	0.00	1,245,666.97	0.00	3,737,132.13
Publicaciones para Licitaciones													
Servicio (Publicaciones de Licitaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funcionamiento de Asistencia Técnica Internacional													
Servicio	606,852.28	0.00	0.00	0.00	612,358.53	0.00	35,324.57	0.00	0.00	351,155.06	0.00	1,056,855.43	2,662,545.87
Total componente	606,852.28	0.00	0.00	25,456.20	1,969,916.13	30,000.00	65,324.57	1,275,732.58	0.00	351,155.06	1,273,666.97	1,168,855.21	6,766,960.00
Total	606,852.28	0.00	0.00	25,456.20	5,144,760.13	3,638,950.00	145,824.57	18,690,522.58	21,603,199.00	18,528,799.06	1,273,666.87	1,168,855.21	68,828,027.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

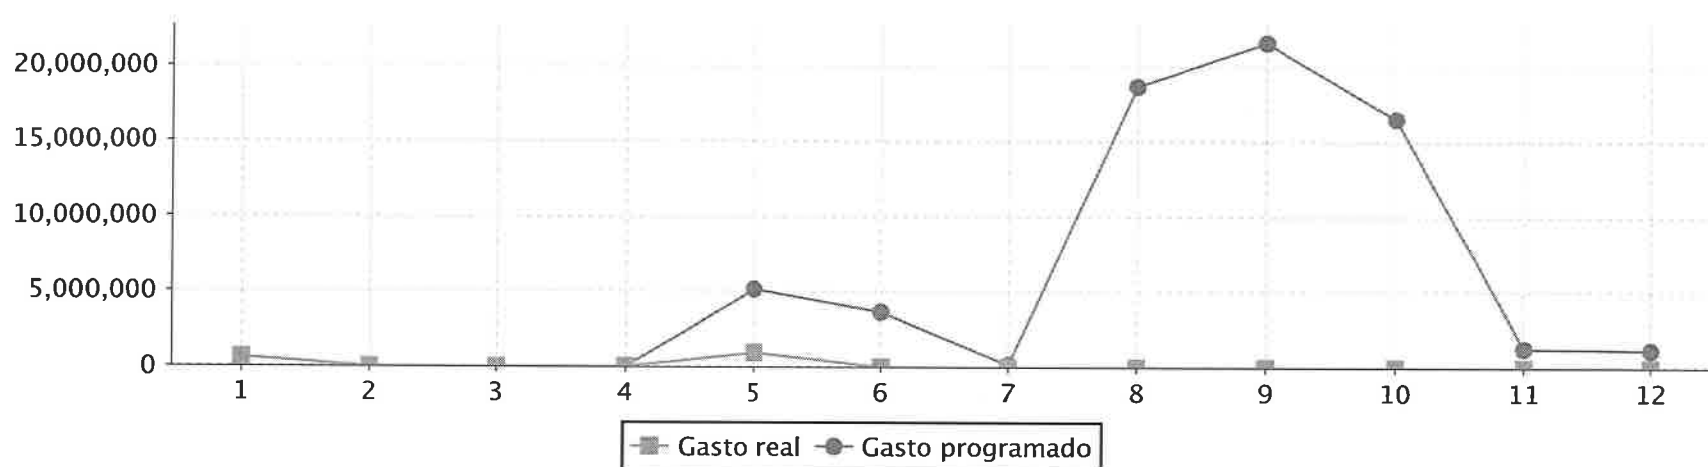

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	606,852.28	6,975.00	0.00	25,456.26	947,662.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	606,852.28	0.00	0.00	25,456.20	5,144,760.13	3,638,990.00	146,924.57	18,690,522.58	21,603,199.00	16,528,799.06	1,273,666.97	1,168,856.21
Total Gasto real	1,586,946.05											
Total Gasto programado	68,828,027.00											

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034,873.00	0.00	0.00	4,643,897.97	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034,873.00	0.00	0.00	4,643,897.97	0.00	0.00	0.00

ORGANISMO = 505, CORRELATIVO = 13
- Entidad / Unidad Ejecutora - REN - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,024

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11130008-0105 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA														
121 52	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0,00	6,975.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,975.00
171 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184 52	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0,00	0,00	0,00	25,456.26	50,912.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,368.77
188 52	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189 52	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	606,852.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,852.28
239 52	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,696.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,696.42
254 52	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,400.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,400.00
261 52	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,365.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,365.00
272 52	PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283 52	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286 52	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00	14,950.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,950.00
289 52	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 52	ÚTILES DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 52	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293 52	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294 52	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295 52	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296 52	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD													
296 52	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 52	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298 52	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	11,045.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,045.00
321 52	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 52	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	26,774.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,774.22
323 52	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 52	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 52	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	291,130.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,130.00

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 3/06/2024
HORA : 9:31.43
REPORTE : R00817366.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales
ORGANISMO = 505, CORRELATIVO = 13
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 18:25.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130008-0105	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA	9,212,000.00	3,261,202.00	12,473,202.00	0.00	1,637,858.56	1,586,946.05	690,196.05	10,835,343.44	10,886,255.95	896,750.00	12.72
11130008-0124	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		9,262,000.00	3,261,202.00	12,523,202.00	0.00	1,637,858.56	1,586,946.05	690,196.05	10,885,343.44	10,936,255.95	896,750.00	12.67

Observaciones / Desafíos


Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Aura Marina Solis Quiñonez


Licda. Aura Marina Solis Quiñonez
ANALISTA FINANCIERO
Dirección Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación


Lcdo. Herber Edwin Sierra Estrada
Encargado de la Dirección de
Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación

Aprobado por: (nombre y firma) FRANCISCO RICARDO CABRERA ROMERO


Francisco Ricardo Cabrera Romero
Viceministro Técnico de Educación
Ministerio de Educación



Fecha de actualización

13/6/2024 - 4:15 PM

