

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado Diciembre / 2023

Proyecto / Programa: PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y LA CALIDAD EDUCATIVA

Organismo ejecutor: Ministerio de Educación

Número de Préstamo	BID-3618-OC-GU	Fecha de última actualización	08/01/2024
Código Presupuestario	5204020126	Fecha del Decreto	03/05/2018
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	10/05/2018
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	10/05/2018
Monto contratado	150,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	08/11/2018
Monto contratado Entidad ejecutora	150,000,000.00	Fecha de cierre actual	10/06/2024
Monto Entidad Ejecutora Dolares	150,000,000.00	Meses de Prórroga	13
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	1,174,050,000.00	Plazo de ejecución	93.00%
Desembolsos realizados a la fecha	141,466,303.95 94.31%	Monto por desembolsar USD\$	8,533,696.05 5.69%

Gráfica de Ejecución

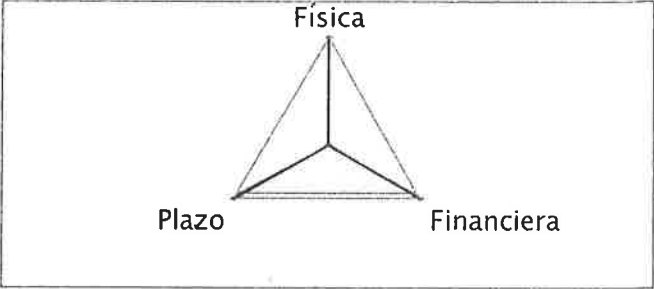

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.827 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Diciembre		Indicadores de Avance Anuales 2023		Total	
Asignación Presupuestaria anual	525,025,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	52095080.06	Ejecución Financiera	35.00%
Presupuesto Vigente anual	442,666,648.00	Desembolso realizado en el mes	2,608,980.06	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	92.85% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	429,115,885.14	Diferencia	-2,608,980.06	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	98.93% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	96.94%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	93.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	9.3579		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Habilitación y remozamiento de centros escolares									
Módulos educativos	Unidad	0	34	34		0		34	34
Módulos educativos fase 2.2	Unidad	93	74	0	144	0	28	93	246
Transferencias a OPF para remozamientos de centros escolares	Unidad	2010	1289	1510	2208	0	298	3520	3795
Consultora para Levantamiento de Censo de Infraestructura	Porcentaje	0		1		0		1	
Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario	Unidad	0		0	270	319	2	319	272
Consultores servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa	Unidad	0		0		3		3	
Valija didáctica	Unidad	319		0		0	319	319	319
Profesionales para evaluaciones de proyectos que atenderán las 5530 OPF	Unidad	0		0	87	77	24	77	111
Mobiliario Escolar (Pupitres)	Unidad	0		0		150000	107140	150000	107140
Consultoría para evaluación de proyectos	Unidad	0		0		12	12	12	12
Componente: Mejora de la enseñanza y los aprendizajes									
Textos escolares	Unidad	0		0		2179805	2179805	2179805	2179805
Libros de Lectura	Unidad	0		9570	9570	0		9570	9570

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Docentes capacitados en el PADEP (2da. cohorte licenciatura)	Unidad	406		0		0	941	406	941
Estudiantes capacitados en FID	Unidad	0		901		0	230	901	230
Evaluación de formación de docentes / evaluación de tecnología	Unidad	0		0		3	0	3	0
Kit material didáctico para módulos prefabricados	Unidad	319		0		0	319	319	319
Impresión de material educativo para docente	Unidad	319		0		0	319	319	319
Taller de capacitación del I Congreso Nacional para docentes egresados de PADEP	Unidad	7	6	0		0		7	6
Guía curricular para elaboración de huertos escolares	Unidad	0		8000		0	8000	8000	8000
Impresión de Currículo Nacional Base del nivel de educación preprimaria	Unidad	0		0		21551	21551	21551	21551
Consultoría para evaluación de resultados SINAIE	Unidad	1		0		0	1	1	1
Consultoría para la implementación de la estrategia de acompañamiento y nivelación de los aprendizajes de áreas de Comunicación y Lenguaje y Matemática	Unidad	0		0		1	1	1	1
Componente: Administración y seguimiento									
Licencias para evaluación de docentes	Unidad	0		0		1	1	1	1
Administración del Programa	Unidad	0		0		25	20	25	20
Evaluación de formación de docentes / evaluación tecnología	Unidad	0		0		3	3	3	3

12

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Servicio (12 Consultores para evaluación de proyectos)	Contratación Directa	02/01/2023	05/01/2023	16/01/2023	09/02/2023	31/01/2023	22/02/2023	01/02/2023	27/02/2023	06/02/2023	27/02/2023
Mejora de la enseñanza y los aprendizajes											
Docentes capacitados en el PADEP (2da. cohorte licenciatura)											
Servicio (Docentes capacitados en PADEP 2da. Cohorte)	Administración Directa	28/04/2023		28/04/2023		28/04/2023		28/04/2023		28/04/2023	
Estudiantes capacitados en FID											
Servicio (Estudiantes capacitados en FID)	Administración Directa	02/01/2023		02/01/2023		02/01/2023		02/01/2023		02/01/2023	
Evaluación de formación de docentes / evaluación de tecnología											
Servicio (3 consultores de formación de docentes/ evaluación de tecnología)	Contratación Directa	14/12/2022		08/02/2023		13/02/2023		20/02/2023		20/02/2023	
Kit material didáctico para módulos prefabricados											
Bien	Selección basada en la Calidad y el Costo	03/10/2022	03/10/2022	14/12/2022	14/12/2022	25/01/2023	25/01/2023	16/03/2023	26/05/2023	23/03/2023	23/06/2023
Impresión de material educativo para docente											
Servicio (Impresión de materiales educativos para docentes de los módulos educativos del nivel preprimario)	Licitación Pública Internacional	04/07/2022	04/07/2022	12/08/2022	12/08/2022	12/09/2022	12/09/2022	02/12/2022	02/12/2022	13/01/2023	13/01/2023
Taller de capacitación del I Congreso Nacional para docentes egresados de PADEP											
Servicio (Taller de capacitación)	Selección basada en la Calidad y el Costo	05/12/2022	05/12/2022	22/02/2023	22/12/2022	02/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	23/03/2023	14/03/2023
Guía curricular para elaboración de huertos escolares											
Servicio	Selección basada en la Calidad y el Costo	25/11/2022	25/11/2022	08/02/2023	31/03/2023	16/02/2023	19/04/2023	17/03/2023	26/05/2023	18/03/2023	29/05/2023
Impresión de Currículo Nacional Base del nivel de educación preprimaria											
Servicio	Participación de la Comunidad en Contrataciones	25/11/2022	25/11/2022	28/01/2023	27/01/2023	28/02/2023	02/03/2023	24/04/2023	26/05/2023	02/05/2023	23/06/2023

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Consultoría para evaluación de resultados SINAIE											
Servicio(Contratación de consultoría para evaluación de resultados del SINAIE correspondiente a los tres años de su implementación en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Quiché, Alta Verapaz, Chiquimula y Petén)	Contratación Directa	17/02/2023	14/04/2023	16/03/2023	18/05/2023	17/03/2023	23/05/2023	20/03/2023	31/05/2023	21/03/2023	09/06/2023
Consultoría para la implementación de la estrategia de acompañamiento y nivelación de los aprendizajes de áreas de Comunicación y Lenguaje y Matemática											
Servicio (Contratación de consultoría para la implementación de la estrategia de acompañamiento y nivelación de los aprendizajes de las áreas de Comunicación y Lenguaje y Matemática)	Contratación Directa	14/02/2023		16/02/2023		23/02/2023		28/02/2023		14/03/2023	
Servicio de Impresión de textos de Matemáticas, comunicación y lenguaje, p/niños de primer, segundo y tercer grado primaria											
Servicio (Impresión de textos)	Selección basada en la Calidad y el Costo	03/10/2022	03/10/2022	15/11/2022	15/11/2022	09/01/2023	09/01/2023	24/03/2023	28/04/2023	31/03/2023	25/05/2023
Impresión de textos escolares de la serie Descubro y Aprendo para el nivel de educación preprimaria											
Servicio (Impresión de textos escolares)	Selección basada en la Calidad y el Costo	04/07/2022	04/07/2022	12/08/2022	12/08/2022	12/09/2022	12/09/2022	02/12/2022	02/12/2022	13/01/2023	13/01/2023
Administración y seguimiento											
Licencias para evaluación de docentes											
Bien	Selección Basada en el Menor Costo (SMBC)	14/03/2023		11/04/2023		11/05/2023		04/07/2023		11/07/2023	
Administración del Programa											
Servicio (contratación de 25 consultores)	Contratación Directa	13/01/2023		13/01/2023		13/01/2023		13/01/2023		13/01/2023	


2

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Transferencia a OPF, para la adquisición de valijas didácticas	0.00	140,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,357.00
Profesionales para evaluaciones de proyectos que atenderán las 5530 OPF													
Servicio (77 profesionales para evaluaciones de proyectos que atenderán las 5530 OPF)	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	17,969,544.00
Mobiliario Escolar (Pupitres)													
Bien (pupitres)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999,998.00	0.00	0.00	0.00	29,999,998.00
Consultoría para evaluación de proyectos													
Servicio (12 Consultores para evaluación de proyectos)	352,666.00	352,666.00	352,666.00	352,666.00	88,166.00	88,166.00	88,166.00	88,166.00	88,166.00	88,166.00	88,166.00	88,169.00	2,115,995.00
Total componente	3,331,216.00	26,057,739.00	138,836,407.00	8,908,304.00	16,092,795.00	126,349,821.00	3,066,716.00	3,066,716.00	43,435,339.00	13,435,341.00	3,066,718.00	1,585,631.00	387,232,743.00
Mejora de la enseñanza y los aprendizajes													
Docentes capacitados en el PADEP (2da. cohorte licenciatura)													
Servicio (Docentes capacitados en PADEP 2da Cohorte)	0.00	0.00	1,004,851.00	0.00	0.00	1,004,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,703.00
Estudiantes capacitados en FID													
Servicio (Estudiantes capacitados en FID)	0.00	0.00	1,143,999.00	0.00	0.00	1,143,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,997.00
Evaluación de formación de docentes / evaluación de tecnología													
Servicio (3 consultores de formación de docentes/ evaluación de tecnología)	0.00	0.00	79,998.00	0.00	0.00	79,998.00	0.00	79,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,994.00
Kit material didáctico para módulos prefabricados													
Bien	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impresión de material educativo para docente													
Servicio (Impresión de materiales educativos para docentes de los módulos educativos del nivel preprimario)	0.00	148,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,576.00
Taller de capacitación del I Congreso Nacional para docentes egresados de PADEP													
Servicio (Taller de capacitación)	1,333,333.00	1,333,333.00	1,333,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
Guía curricular para elaboración de huertos escolares													
Servicio	38,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,998.00
Impresión de Currículo Nacional Base del nivel de educación preprimaria													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	791,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,888.00
Consultoría para evaluación de resultados SINAIE													
Servicio(Contratación de consultoría para evaluación de resultados del SINAIE correspondiente a los tres años de su implementación en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Quiché, Alta Verapaz, Chiquimula y Petén)	0.00	0.00	33,333.00	0.00	33,333.00	0.00	33,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.00
Consultoría para la implementación de la estrategia de acompañamiento y nivelación de los aprendizajes de áreas de Comunicación y Lenguaje y Matemática													
Servicio (Contratación de consultoría para la implementación de la estrategia de acompañamiento y nivelación de los aprendizajes de las áreas de Comunicación y Lenguaje y Matemática)	0.00	0.00	99,999.00	0.00	99,999.00	0.00	99,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,996.00

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Servicio de Impresión de textos de Matemáticas, comunicación y lenguaje, p/niños de primer, segundo y tercer grado primaria													
Servicio (Impresión de textos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999,998.00
Impresión de textos escolares de la serie Descubro y Aprendo para el nivel de educación preprimaria													
Servicio (Impresión de textos escolares)	0.00	304,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,352.00
Total componente	1,372,331.00	1,786,261.00	3,695,514.00	199,000.00	925,220.00	32,228,846.00	133,331.00	79,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,420,501.00
Administración y seguimiento													
Licencias para evaluación de docentes													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,998.00	0.00	0.00	0.00	799,998.00
Administración del Programa													
Servicio (contratación de 25 consultores)	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	5,320,269.00
Total componente	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	1,243,353.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	6,120,267.00
Total	5,146,902.75	28,287,355.75	142,875,276.75	9,550,859.75	17,461,370.75	159,022,022.75	3,643,402.75	3,590,069.75	44,678,692.75	13,878,696.75	3,510,073.75	2,028,988.75	433,773,511.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

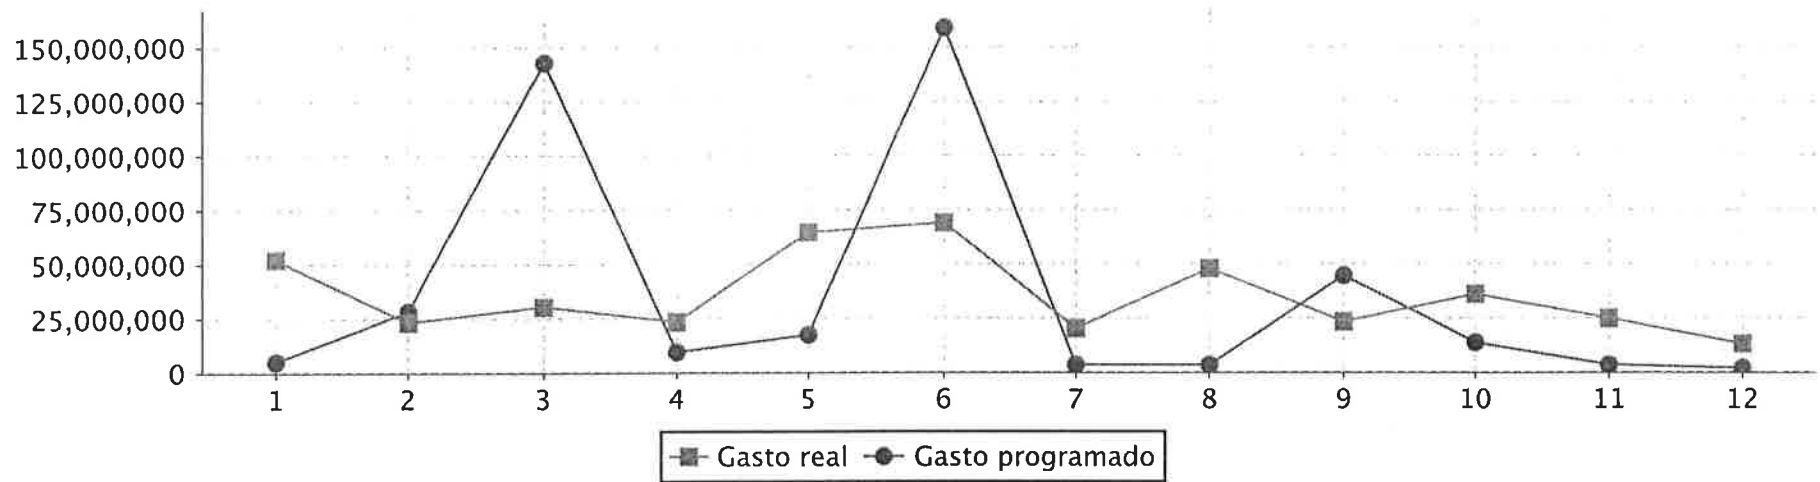[illegible]

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	36,964,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	36,964,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,521,613.00	0.00	0.00	0.00	2,608,980.06
Variación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140,434.00	0.00	-12,521,613.00	0.00	0.00	0.00	-2,608,980.06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
ORGANISMO = 402, CORRELATIVO = 126
- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 3/01/2024
 HORA : 14:38.30
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,023

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11130008-0105	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA													
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	267,000.00	286,000.00	419,300.00	340,900.07	334,870.97	301,686.02	420,741.94	376,000.00	351,000.00	367,258.20	394,000.00	394,000.00	4,252,757.20
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,975.00	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	34,875.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	977.50	11,558.10	3,143.50	2,239.00	9,152.01	4,181.00	6,065.00	2,806.20	1,516.50	1,158.00	1,725.00	44,531.81
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	930,000.00	666,000.00	1,086,000.00	1,350,000.00	1,230,000.00	1,415,000.00	1,250,000.00	1,509,999.65	1,078,000.00	575,000.00	1,740,000.00	900,000.00	13,729,999.65
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102.50	0.00	5,102.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	435.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00	0.00	6,804.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993.00	0.00	1,993.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00	0.00	737.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,774,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,680.00	13,235,518.00	15,068,061.00	0.00	0.00	34,675,399.00
326	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,120,000.00	12,735,000.00	5,820,000.00	5,830,000.00	29,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755,000.00	0.00	66,295,000.00
425	PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,990,805.12	8,119,509.20	14,699,736.95	15,860,324.25	55,609,923.93	36,937,844.65	18,350,623.30	42,266,825.30	6,012,048.50	70,000.00	14,065,715.00	700,000.00	263,683,356.20
TOTAL	11130008-0105 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA	52,187,805.12	19,973,601.70	28,958,570.05	23,374,367.82	63,014,008.90	67,698,682.68	20,025,556.24	45,756,569.95	20,693,322.70	16,081,835.70	22,970,944.50	1,995,725.00	382,730,990.36
11130008-0120	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA													
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	111,000.00	48,000.00	161,000.00	340,000.00
TOTAL	11130008-0120 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	111,000.00	48,000.00	161,000.00	340,000.00
11130008-0124	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA													
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	651,568.78	0.00	27,840.00	0.00	0.00	17,223,057.89	0.00	0.00	17,902,466.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,120.00	1,891,120.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,678,407.90	1,503,548.00	0.00	1,088,560.00	0.00	0.00	0.00	415,360.00	607,200.00	724,555.00	3,274,245.00	10,291,875.90
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,508.00	265,328.00	2,180,304.00	2,253,844.00	1,401,624.00	1,185,324.00	3,555,972.00	12,246,904.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	575,998.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,998.20
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,799.06	0.00	0.00	24,799.06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
ORGANISMO = 402, CORRELATIVO = 126
- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 3/01/2024
 HORA : 14:38.30
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2023

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,072.75	0.00	0.00	15,072.75
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,872.20	0.00	0.00	45,872.20
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,131.00	0.00	0.00	372,131.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,840.00	0.00	0.00	283,840.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,445.00	60,445.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,850.00	773,850.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,455.00	1,321,455.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,065.00	239,065.00
TOTAL	11130008-0124 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	0.00	3,254,406.10	1,503,548.00	0.00	1,740,128.78	1,404,508.00	293,168.00	2,180,304.00	2,669,204.00	19,973,596.90	1,909,879.00	11,116,152.00	46,044,894.78
11130008-0126	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO													
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11130008-0126 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		\$2,187,805.12	23,228,007.80	30,462,118.05	23,374,387.82	64,754,137.68	69,103,190.68	20,336,724.24	47,936,873.95	23,362,526.70	36,166,432.60	24,928,823.50	13,272,877.00	429,115,885.14

Observaciones /Desafíos

1) En el año 2024, se realizará la contratación de 47 docentes.

Alertivos

Elaborado por: (nombre y firma):

[Firma]
Jcda. Aura Marina Solis Quiñonez
ANALISTA FINANCIERO
Dirección Planificación Educativa -DIPLA-
Ministerio de Educación

[Firma]
M. Sc. Ingrid Sucely De León Piedrasanta de Díaz



Aprobado por: (Nombre y firma): M. Sc. Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada

[Firma]
M. Sc. Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada



Fecha de actualización: 08/01/2024 - 1:48 PM

[Firma]
